




# 廣深港高速鐵路(香港段)項目進度 截至2018年4月30日

立法會交通事務委員會  
鐵路事宜小組委員會


2018年6月1日

# 整體項目工程進度 (截至2018年4月底)


## 整體工程完成

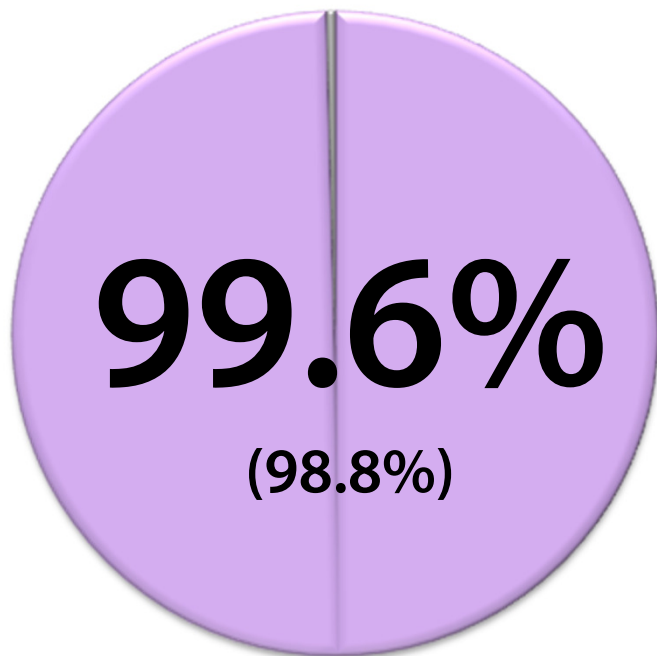

## 土木工程整體完成

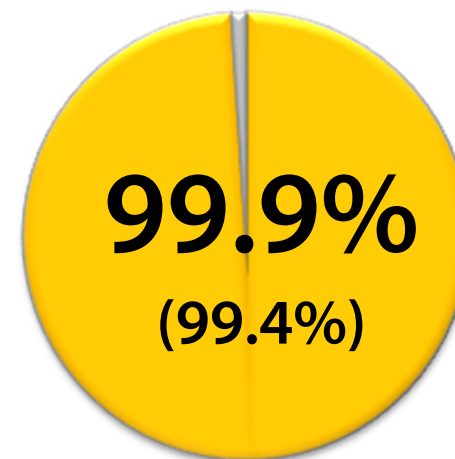

## 機電工程整體完成

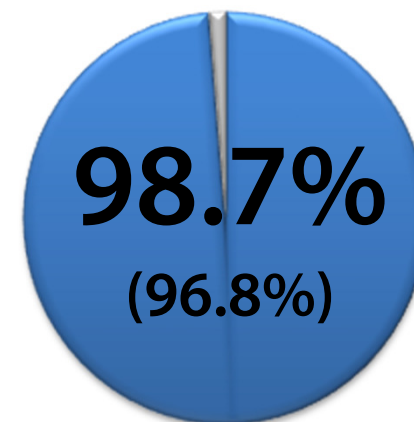


備註：弧內的百分比為該項工程以2018年第三季完工時間表的預計進度

# 香港西九龍站 - 工程進度



香港西九龍站內景觀

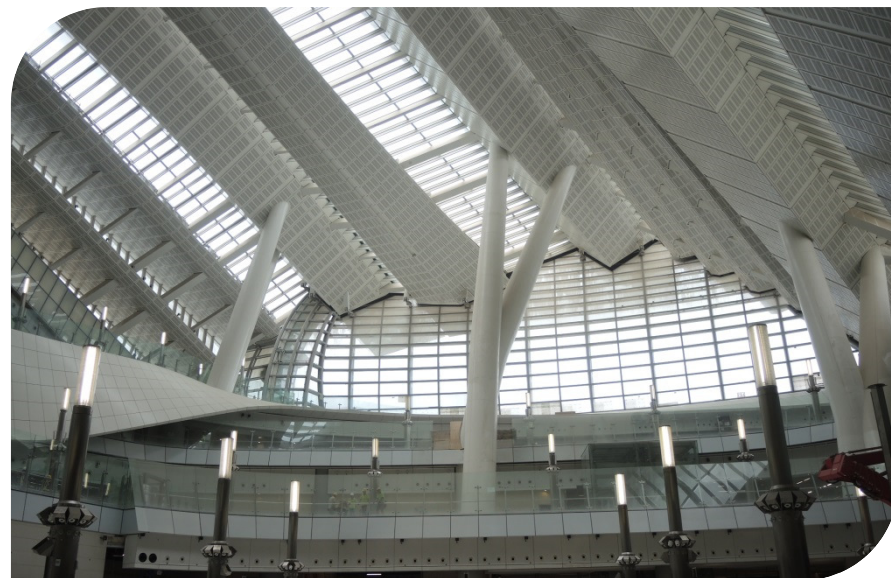

# 香港西九龍站 - 工程進度



海關、出入境及檢疫設施位置



已安裝所有扶手電梯



消防檢測

# 香港西九龍站 - 綠化工程




站內綠化牆




種植活動

# 香港西九龍站 - 周邊的工程

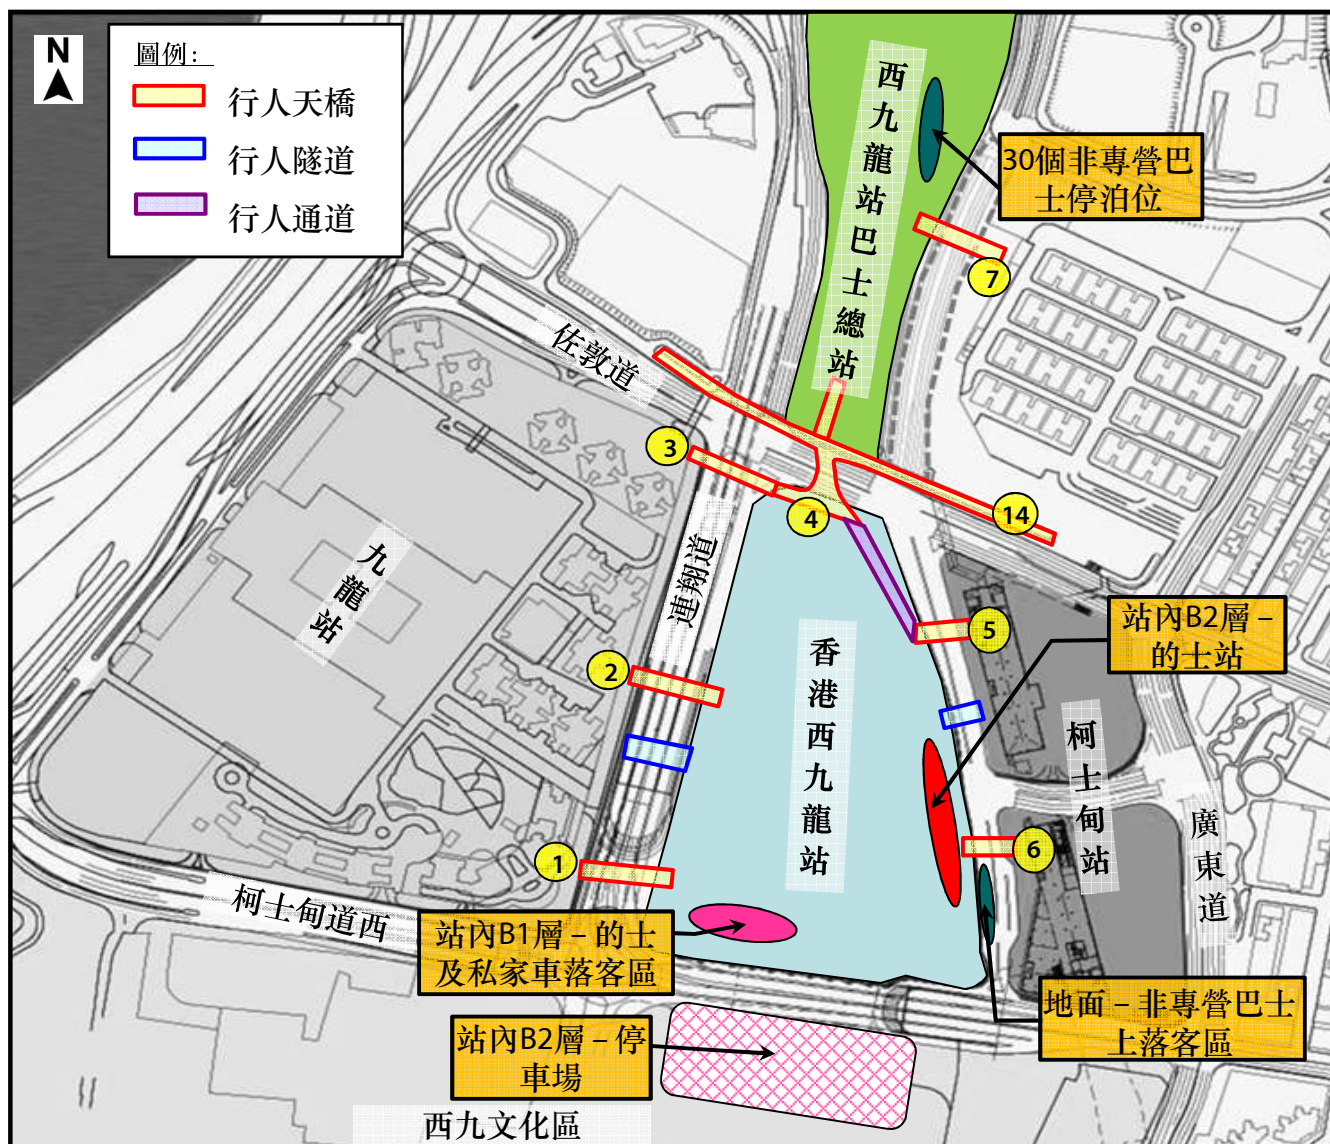

行人天橋	連接地點
①	香港西九龍站與九龍站的東南角
②	香港西九龍站上蓋未來物業發展與九龍站的東面 (行人天橋使用日期視乎未來物業發展而定)
③	香港西九龍站與九龍站的東北角
④	香港西九龍站與佐敦道以北的西九龍站巴士總站
⑤	香港西九龍站與柯士甸站北面
⑥	香港西九龍站與柯士甸站南面
⑦	西九龍站巴士總站與文昌街
⑭	重置的佐敦道行人天橋


# 香港西九龍站 - 周邊的工程

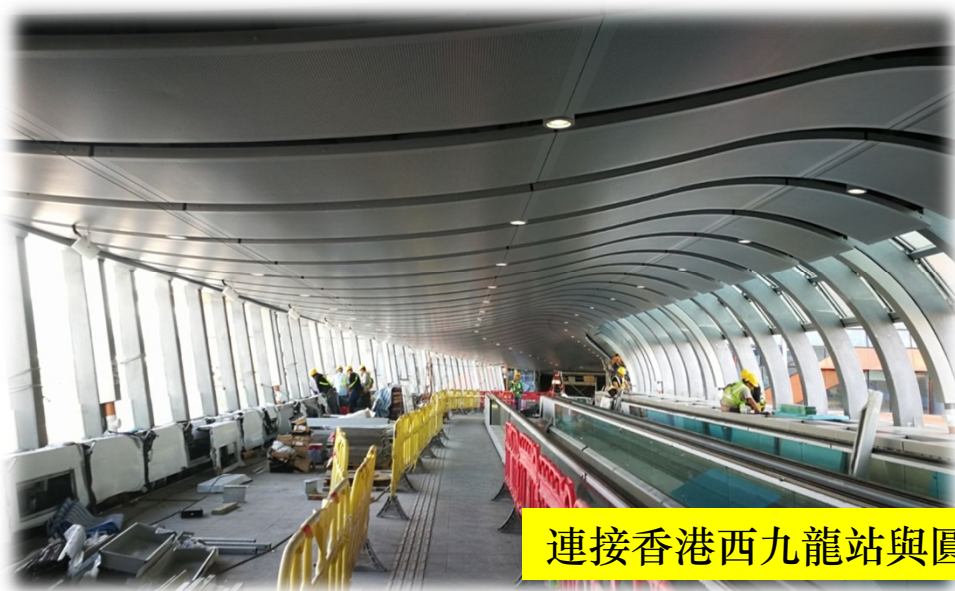

連接香港西九龍站與圓方/九龍站的兩條行人天橋




連接香港西九龍站與柯士甸站的兩條行人天橋

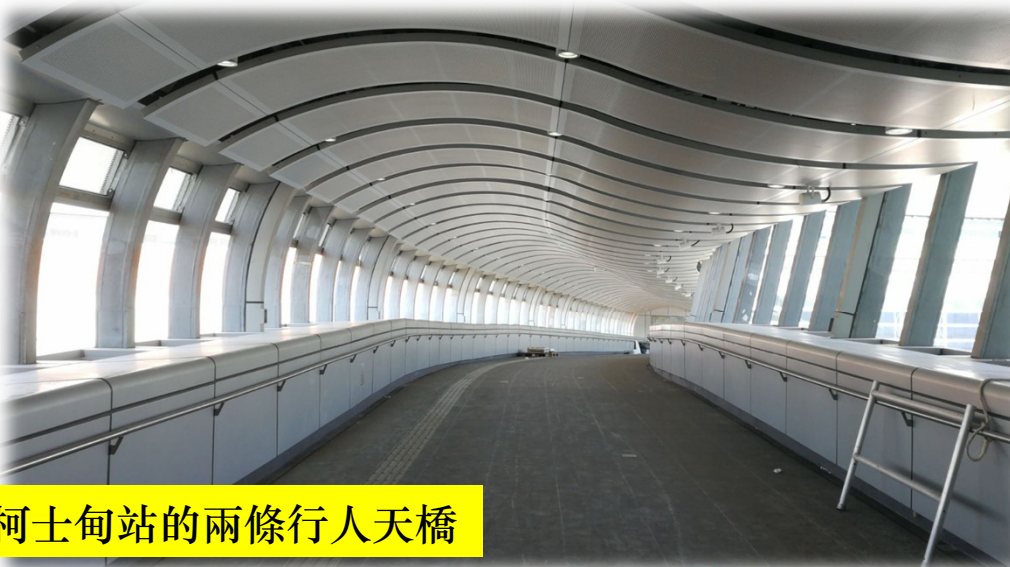

# 香港西九龍站 - 周邊道路系統

- 圖例**
- 已開路放段
  - 今年5月開通的地下行車道
  - 今年5月開通的地面環迴路
  - 行車路線

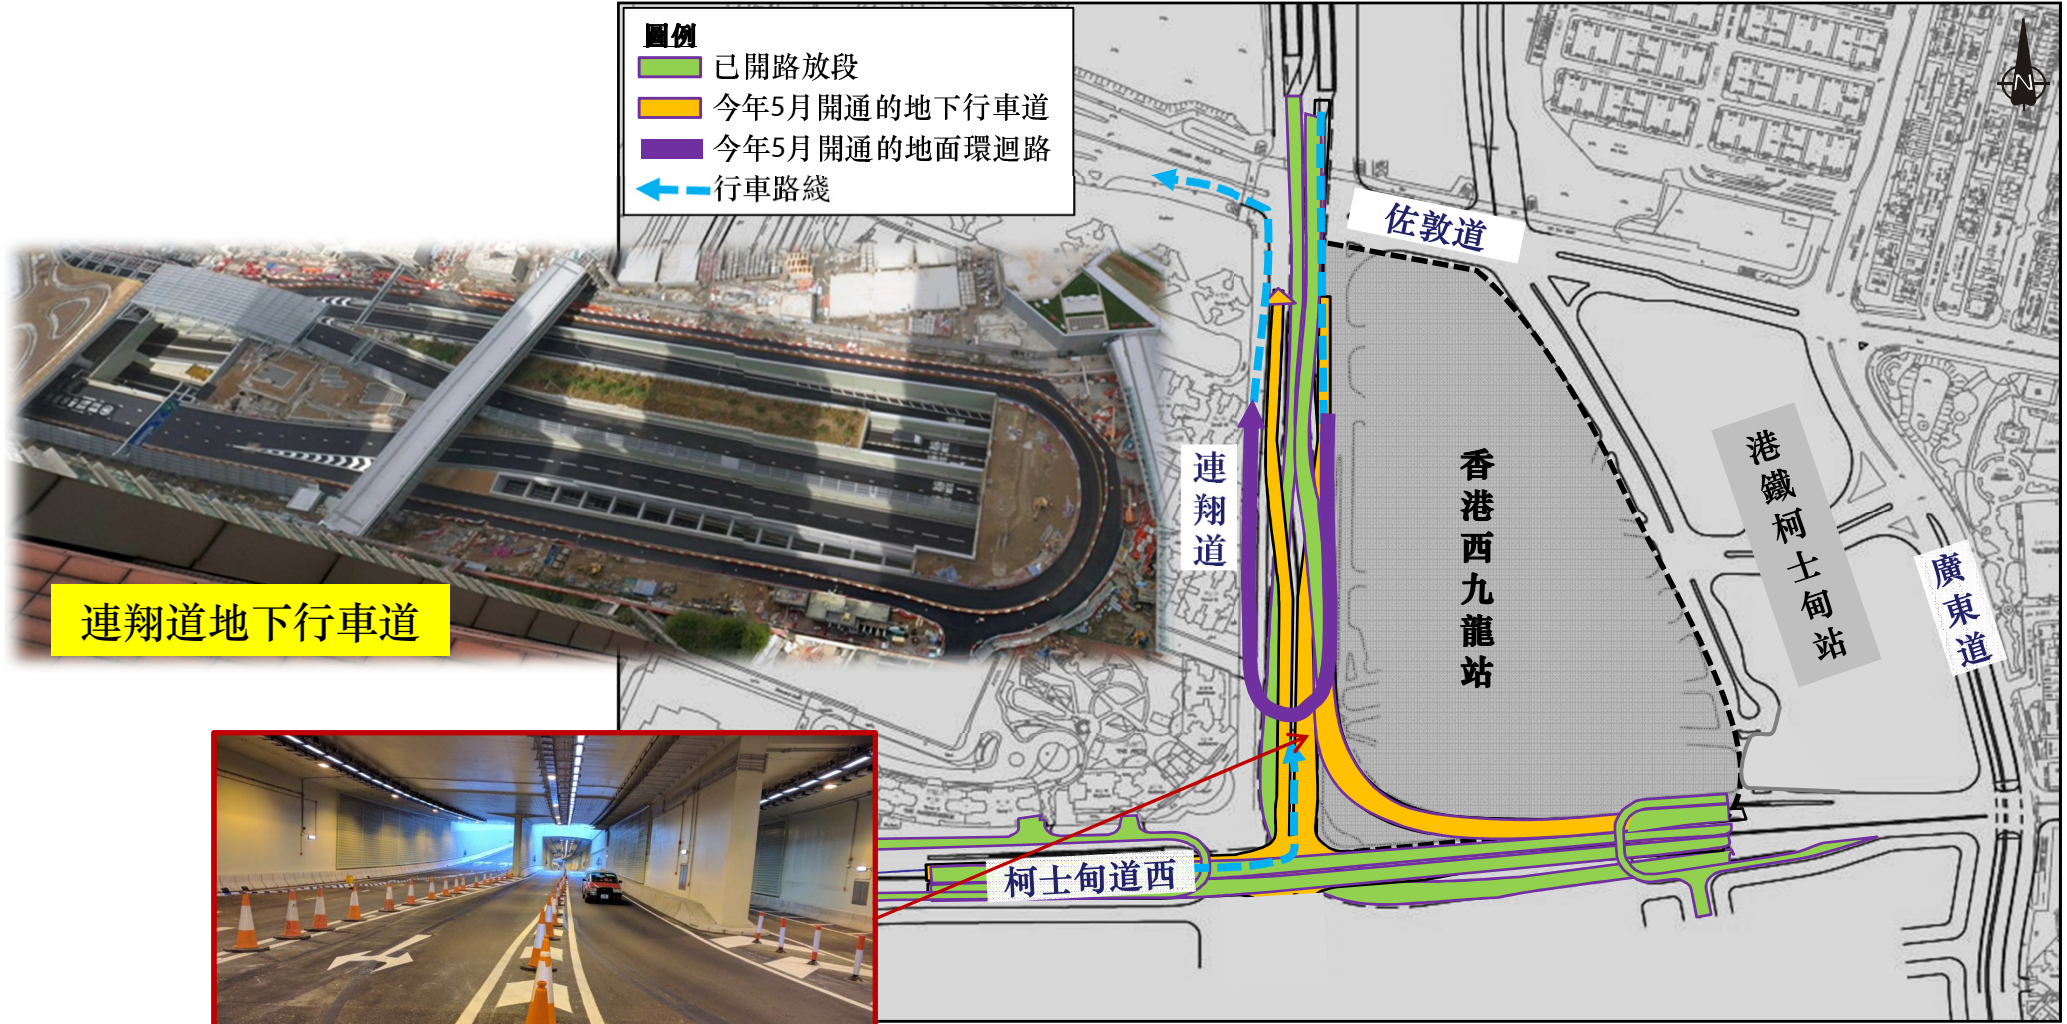

連翔道地下行車道





# 工程進度總結

- 高鐵香港段項目整體工程已完成 **99.6%**
- 正在香港西九龍站進行相關法定檢測
- 已進入試營運階段

# 試營運工作

- 四月一日開始試營運
- 人員培訓、系統磨合、進行演練
- 找出調整及改善的地方



員工進行培訓及熟習設備

## 試營運 - 列車運行

- 香港段試運行大致完成，已開始於內地段試運行
- 列車司機培訓，累積經驗及熟習路段



列車進行試運行測試

# 試營運 - 列車運行

- 監察列車運行、進行調度
- 香港段與內地段保持緊密溝通
- 緊急事故應變



石崗列車停放處

# 試營運 - 車站設施及系統

- 熟習設施、設備及營運程序
- 信號、票務等系統磨合



車站內系統及設施

## 試營運 - 口岸區

- 相關工程人員已逐步進入車站口岸區進行設備安裝工程
- 對試營運及通車前準備有直接影響



口岸區內設備安裝

# 試營運 - 票務安排

## ➤ 細節仍需商討



# 試營運 - 進行演練

- 進行各項演練
- 會與相關部門進行聯合演習



人群控制



聯合演習



緊急救援



隧道疏散



# 準備通車

- 通車目標 二零一八年九月
- 各方面達致開通條件
- 運作暢順，提供安全、舒適的高速鐵路服務

