




廣深港高速鐵路(香港段)項目進度 截至2017年10月31日

立法會交通事務委員會
鐵路事宜小組委員會


2017年12月1日

整體項目工程進度 (截至2017年10月底)


整體工程完成

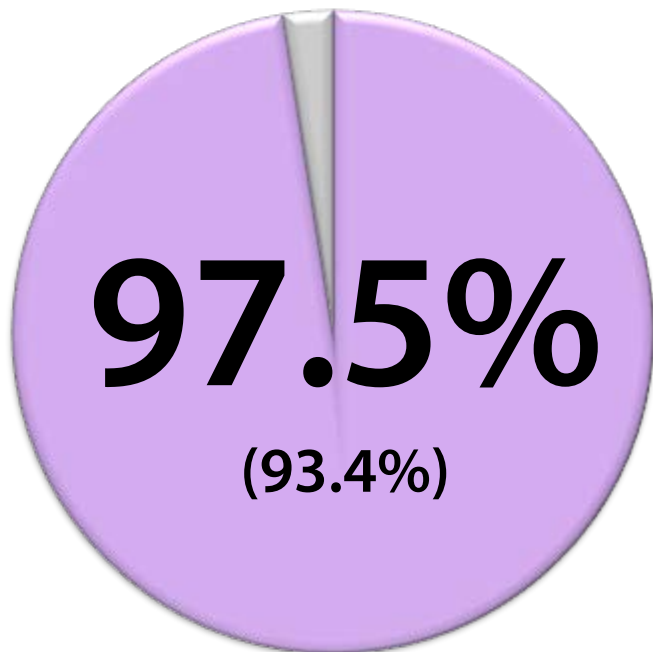

土木工程整體完成

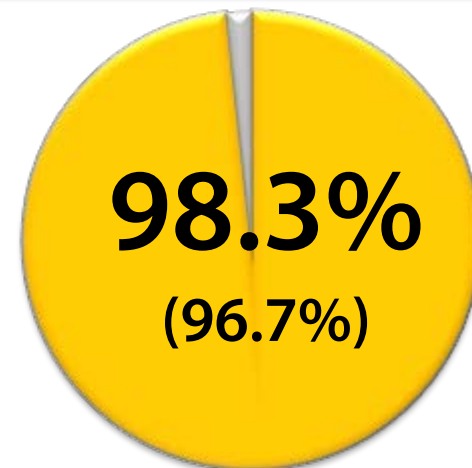

機電工程整體完成

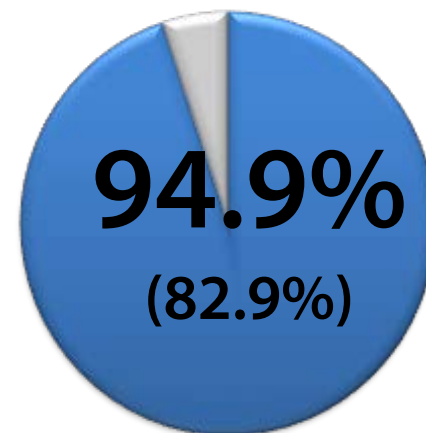

備註：弧內的百分比為該項工程以2018年第三季完工時間表的預計進度

西九龍站 - 整體進度




混凝土結構工程完成

99.3%


整體土木工程完成

95.8%


西九龍站 - 周邊道路系統

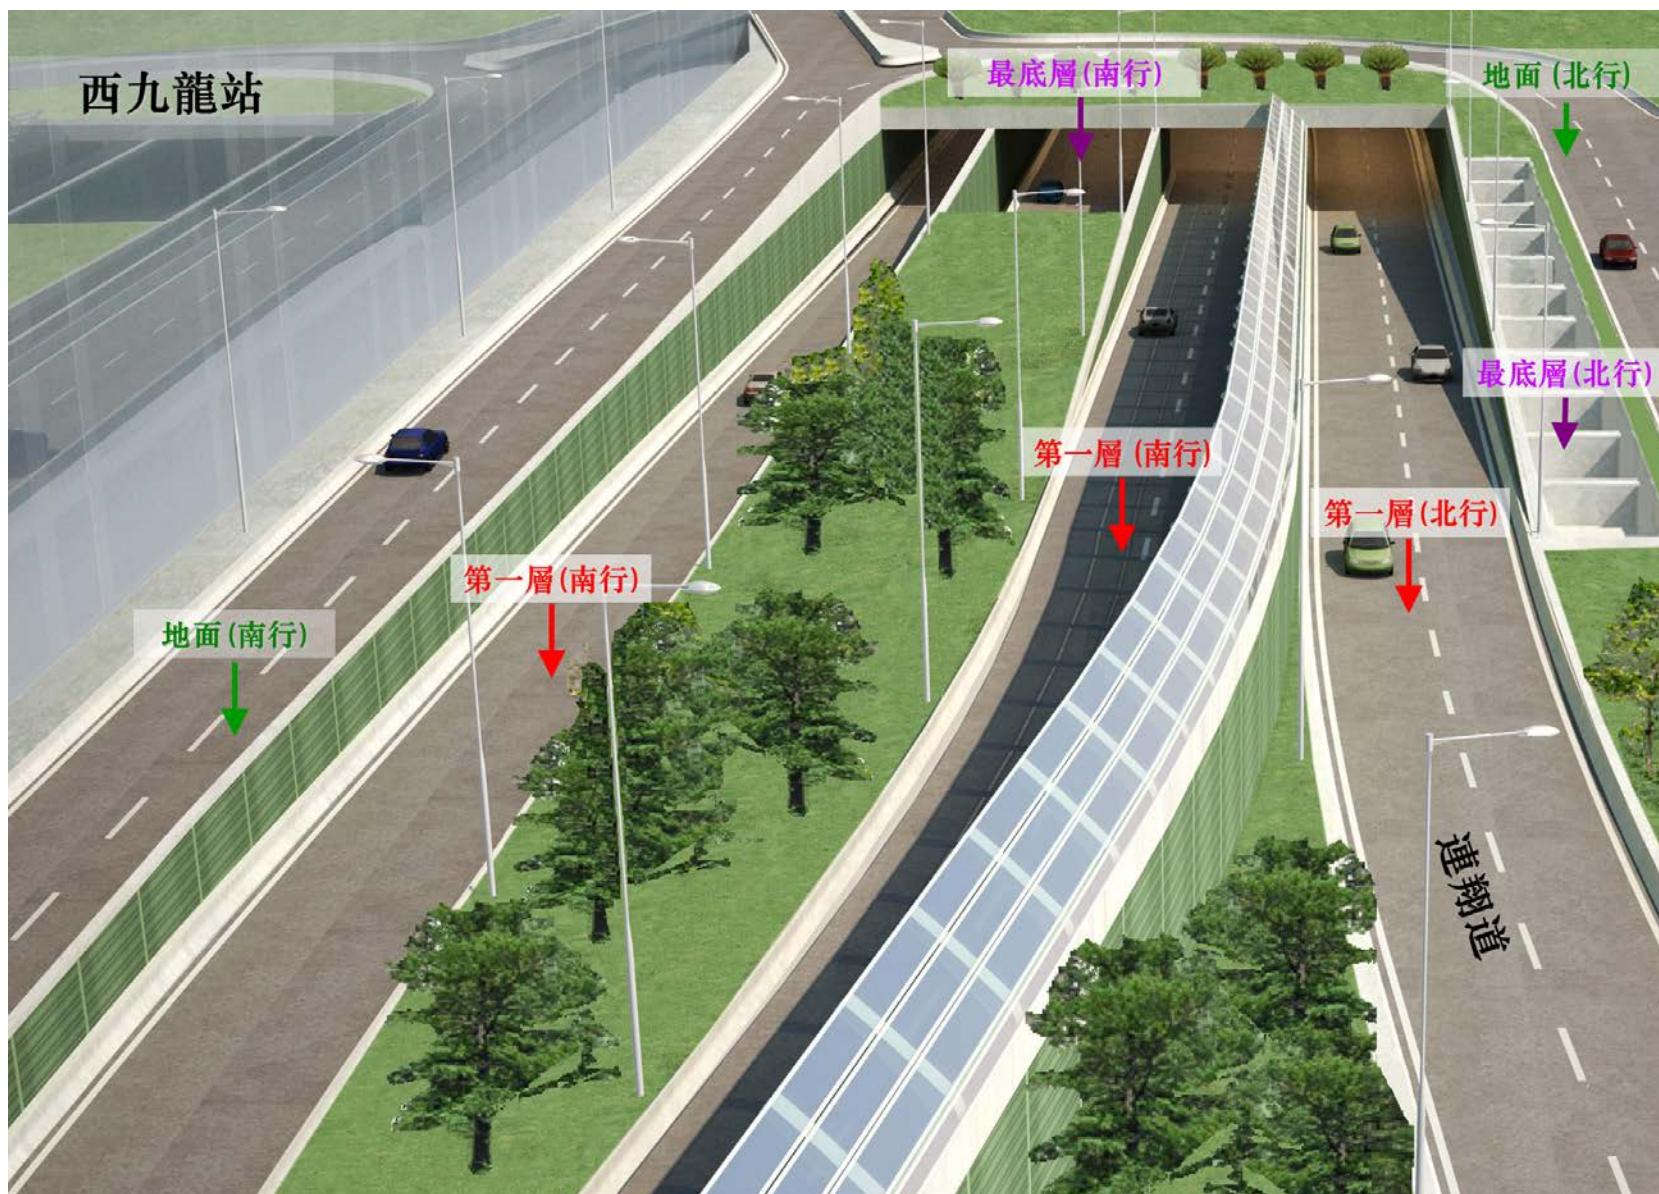

西九龍站 – 周邊道路系統

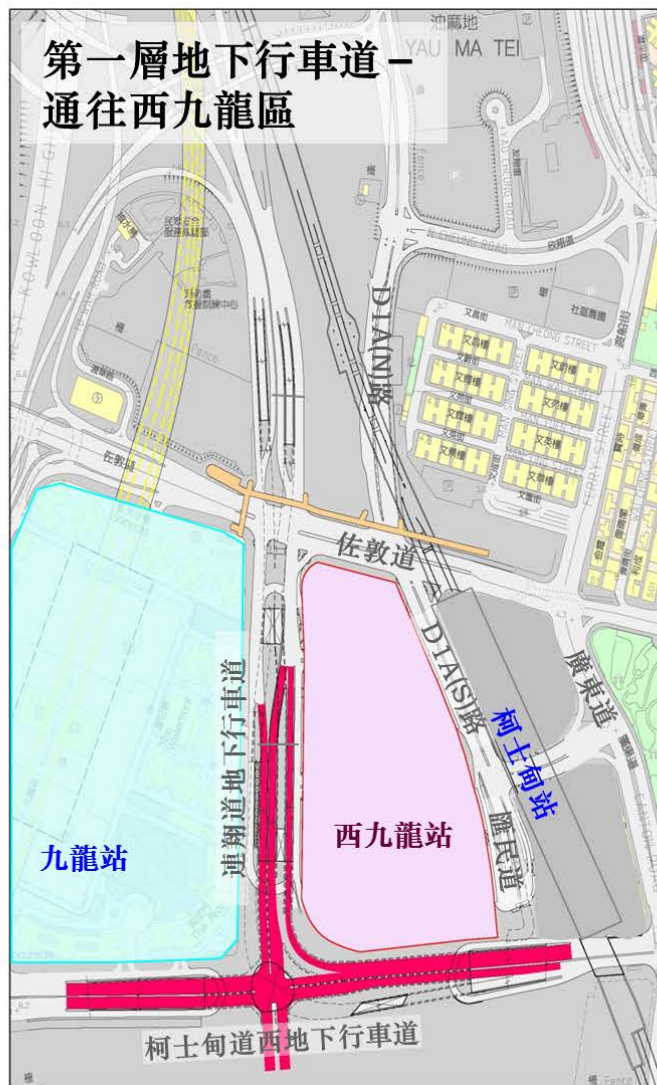


西九龍站 – 周邊道路系統

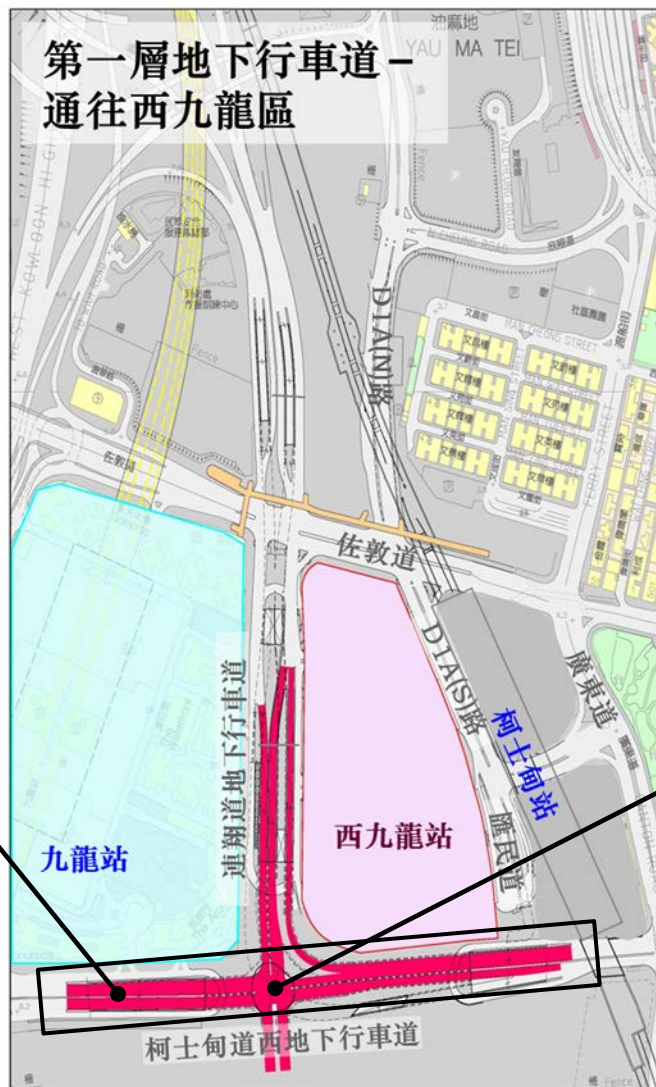

柯士甸道西之地下行車道
已於9月中開通



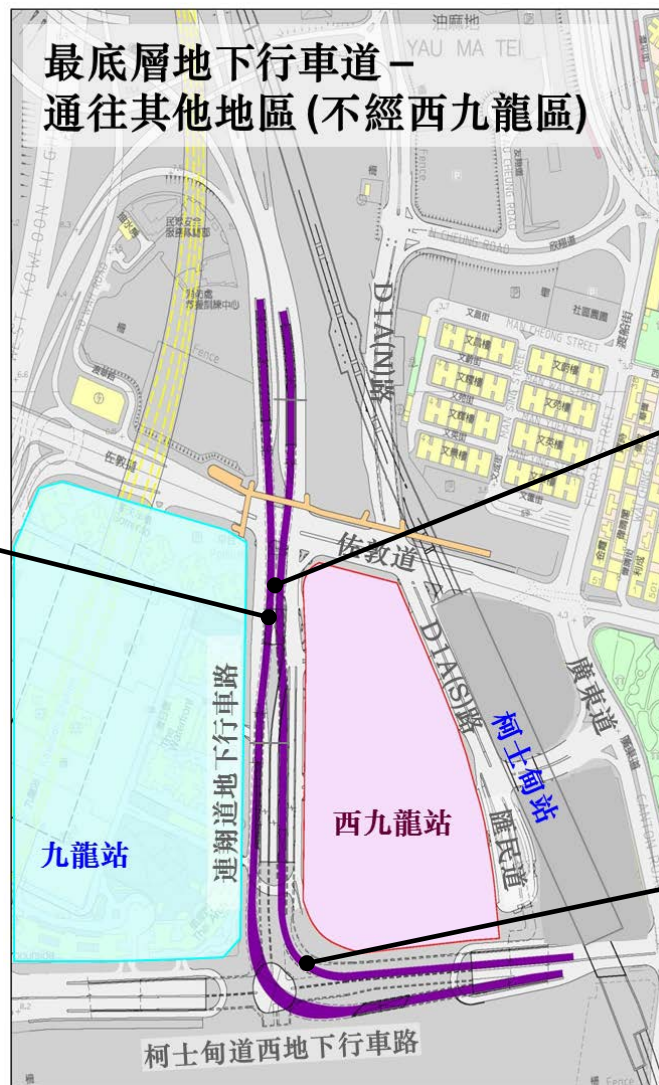

西九龍站 - 周邊道路系統


最底層地下行車道 -
通往其他地區 (不經西九龍區)



西九龍站 - 周邊行人網絡

圖例:

-  行人天橋
-  行人通道
-  行人隧道
-  地面行人區



連接西九龍站與九龍站發展項目的東北角

連接西九龍站與九龍站發展項目的正東面

連接西九龍站與九龍站發展項目的東南角

連接新建巴士總站與八文樓

新建巴士總站

連接西九龍站與佐敦道天橋及新建巴士總站


連接西九龍站與柯士甸站北面

連接西九龍站與柯士甸站南面

西九龍站 - 入口幕牆工程

圖例：

- 玻璃組件
- 鋁製組件
- 混凝土澆灌

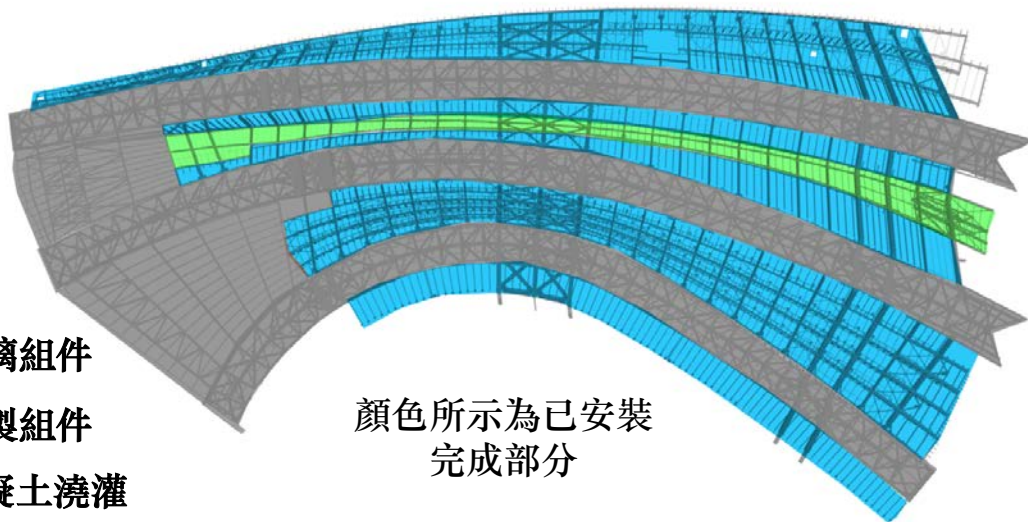

西九龍站 - 站內工程



電腦模擬圖



站內現況

西九龍站 - 室內裝修、屋宇設備及機電工程

室內裝修工程



安裝櫃枱



隔煙幕測試

屋宇設備及機電工程



室內照明系統



升降機測試

機電工程主要進度

- 已開始與內地段進行聯調聯試
- 高速綜合檢測車已完成鐵路基建及系統的檢測



高速綜合檢測車完成高鐵香港段檢測

高鐵香港段列車

- 所有高鐵香港段列車已運抵本港，並開始跨境動態測試



高鐵列車開放日



項目進度總結 (截至2017年10月底)

➤ 機電工程

- 機電工程整體完成 **94.9%**
- 正與內地段進行聯調聯試
- 預計於今年年底進行全綫的第三方獨立測試



顯示屏及系統測試



項目進度總結 (截至2017年10月底)

➤ 西九龍站

- 整體土木工程完成 **95.8%**
- 車站入口幕牆之玻璃組件已大致完成安裝
- 全力推展室內裝修及屋宇設備安裝工程
- 協調移交內地口岸區予內地相關部門以安裝其設備



香港口岸區
