

立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(4)500/16-17(04)號文件

檔號：CB4/PS/1/16

交通事務委員會

鐵路事宜小組委員會

2017 年 2 月 10 日舉行的會議

有關廣深港高速鐵路香港段建造工程的 最新背景資料簡介

目的

本文件提供有關廣深港高速鐵路("高鐵")香港段建造工程的最新背景資料，並綜述鐵路事宜小組委員會("小組委員會")委員過往討論有關議題時提出的主要意見和關注事項。

背景

2. 高鐵從香港到廣州全長約 140 公里，途經深圳福田、龍華和東莞虎門。廣州總站位於石壁，是廣佛都市圈的中心。高鐵內地段以石壁站為起點，經皇崗進入香港境內。

3. 香港段是長約 26 公里的地下鐵路線，由皇崗邊界往坐落西九文化區以北、機場快線九龍站與西鐵線柯士甸站之間的西九龍總站。高鐵香港段的走線圖及主要發展時序分別載於**附錄 I**及**附錄 II**。

撥款安排

4. 在 2008 年 4 月 22 日，行政會議決定採用服務經營權模式以落實高鐵香港段鐵路項目。在該模式下，高鐵香港段工程會在工務計劃下由政府當局撥款興建。在 2008 年 7 月，立法會財務委員會("財委會")批准撥款 27 億 8,260 萬元(按付款當日價格計算)，為這項工程計劃進行設計和地盤勘測工作，而這項工作已委託香港鐵路有限公司("港鐵公司")進行。在 2009 年 10 月

20 日，行政會議決定要求港鐵公司根據服務經營權模式進行高鐵香港段的建造、測試及試行運作。

5. 財委會在 2010 年 1 月 16 日批准以下撥款申請：

- (a) 鐵路建造工程(按付款當日價格計算，估計所需費用為 550 億元)，其分項數字載於**附錄 III**；
- (b) 非鐵路建造工程(按付款當日價格計算，估計所需費用為 118 億元)，其分項數字載於**附錄 IV**；及
- (c) 就高鐵香港段項目發放的特設特惠津貼(估計所需費用為 8,600 萬元)。

6. 政府當局於 2010 年 1 月 26 日與港鐵公司簽訂委託協議，委託該公司進行高鐵香港段項目的建造和試行運作。高鐵香港段的建造工程於 2010 年 1 月底展開。高鐵香港段項目的鐵路及非鐵路建造工程的工程計劃範圍分別載於**附錄 V** 及**附錄 VI**。

監察機制

7. 根據上述的委託協議，港鐵公司負責全面管理高鐵香港段項目。政府當局表示會全力監察港鐵公司的工作，確保項目的實施工作符合核准工程預算、品質優良，並能如期完成。¹

8. 政府當局在 2010 年 4 月 16 日向小組委員會提交文件，載列政府當局監察高鐵香港段建造工程的機制。有關監察機制的流程圖和詳情載於**附錄 VII**。

高鐵香港段項目的延誤情況

9. 在 2014 年 4 月 15 日，政府當局及港鐵公司宣布由於惡劣的天氣和困難的地質條件，港鐵公司無法按原先目標，在 2015 年完成高鐵香港段的建造工程。據港鐵公司表示，依照當時該公司最新評估的施工進度，高鐵香港段的建造工程會延至 2016 年才完成，而由於需時進行測試及試行運作，以確保列車運行安全，高鐵香港段將於 2017 年投入服務。

¹ 立法會 CB(1)1573/09-10(04)號文件

由港鐵公司成立的獨立董事委員會

10. 港鐵公司成立了獨立董事委員會，以全面檢討高鐵香港段項目的管理方針。獨立董事委員會於 2014 年 7 月 16 日發表第一份報告²，就加強港鐵公司的制度及運作提出建議。第二份報告³於 2014 年 10 月 28 日發表，內載獨立董事委員會就各個範疇的結論，例如港鐵公司在高鐵項目管理方面的工作，以及提供予港鐵公司董事局考慮的建議。

由政府當局成立的獨立專家小組

11. 政府當局亦成立了獨立專家小組，以檢討項目管理、監察機制及其他與高鐵香港段項目延誤有關的事宜。獨立專家小組於 2014 年 12 月 15 日向行政長官提交報告，而該份報告⁴已於 2015 年 1 月 30 日公開予公眾查閱。

在立法會成立的專責委員會

12. 在 2014 年 6 月 25 日的立法會會議上，胡志偉議員及莫乃光議員就高鐵香港段項目延誤提交一份呈請書。莫乃光議員要求把呈請書交付專責委員會處理，21 名議員起立支持此項要求。因此，該份呈請書已按《議事規則》第 20(6)條的規定交付專責委員會處理。

13. 調查廣深港高速鐵路香港段建造工程延誤的背景及原委專責委員會於 2014 年 12 月展開工作，並於 2016 年 7 月 6 日的立法會會議上提交其報告⁵。專責委員會就政府當局日後可如何改善對鐵路項目建造工程的監管及加強港鐵公司在推展鐵路項目方面的監控機制，提出了 6 項建議，包括改善服務經營權模式下的架構安排；改善港鐵公司的企業管治；加強與立法會及公眾的溝通；在政府當局的工程合約強調簽署各方應有合作和互信的精神；招聘專業人員/專家及在政府當局內培訓專業人員監察鐵路項目的推展工作；以及確保在日後鐵路項目推展期間人手供應保持穩定。

² 第一份報告的連結：

http://www.expressrailink.hk/pdf/tc/report/20140716_xrl_report_chi.pdf

³ 第二份報告的連結：

[http://www.expressrailink.hk/pdf/tc/report/2nd%20Report_CHI\(Full\).pdf](http://www.expressrailink.hk/pdf/tc/report/2nd%20Report_CHI(Full).pdf)

⁴ 報告的連結：<http://www.gov.hk/tc/theme/iep-xrl/>

⁵ 報告的連結：

http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/sc/sc_gshkerl/report/gshkerl_rpt-c.pdf

匯報高鐵香港段項目的進展和財務狀況

14. 在 2010 年 4 月的小組委員會會議上，委員同意當局應每隔 6 個月就高鐵香港段建造工程的進展和財務狀況提交報告。為加強向立法會匯報高鐵香港段建造工程的進展和財務狀況，自 2014 年第四季起，政府當局每季均向小組委員會提交有關報告。最新一份季度報告涵蓋截至 2016 年 12 月 31 日為止的情況。

有關高鐵香港段項目的目標完工日期和委託費用的最新情況

港鐵公司所提交高鐵香港段項目的最新目標完工日期和修訂委託費用預算

15. 在 2015 年 6 月 30 日，港鐵公司向政府當局提交高鐵香港段項目的最新目標完工日期和修訂委託費用預算⁶。根據港鐵公司的評估，高鐵香港段未能於 2017 年年底完工通車，而需要進一步推遲至 **2018 年第三季**，當中包括 6 個月的緩衝時間。至於委託費用預算，港鐵公司則修訂為 853 億元，當中包括 832 億元的新修訂工程費用，以及 21 億元備用資金。當時提交的委託費用預算為 853 億元，較原來 650 億元的委託費用預算高出 31.2%，亦較港鐵公司於 2014 年 8 月公布的修訂預算 715 億元，高出 19.3%⁷。

16. 港鐵公司表示，令工程進度落後的主要原因，包括不可預期的工地狀況、與隧道鑽挖機相關的事宜、工程前期緊縮的準備時間及設計修訂，以及生產效率遜於預期和勞工短缺問題。為應付已知的風險及不確定因素，有需要預留 6 個月的緩衝時間。至於委託費用預算方面，工程費用需予增加，是由於以下原因所致：工程時間表延長；因應各種未能預見的情況而令作業範圍或施工需要改動所衍生的額外費用；以及額外工程費用，特別是工資及物料價格。

⁶ 立法會 CB(4)1228/14-15(01)號文件

⁷ 港鐵公司於 2014 年 8 月公布，高鐵香港段項目的委託費用預算為 715 億 2,000 萬元。此估算是基於高鐵香港段可於 2017 年年底通車的目標完工日期而作出。

政府當局對高鐵香港段項目的最新目標完工日期和修訂委託費用預算所作的回應

17. 在 2015 年 7 月 3 日的小組委員會會議上討論最新目標完工日期和修訂委託費用預算時，政府當局對高鐵香港段工程進一步的延誤和超支情況表示高度關注⁸。政府當局認為，港鐵公司受委託作為高鐵香港段的項目管理人，有最大的責任和義務控制工程成本和管理風險。

18. 根據政府當局審核港鐵公司提交的最新目標完工日期及修訂委託費用預算的結果⁹，為了要在 2018 年第三季的最新目標日期完工，港鐵公司必須密切監察各關鍵合約的進度、適時與相關承建商商討落實修訂時間表的事宜，以及設立有效的風險監察制度，監察各項可有效減低項目風險的緩解措施。修訂委託費用預算最終下調至 844 億 2,000 萬元。

19. 鑒於高鐵香港段項目超支，政府當局與港鐵公司於 2015 年 11 月 30 日達成的協議("高鐵香港段協議")如下：

- (a) 政府當局承擔及支付高鐵香港段工程超支部分，上限為 194 億 2,000 萬元。如進一步超支，港鐵公司將自行承擔及支付該超支部分；
- (b) 港鐵公司將向股東(包括作為大股東的政府)派發每股 4.4 元的特別股息；
- (c) 政府當局保留以下權利：與港鐵公司透過仲裁解決該公司的責任問題，同時作為仲裁的一部分，就政府當局與港鐵公司於 2010 年 1 月簽訂的委託協議中有關港鐵公司責任上限的條文提出異議；及
- (d) 如仲裁員決定(i)港鐵公司的責任上限有效，以及(ii)若無此責任上限，港鐵公司就目前項目超支的責任超過此責任上限，則港鐵公司會召開特別股東大會，尋求獨立股東同意支付超過責任上限的款項(即超過上限的責任)。

然而，高鐵香港段協議有以下附帶條件：(a)得到港鐵公司獨立股東在特別股東大會上的同意，以及(b)得到財委會在 2015-2016 立法年度內同意批出款項，以支付目前項目超支的

⁸ 立法會 CB(4)1273/14-15(01)號文件

⁹ 立法會 CB(4)280/15-16(02)號文件

部分。在 2016 年 2 月 1 日舉行的港鐵公司股東大會上，獨立股東支持有關批准、確認及追認高鐵香港段協議條款的決議案。財委會亦於 2016 年 3 月 11 日批准有關撥款申請¹⁰。

20. 根據港鐵公司提交的進度報告¹¹，截至 2016 年 9 月 30 日，高鐵香港段項目整體工程按 2018 年的完工時間表已完成 84.1%，而預期進度為 82.1%。由於西九龍總站是一個規模龐大的車站，涉及的工程量大，對完成高鐵香港段項目仍然至為關鍵。有關隧道工程及列車測試的進度、西九龍總站建造工程的進度、機電工程及信號系統、工程挑戰，以及施工的預備及協調工作的詳情，請參閱立法會 CB(4)243/16-17(08)號文件的附件。

小組委員會委員提出的主要關注事項

工程延誤及超支

21. 委員對於高鐵香港段項目不斷出現延誤及嚴重超支的問題表示深切關注。

22. 部分委員曾質疑，港鐵公司及公職人員曾否刻意隱瞞事實及向立法會提供虛假資料。他們亦關注工程進度，同時詢問局部開通鐵路線以便高鐵香港段項目盡早通車的做法是否可行。港鐵公司回應時表示，該公司現時的目標是按照最新的目標完工日期，即在 2018 年第三季前，盡快完成有關項目，建成設有 10 條軌道的車站及各條隧道。

23. 在 2015 年 7 月 3 日的小組委員會會議上，委員詢問當局基於甚麼原因於 2009 年將項目估算由 980 億元大幅降低至 670 億元。政府當局回應時表示，當局與港鐵公司經過多番商討，並由第三方專家覆檢後，才得出項目估算為 670 億元這個數額。政府當局指出，港鐵公司在 2010 年收回的工程合約投標報價，較該公司原先的造價估算為低。

24. 由於截至 2015 年 12 月 31 日，承建商方面尚未解決的申索金額達 233 億 5,700 萬元，委員憂慮高鐵香港段項目的總委託費用最終可能超出 844 億 2,000 萬元。政府當局表示，尚未解決的申索金額是承建商提出的申索總金額，而非已獲解決的

¹⁰ 立法會 FCR(2015-16)46 號文件

¹¹ 立法會 CB(4)243/16-17(08)號文件的附件

申索的實際金額。港鐵公司會按相關的合約條文審核每宗申索，而具有理據的申索須經政府當局及其監察和核證顧問覆檢，最後由港鐵公司的項目監控小組批核。

25. 鑒於高鐵香港段的延誤及超支情況嚴重，小組委員會部分委員曾建議停止推展該項目或部分項目，以免進一步浪費公帑，但其他委員對停止項目有所保留，因為此舉會令本港的經濟發展和聲譽受損。政府當局回應時表示，現階段最重要和首要達到的目標是控制成本，並在港鐵公司的協助及努力下，嘗試盡快完成整個項目。政府當局又表示，如高鐵香港段項目的工程合約暫停或終止，項目所涉及的額外開支須由政府當局支付。

高鐵香港段協議

26. 就高鐵香港段協議而言，部分委員認為，港鐵公司透過舉債向政府當局派發特別股息，以填補工程超支金額的做法，會把債務負債轉嫁港鐵公司股東。由於港鐵公司或會為維持其利潤水平而調高港鐵票價或取消部分票價優惠措施，因此公眾將會受到影響。

27. 港鐵公司解釋，在商界而言，上市公司透過舉債以支付向股東派發的股息，並非不尋常的做法。至於港鐵票價，目前已設有調整機制，每年就港鐵票價進行檢討。

28. 就委員有關高鐵香港段協議第 B(i)條的條文的提問，港鐵公司解釋，高鐵香港段協議訂有若干豁免條款，訂明港鐵公司沒有責任承擔超出 844 億 2,000 萬元以外的進一步超支金額，但出現此類豁免的情況並不常見。這類豁免的例子包括：發生不可抗力事件、影響整體建造費用的法例改動，以及暫停工程項目的相關合約。高鐵香港段協議內還有另一項條文，訂明倘政府當局被要求或確實支付進一步超支中的委託費用金額，港鐵公司須於合理可行情況下盡快就政府當局所支付的金額，向政府當局作出彌償。關於高鐵香港段協議第 B(i)條的條文，港鐵公司表示，該條文所指的情況是，出現影響整個建造業及建造成本的法例改動。

29. 委員問及為何政府當局選擇透過仲裁而非其他方法，向港鐵公司追究責任。政府當局回答時表示，政府當局與港鐵公司簽訂的委託協議訂明，雙方會透過仲裁解決爭議。相比其他解決爭議的方法，仲裁所耗用的時間及費用亦較少。

設置一地兩檢的邊界管制設施的安排("一地兩檢"安排)

30. 委員關注到在西九龍總站實施"一地兩檢"安排的進展，並促請政府當局盡快解決相關的法律及憲制問題，因為實施"一地兩檢"安排，對於體現高鐵香港段的原意，即符合高速、省時的特點，實在十分重要。

31. 在2015年12月4日及12月14日的小組委員會會議上，委員擔憂在嘗試落實"一地兩檢"安排時，香港和內地當局均可能會向全國人民代表大會常務委員會提出，把與海關、出入境和檢疫等有關的國家法律納入《基本法》附表三，使該等國家法律可適用於香港。他們認為，容許內地執法機關在西九龍總站執行該等國家法律，有違《基本法》的規定，亦有損香港的法治。律政司司長在2015年12月14日的小組委員會會議上解釋，內地及香港當局會確保"一地兩檢"安排必須符合《基本法》及"一國兩制"的原則。

32. 在2016年12月9日的小組委員會會議上，有鑒於政府當局投資大筆公帑興建高鐵香港段項目及就"一地兩檢"安排事宜討論多年，委員促請政府當局就"一地兩檢"安排提供具體詳情。他們建議政府當局定期向立法會匯報落實"一地兩檢"安排的進展，並就落實"一地兩檢"安排所需的本地立法工作提供暫定時間表。

33. 據政府當局¹²於2017年1月表示，律政司、運輸及房屋局、保安局和政制及內地事務局一直與內地相關部委就"一地兩檢"安排進行商討。由於當中涉及眾多複雜的憲制、法律和運作上的問題，所以雙方一直就相關問題的處理作出反覆商討和深入研究。當雙方就高鐵香港段的"一地兩檢"安排達成共識後，政府當局會盡快向立法會和社會大眾匯報，讓社會各界有機會表達意見，並讓政府當局回應有關疑問。政府當局繼而會按着高鐵香港段的目標通車日期，即2018年第三季，推展本地立法工作。

勞工短缺問題

34. 委員就高鐵香港段項目的勞工短缺問題表示關注，並促請相關政策局，如運輸及房屋局和勞工及福利局，協助港鐵公司解決勞工短缺問題。在2015年7月3日的小組委員會會議上，委員詢問港鐵公司就高鐵香港段項目訂定最新的目標完工

¹² <http://www.info.gov.hk/gia/general/201701/11/P2017011100495.htm>

日期時，有否考慮熟練工人短缺所產生的風險和不明朗因素；以及按照最新的目標完工日期，需要輸入多少名工人才可完成該項目。港鐵公司回應時表示，最新的目標完工日期已涵蓋 6 個月的緩衝時間，而人手供應短缺等已知的風險和不明朗因素亦已包括在內。儘管如此，港鐵公司會致力透過補充勞工計劃及"先聘用後培訓"計劃，增加工人的數目。該公司期望透過加快補充勞工計劃的申請程序，可以招聘更多工人，以應付高鐵香港段項目的人手需求。

35. 截至 2015 年年底，與原定的工人數目比較，高鐵香港段項目欠缺大約 575 名工人¹³。在 2016 年 6 月 27 日的小組委員會會議上，港鐵公司回應委員就勞工短缺問題提出的關注時表示，高鐵香港段項目已進入設備安裝和裝修階段，在未來 12 個月至 20 個月，機電工人的需求將會由現時 400 名增至大約 1 000 名。完成觀塘線延線及南港島線(東段)後的機電工人只可填補部分空缺。就此，鑒於機電工人的供應短缺，高鐵香港段項目的承建商正提出申請，根據補充勞工計劃輸入大約 160 名機電工人。關於西九龍總站的建造工程，現時約有 4 000 名工人在工地現場工作。承建商會按需要透過補充勞工計劃為西九龍總站申請輸入工人。

列車的安全管理措施

36. 在 2014 年 7 月 4 日的小組委員會會議上，委員深切關注到高鐵香港段的高速列車的安全，特別是有部分傳媒報道指高鐵列車未能符合有關列車耐撞性的歐盟 EN 15227 標準。政府當局回應時告知小組委員會，當局已要求港鐵公司提交由獨立顧問擬備關於核實高鐵列車車身結構強度的報告。

37. 根據政府當局在 2016 年 6 月提供的資料¹⁴，路政署及機電工程署已完成審核港鐵公司提交的列車碰撞風險評估，認同港鐵公司已採取合理可行的安全保障措施，以防止高鐵列車發生碰撞，此舉符合國際鐵路業的一貫做法。路政署及機電工程署亦知悉，港鐵公司已聘請了獨立顧問核實列車的主動安全防護及相關風險處理符合 EN15227 標準，並已把風險減至可接受的水平。

38. 除列車碰撞風險評估外，港鐵公司已委託生產商為港鐵公司所購買的 CRH380A 列車進行列車碰撞分析，確認該款列車

¹³ <http://www.info.gov.hk/gia/general/201602/03/P201602030616.htm>

¹⁴ 立法會 CB(4)1167/15-16(01)號文件

在歐盟 EN15227 標準所設置的碰撞情境下，可抵禦時速 25 公里的碰撞。機電工程署、港鐵公司及列車生產商分別聘請獨立顧問審核該列車碰撞分析報告。各獨立顧問均認同港鐵公司所購買的 CRH380A 列車在歐盟 EN15227 標準所設置的情境下，可抵禦時速 25 公里的碰撞。

其他關注

39. 委員亦在過往的小組委員會會議上對下列事宜表示關注：

- (a) 高鐵香港段項目的建造安全事宜；
- (b) 西九龍總站入口建造工程的進展；及
- (c) 高鐵香港段項目信號系統的事宜，包括高鐵香港段和內地段信號系統的兼容性及採購工作。

立法會質詢及相關文件

40. 在第五屆和第六屆立法會，議員曾就高鐵香港段項目提出 19 項質詢，內容包括工程進度、項目超支、“一地兩檢”安排，以及建造工程對附近地區的影響。上述立法會質詢的超文本連結及相關文件分別載於**附錄 VIII**及**附錄 IX**。

最新發展

41. 政府當局計劃於 2017 年 2 月 10 日的會議上，向小組委員會匯報高鐵香港段建造工程的最新進展。

立法會秘書處

議會事務部 4

2017 年 2 月 6 日



The proposed alignment of the Hong Kong Section of the Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link (XRL)

圖則名稱 drawing title

工務計劃項目第53TR號
廣深港高速鐵路香港段 — 鐵路建造工程
香港段位置圖
PWP ITEM NO. 53TR
HONG KONG SECTION OF GUANGZHOU-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS RAIL LINK - CONSTRUCTION OF RAILWAY WORKS
LOCATION PLAN OF HONG KONG SECTION

S. H. LAM
總工程師
CHIEF ENGINEER

23/11/09
日期
DATE

設計 designed
K. K. LEI
繪圖 drawn
Y. L. MA
校對 checked
K. K. LEI
核准 approved
C. W. YUNG

圖號 drawing no.

HRWXRL002-SP0009

版權所有 COPYRIGHT RESERVED

鐵路拓展處 RAILWAY DEVELOPMENT OFFICE

路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT

廣深港高速鐵路("高鐵")香港段項目 主要發展時序

- 2000 年，在《鐵路發展策略 2000》最早建議落實高鐵(前稱區域快線)項目。
- 2005 年 3 月，有關當局決定高鐵以香港西九龍和廣州石壁為終站，途經深圳龍華和東莞虎門兩個中途站。
- 2005 年 7 月，當時的九廣鐵路公司就高鐵香港段建議兩個走線方案，即建造一條從西九龍總站至邊界，全新的專用路軌("專用通道方案")；或與九龍南線、西鐵及擬建的北環線共用路軌，再加上一條鋪設至邊界的新建路軌("共用通道方案")。
- 2006 年 1 月，行政長官會同行政會議考慮了財務因素、對西鐵線服務的潛在影響及就當時的規劃假設而作出的乘客量預測，決定以共用通道方案繼續推進高鐵香港段的發展。
- 其後，高鐵內地段出現了各項的規劃變動，對香港段選用哪個通道方案有重大影響 ——
 - 有機會大幅度增加長途列車服務；
 - 於深圳福田設站，連接新建議的城際鐵路線；及
 - 鐵道部要求高鐵車廂闊度增至 3.4 米。

因此，若採用共用通道方案，高鐵乘客量及列車數目的增加會使西鐵線在高鐵通車後不久達飽和。

另外，由於當中有關的 3 個西鐵線月台的設計只可容納 3.1 米寬的列車，不能容納 3.4 米的車廂闊度要求，因此，月台須進行改建。改建工程需時約 3 年，每個受影響的月台亦須關閉 6 個月。

- 2007 年 4 月 17 日，行政長官會同行政會議考慮了上述各點，並了解專用通道方案可更有效接駁至國家鐵路網，原則同意高鐵香港段採用專用通道方案。

- 行政長官於 2007 年 8 月 2 日在粵港合作聯席會議第十次會議後公布採用專用通道方案建造高鐵香港段。
- 行政長官於 2007 年 10 月宣布擬建的高鐵香港段為十大基建工程項目之一。
- 2008 年 4 月 22 日，行政長官會同行政會議決定邀請香港鐵路有限公司("港鐵公司")進行高鐵香港段的進一步規劃和設計工作。2008 年 7 月 8 日，財務委員會("財委會")批准有關撥款以進行高鐵香港段的設計及地盤勘測研究。
- 高鐵香港段的鐵路方案於 2008 年 11 月 28 日及 12 月 5 日根據《鐵路條例》刊登憲報。詳細設計工作於 2009 年 1 月展開。
- 2009 年 10 月 20 日，行政長官會同行政會議批准落實高鐵香港段項目，並批准政府當局向財委會要求撥款的建議，以便工程可在 2009 年年底展開，在 2015 年通車。
- 工務小組委員會於 2009 年 12 月 3 日的會議上，通過高鐵香港段項目的撥款建議和特設特惠安置方案。
- 財委會於 2010 年 1 月 16 日批准有關撥款建議。
- 2010 年 6 月，政府當局提交 2010 年 1 月 16 日至 6 月 30 日的首份半年度報告。鐵路事宜小組委員會("小組委員會")於 2010 年 7 月 6 日的會議上討論該報告。
- 2011 年 3 月，政府當局提交 2010 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的第二份半年度報告。小組委員會於 2011 年 5 月 20 日的會議上討論該報告。
- 2011 年 9 月，政府當局提交 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的第三份半年度報告。
- 2012 年 4 月，政府當局提交 2011 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的第四份半年度報告。
- 2012 年 10 月，政府當局提交 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的第五份半年度報告。

- 2013 年 5 月，政府當局提交 2012 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的第六份半年度報告。小組委員會於 2013 年 5 月 24 日的會議上討論該報告。
- 2013 年 10 月，政府當局提交 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的第七份半年度報告。小組委員會於 2013 年 11 月 22 日的會議上討論該報告。
- 2014 年 4 月 15 日，政府當局及港鐵公司宣布高鐵香港段的通車日期將延至 2017 年。政府當局於 2014 年 5 月向小組委員會提交文件，載述有關高鐵香港段工程的最新情況，當中包括截至 2014 年 3 月底高鐵香港段建造工程的進度。
- 2014 年 11 月，政府當局提交一份半年度報告，匯報由 2014 年 4 月 1 日至 9 月 30 日高鐵香港段各項主要工程進展、指標和財務狀況。小組委員會於 2015 年 1 月 2 日的會議上討論該報告。
- 2015 年 3 月，政府當局提交一份季度報告，匯報由 2014 年 10 月 1 日至 12 月 31 日高鐵香港段各項主要工程進展、指標和財務狀況。小組委員會於 2015 年 3 月 6 日的會議上討論該報告。
- 2015 年 5 月，政府當局提交一份季度報告，匯報由 2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日高鐵香港段各項主要工程進展、指標和財務狀況。小組委員會於 2015 年 5 月 19 日的會議上討論該報告。
- 2015 年 6 月 30 日，港鐵公司提交高鐵香港段項目最新的目標完工日期和委託費用預算。項目完工時間會由 2017 年年底進一步推遲至 2018 年第三季(當中包括 6 個月的緩衝時間)，而委託費用預算則為 853 億元(當中包括 832 億元的最新修訂工程費用及 21 億元備用資金)。2015 年 7 月 3 日，小組委員會與政府當局及港鐵公司舉行會議，討論最新的目標完工日期和委託費用預算。
- 2015 年 8 月，政府當局提交一份季度報告，匯報涵蓋截至 2015 年 6 月 30 日為止高鐵香港段建造工程的最新進展。

- 2015 年 11 月 30 日，政府當局與港鐵公司就高鐵香港段項目超支達成一項協議("高鐵香港段協議")。
- 2015 年 11 月，政府當局提交其審核港鐵公司有關修訂目標完工日期及委託費用預算的檢視結果的資料。政府當局表示，除了財委會於 2010 年 1 月批准的撥款外，在 2016 年 7 月前還需要額外合共 196 億元，以推展高鐵香港段項目。
- 2015 年 11 月，政府當局提交一份季度報告，匯報涵蓋截至 2015 年 9 月 30 日為止高鐵香港段建造工程的最新進展。
- 2015 年 12 月 23 日，政府當局向工務小組委員會提交 196 億元的額外撥款申請。
- 2016 年 2 月 1 日，港鐵公司的獨立股東支持有關批准、確認及追認高鐵香港段協議條款的決議案。
- 2016 年 2 月 5 日，政府當局向財委會提交 196 億元的撥款申請。
- 2016 年 2 月，政府當局提交一份季度報告，匯報涵蓋截至 2015 年 12 月 31 日為止高鐵香港段建造工程的最新進展。
- 2016 年 3 月 11 日，財委會通過 196 億元的撥款申請。
- 2016 年 6 月，政府當局提交一份季度報告，匯報涵蓋截至 2016 年 3 月 31 日為止高鐵香港段建造工程的最新進展。
- 2016 年 9 月，政府當局提交一份季度報告，匯報涵蓋截至 2016 年 6 月 30 日為止高鐵香港段建造工程的最新進展。
- 2016 年 12 月，政府當局提交一份季度報告，匯報涵蓋截至 2016 年 9 月 30 日為止高鐵香港段建造工程的最新進展。
- 2017 年 2 月，政府當局提交一份季度報告，匯報涵蓋截至 2016 年 12 月 31 日為止高鐵香港段建造工程的最新進展。

廣深港高速鐵路香港段鐵路建造工程的分項數字

		百萬元	
(a)	鐵路建造工程	43,615	
(I)	土木工程	31,596	
	－總站	9,454	
	－隧道和相關構築物	18,985	
	－緊急救援站和列車 停放處	3,157	
(II)	建築工程	1,900	
(III)	屋宇裝備	2,500	
(IV)	鐵路機電工程	5,714	
(V)	列車	1,905	
(b)	付予香港鐵路有限公司 ("港鐵公司")進行建造工 程規劃、管理和監督，包 括經常費用和管理開支的 項目管理費	3,261	
(c)	付予由政府指派負責監察 和審核港鐵公司工作(包 括開支)的顧問的費用	95	
(d)	應急費用	4,445.5	
	小計	51,416.5	(按 2009 年 9 月價格計算)
(e)	價格調整準備	3,601.0	
	總計	55,017.5	(按付款當日 價格計算)

(資料來源：2009 年 12 月發出的立法會 PWSC(2009-10)68 號文件)

廣深港高速鐵路香港段非鐵路建造工程的分項數字

		百萬元	
(a)	進行主要公共基建工程	1,808.8	
	(I) 於西九龍總站的 7 條行人天橋	280.0	
	(II) 於西九龍總站的 2 條行人隧道	138.8	
	(III) 位於部分柯士甸道西和連翔道的地下道路系統、建造匯民路及建造行車路 D1A，以及相關的隔音屏障/隔音罩	1,390.0	
(b)	進行重置、補救及改善工程	1,200.0	
(c)	備置工程	3,519.0	
	(I) 用地 A 的備置工程	1,880.0	
	(II) 西九文化區的備置工程	1,604.0	
	(III) 深旺道行人天橋的備置工程	35.0	
(d)	興建邊境管制設施	2,609.0	
(e)	付予香港鐵路有限公司("港鐵公司")進行建造工程規劃、管理和監督，包括經常費用和管理開支的項目管理費	699.0	
(f)	付予由政府指派負責監察和審核港鐵公司工作(包括開支)的顧問費用	38.0	
(g)	提供政府設施及設備，包括消防設備、其他家具及設備 ¹	200.0	
(h)	應急費用	953.8	
	小計	11,027.6	(按 2009 年 9 月價格計算)
(i)	價格調整準備	772.4	
	總計	11,800.0	(按付款當日價格計算)

(資料來源：2009 年 12 月發出的立法會 PWSC(2009-10)69 號文件)

¹ 根據所需家具及設備的指示表計算，並包括邊境管制設施的家具及設備。

**廣深港高速鐵路("高鐵")香港段鐵路建造工程的
工程計劃範圍**

- (a) 進行高鐵香港段的鐵路建造工程，包括 ——
 - (i) 建造西九龍總站的鐵路設施，包括車站大堂、乘客等候區、月台、控制及信號系統等；
 - (ii) 建造長約 26 公里，由西九龍總站延伸至皇崗邊界的隧道；
 - (iii) 在石崗建造地下緊急救援站和地面列車停放處，並提供所需設施，作緊急救援、乘客疏散、列車和基礎設施維修用途；以及
 - (iv) 建造 8 座通風樓、1 個緊急救援入口及相關的通風豎井和隧道入口；
- (b) 採購列車、鐵路系統和安全、運作及維修設備；及
- (c) 支付政府所委任顧問的費用，以監察和審核香港鐵路有限公司在高鐵香港段鐵路工程方面的工作。


**廣深港高速鐵路("高鐵")香港段非鐵路建造工程的
工程計劃範圍**

- (a) 進行主要公共基建工程，包括 ——
 - (i) 3 條連接九龍站的行人天橋，2 條連接柯士甸站的行人天橋，1 條連接佐敦道北面公共交通交匯處的行人天橋和 1 條近文昌街跨越新行車路 D1A 的行人天橋；
 - (ii) 2 條行人隧道分別連接柯士甸站和位於連翔道西面的行人路；
 - (iii) 於柯士甸道西和連翔道建造一個地下道路系統，並設置相關的地面道路及隔音屏障/隔音罩；及
 - (iv) 建造新行車路 D1A，重建匯民路及設置相關的隔音屏障/隔音罩；
- (b) 進行重置、補救及改善工程；
- (c) 為以下項目進行備置工程 ——
 - (i) 用地 A¹上蓋物業發展；
 - (ii) 位於西九龍總站之上的西九文化區的未來發展；及
 - (iii) 將來於深旺道設置的行人天橋；
- (d) 建造和提供於西九龍總站內的政府設施及設備，包括邊境管制設施、供施工階段及運作階段於高鐵香港段隧道內使用的特別消防設備及其他相關設備；及
- (e) 支付政府所委任顧問的費用，以監察和審核香港鐵路有限公司在主要公共基建工程、重置、補救及改善工程、備置工程和有關於政府設施/設備方面的工作。

(資料來源：2009 年 12 月發出的立法會 PWSC(2009-10)69 號文件)

¹ 西南九龍分區計劃大綱草圖編號 S/K20/22A 已將該處劃為"綜合發展區(1)"用地，供西九龍總站上蓋作非鐵路發展。

政府當局為廣深港高速鐵路("高鐵")香港段建造工程而設的監察機制流程圖

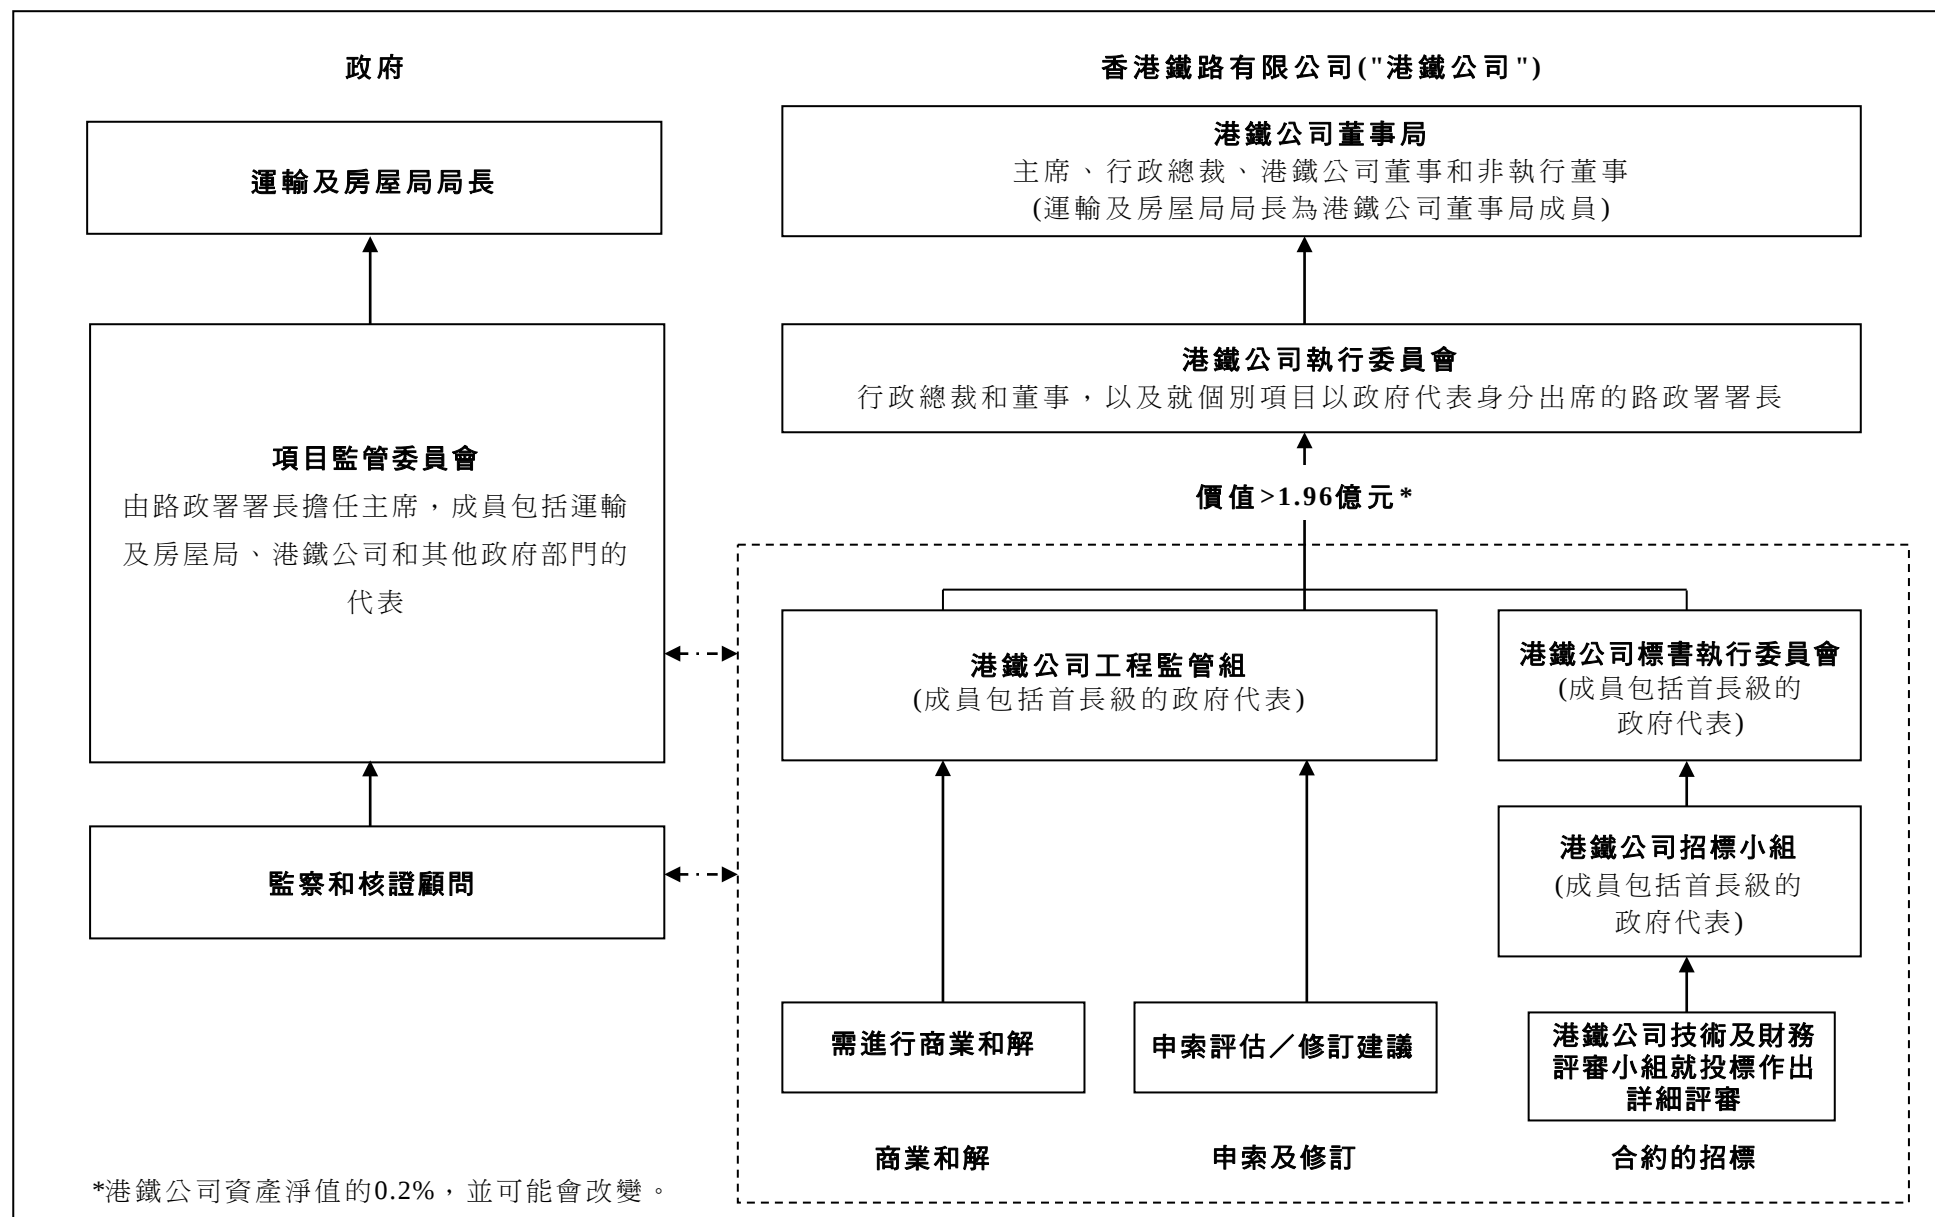

資料來源：政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至 2010 年 6 月 30 日止的首份半年度報告)提供的文件
[立法會 CB(1)2290/09-10(01)號文件](附件 3)

項目監管委員會

路政署署長是高鐵香港段項目的管制人員，負責領導高層次的跨部門項目監管委員會。委員會每月與香港鐵路有限公司("港鐵公司")及相關政府部門舉行會議，檢討項目進度，並監察採購活動、招標後的成本控制及有關合約申索的調解工作。該委員會亦會就任何影響高鐵香港段項目進展的事宜提供指引。

2. 為支持和配合項目監管委員會的工作，路政署在港鐵公司相關的工作程序中引入多個監察點，以便及早提出值得關注的事項，從而作出適當處理。舉例而言，當涉及高鐵香港段項目工程及服務的招標時，路政署代表(通常為首長級人員)會出席港鐵公司成立的招標小組及標書執行委員會所舉行的會議。此外，港鐵公司成立的工程監管組負責審核高鐵香港段項目合約的修訂和申索評估等工作，而上述路政署代表亦會出席工程監管組的會議，提出意見和反映政府當局的想法。

外界監察和核證

3. 鑒於高鐵香港段項目的規模，路政署亦委聘外界顧問，協助進行監察工作，同時定期審核港鐵公司有否履行與政府當局簽訂的委託協議所訂明的責任。監察和核證工作的範圍，並不限於港鐵公司的工作，還包括該公司為高鐵香港段項目聘用的顧問、承建商或代理人所進行的工作。此外，路政署的顧問會識別實施高鐵香港段項目的潛在風險，知會署方有關風險，並提出適當的緩解措施。政府當局表示，此舉有助確保高鐵香港段項目符合規定的標準，並能如期完成，不會超出預算。

有關廣深港高速鐵路("高鐵")香港段建造工程的最新狀況的
最新背景資料簡介

在立法會會議上提出的有關質詢
(第五屆及第六屆立法會)

19.12.2012	毛孟靜議員就高鐵香港段建造工程對附近樓宇結構的影響提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201212/19/P201212190255.htm)
29.5.2013	林健鋒議員就高鐵香港段工程項目的施工進展及有關的出入境安排提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201305/29/P201305280552.htm)
	馮檢基議員就監督高鐵香港段建造工程提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201305/29/P201305290208.htm)
23.10.2013	馮檢基議員就高鐵香港段實施"一地兩檢"提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201310/23/P201310220569.htm)
11.12.2013	郭家麒議員就鐵路建造工程對牛潭尾居民的影響提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201312/11/P201312100590.htm)
26.2.2014	單仲偕議員就高鐵香港段西九龍總站實施"一地兩檢"提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201402/26/P201402260217.htm)
9.4.2014	何俊仁議員就鐵路安全(包括採購高鐵香港段列車的進度)提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201404/09/P201404090367.htm)
16.4.2014	涂謹申議員就高鐵香港段工程對附近土地和建築物的影響提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201404/16/P201404160410.htm)
30.4.2014	謝偉銓議員就高鐵香港段工程進度提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201404/30/P201404300330.htm)

21.5.2014	林大輝議員就高速鐵路建造工程延誤竣工的處理提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201405/21/P201405210468.htm)
	郭家麒議員就高鐵香港段建造工程延誤提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201405/21/P201405210316.htm)
28.5.2014	梁繼昌議員就高鐵香港段建造工程提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201405/28/P201405280314.htm)
29.10.2014	郭家麒議員就大型基建工程提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201410/29/P201410290460.htm)
3.12.2014	湯家驊議員就高鐵香港段提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201412/03/P201412030567.htm)
	林大輝議員就大型基建工程超支和延誤提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201412/03/P201412030918.htm)
4.11.2015	范國威議員就高鐵香港段工程延誤和超支提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201511/04/P201511040495.htm)
9.12.2015	馮檢基議員就高鐵香港段通車後實施"一地兩檢"安排提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201512/09/P201512090308.htm)
3.2.2016	葉劉淑儀議員就香港鐵路有限公司鐵路業務提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201602/03/P201602030616.htm)
11.1.2017	楊岳橋議員就高鐵香港段實施"一地兩檢"提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201701/11/P2017011100495.htm)

有關廣深港高速鐵路香港段工程的
最新背景資料簡介

相關文件一覽表

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
2.12.2009 3.12.2009	工務 小組委員會	政府當局就 53TR－廣深港 高速鐵路香港段 －鐵路建造工程 提供的文件	PWSC(2009-10)68 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/pwsc/papers/p09-68c.pdf
		政府當局就 57TR－廣深港 高速鐵路香港段 －非鐵路建造工 程提供的文件	PWSC(2009-10)69 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/pwsc/papers/p09-69c.pdf
		會議紀要	PWSC32/09-10 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/pwsc/minutes/pwsc20091202.pdf PWSC33/09-10 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/pwsc/minutes/pwsc20091203.pdf
18.12.2009 8.1.2010 15.1.2010 16.1.2010	財務委員會	工務小組委員會 在 2009 年 12 月 2 日和 3 日所提 建議	FCR(2009-10)44 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/fc/papers/f09-44c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
16.4.2010	鐵路事宜 小組委員會	政府當局提供有關政府就廣深港高速鐵路香港段建造工程進行的監察和匯報工作的文件	CB(1)1573/09-10(04) http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0416cb1-1573-4-c.pdf
		會議紀要	CB(1)2071/09-10 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20100416.pdf
6.7.2010	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2010年6月30日止的首份半年度報告)提供的文件	CB(1)2290/09-10(01) http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0706cb1-2290-1-c.pdf
20.9.2010	鐵路事宜 小組委員會	會議紀要	CB(1)757/10-11 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20100920.pdf
20.5.2011	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(2010年7月1日至2010年12月31日的第二份半年度報告)提供的文件	CB(1)1585/10-11(07) http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0318cb1-1585-7-c.pdf
		會議紀要	CB(1)184/11-12 http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20110520.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
--	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第三份半年度報告(2011年1月1日至2011年6月30日期間)提供的文件	CB(1)3049/10-11(01) http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp03049-1-c.pdf
--	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第四份半年度報告(2011年7月1日至2011年12月31日期間)提供的文件	CB(1)1710/11-12(01) http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp01710-1-c.pdf
--	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第五份半年度報告(2012年1月1日至2012年6月30日期間)提供的文件	CB(1)24/12-13(02) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0024-2-c.pdf
24.5.2013	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況提供的文件	CB(1)1072/12-13(03) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp01072-3-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第六份半年度報告(2012年7月1日至2012年12月31日期間)提供的文件	CB(1)1108/12-13(01) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp01108-1-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段項目提供的補充資料文件(跟進文件)	CB(1)1434/12-13(01) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0524cb1-1434-1-c.pdf
		會議紀要	CB(1)1870/12-13 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20130524.pdf
22.11.2013	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第七份半年度報告(2013年1月1日至2013年6月30日期間)提供的文件	CB(1)81/13-14(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp1112cb1-81-1-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況提供的補充資料(跟進文件)	CB(1)782/13-14(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp1112cb1-782-1-c.pdf
		會議紀要	CB(1)1010/13-14 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20131122.pdf
5.5.2014 19.5.2014	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段工程的最新狀況提供的文件	CB(1)1328/13-14(03) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0505cb1-1328-3-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
		香港鐵路有限公司就廣深港高速鐵路香港段建造工程和試行運作提供的文件	CB(1)1354/13-14(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0505cb1-1354-1-c.pdf
		政府當局對2014年5月5日會議席上所提事項的回應	CB(1)1422/13-14(02) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0519cb1-1422-2-c.pdf
		香港鐵路有限公司就廣深港高速鐵路香港段工程提交的補充資料	CB(1)1438/13-14(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0519cb1-1438-1-c.pdf
		會議紀要	CB(1)1904/13-14 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20140505.pdf CB(1)1987/13-14 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20140519.pdf
4.7.2014	鐵路事宜小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路列車的安全管理措施提供的文件	CB(1)1722/13-14(05) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0704cb1-1722-5-c.pdf
		政府當局就興建中5條鐵路各項目建造業工人短缺的人數提供的補充資料文件(跟進文件)	CB(4)307/14-15(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0704cb4-307-1-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
		會議紀要	CB(1)139/14-15 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20140704.pdf
2.1.2015	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2014年9月30日為止的半年度報告)提供的文件	CB(1)260/14-15(04) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20141124cb1-260-4-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段工程的最新進展提交的補充資料(跟進文件)	CB(4)575/14-15(01) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150102cb4-575-1-c.pdf
		會議紀要	CB(4)623/14-15 http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20150102.pdf
6.3.2015	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2014年12月31日為止的季度報告)提供的文件	CB(4)576/14-15(05) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150306cb4-576-5-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
19.5.2015	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2015年3月31日為止的季度報告)提供的文件	CB(4)954/14-15(07) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150519cb4-954-7-c.pdf
		會議紀要	CB(4)62/15-16 http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20150519.pdf
--	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2015年6月30日為止的季度報告)提供的文件	CB(4)1412/14-15(02) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150630cb4-1412-2-c.pdf
3.7.2015	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段工程最新的目標完工日期和修訂委託費用預算提供的文件	CB(4)1273/14-15(01) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150703cb4-1273-1-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段工程的最新進展提交的補充資料(跟進文件)	CB(4)1416/14-15(01) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150703cb4-1416-1-c.pdf
		會議紀要	CB(4)1491/14-15 http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20150703.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
4.12.2015 14.12.2015	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2015年9月30日為止的季度報告)提供的文件	CB(4)280/15-16(01) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20151204cb4-280-1-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段提供的文件	CB(4)280/15-16(02) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20151204cb4-280-2-c.pdf
		香港鐵路有限公司就推展廣深港高速鐵路香港段的建議安排提供的文件	CB(4)280/15-16(03) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20151204cb4-280-3-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段項目的經濟效益以及暫停與終止工程所招致的費用提供的文件	CB(4)333/15-16(02) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20151214cb4-333-2-c.pdf
		政府當局就討論廣深港高速鐵路香港段建造工程提供的文件(跟進文件)	CB(4)394/15-16(01) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20151214cb4-394-1-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
		會議紀要	CB(4)617/15-16 http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20151204.pdf CB(4)878/15-16 http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20151214.pdf
23.12.2015	工務 小組委員會	政府當局就 53TR－廣深港 高速鐵路香港段 －鐵路建造工程 提供的文件	PWSC(2015-16)50 http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/fc/pwsc/papers/p15-50c.pdf
		政府當局就 57TR－廣深港 高速鐵路香港段 －非鐵路建造 工程提供的文件	PWSC(2015-16)51 http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/fc/pwsc/papers/p15-51c.pdf
		會議紀要	PWSC78/15-16 http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/fc/pwsc/minutes/pwsc20151223.pdf
5.2.2016 20.2.2016 26.2.2016 27.2.2016 11.3.2016	財務委員會	政府當局提供的 文件	FCR(2015-16)46 http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/fc/fc/papers/f15-46c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
22.2.2016	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2015年12月31日為止的季度報告)提供的文件	CB(4)610/15-16(07) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20160222cb4-610-7-c.pdf
		政府當局就討論廣深港高速鐵路香港段建造工程提供的文件(跟進文件)	CB(4)790/15-16(01) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20160222cb4-790-1-c.pdf
		政府當局就沙田至中環線沿線車站新建大堂內增設的洗手間設施，以及各鐵路項目的建造費用的原來和最新預算提交的補充資料文件(跟進文件)	CB(4)960/15-16(01) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20160222cb4-960-1-c.pdf
		會議紀要	CB(4)983/15-16 http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20160222.pdf
27.6.2016	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2016年3月31日為止的季度報告)提供的文件	CB(4)1136/15-16(05) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20160627cb4-1136-5-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段列車的最新情況提供的文件	CB(4)1167/15-16(01) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20160627cb4-1167-1-c.pdf
		會議紀要	CB(4)1313/15-16 http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20160627.pdf
--	鐵路事宜小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2016年6月30日為止的季度報告)提供的文件	CB(4)1317/15-16(02) http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20160627cb4-1317-2-c.pdf
9.12.2016	鐵路事宜小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2016年9月30日為止的季度報告)提供的文件	CB(4)243/16-17(08) http://www.legco.gov.hk/yr16-17/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20161209cb4-243-8-c.pdf

立法會秘書處
議會事務部 4
2017 年 2 月 6 日
