

(譯文)

香港中區立法會道 1 號
立法會綜合大樓
監察西九文化區計劃推行情況
聯合小組委員會主席
林健鋒議員, GBS, JP

林主席：

有關西九文化區工程發展事宜

就立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會（聯合小組委員會）委員陳淑莊議員於2020年4月24日的來信，以及於2020年4月27日舉行的聯合小組委員會會議上，要求西九文化區管理局（管理局）就西九文化區內工程提供時序表，並以甘特圖的形式顯示。


管理局已於2020年4月27日聯合小組委員會會議上就有關提問，回應陳議員，隨函亦附上相關甘特圖供主席及各議員參考。

司徒澤民
西九文化區管理局首席工程總監

2020年5月29日

連附件

副本抄送： 民政事務局
立法會秘書處

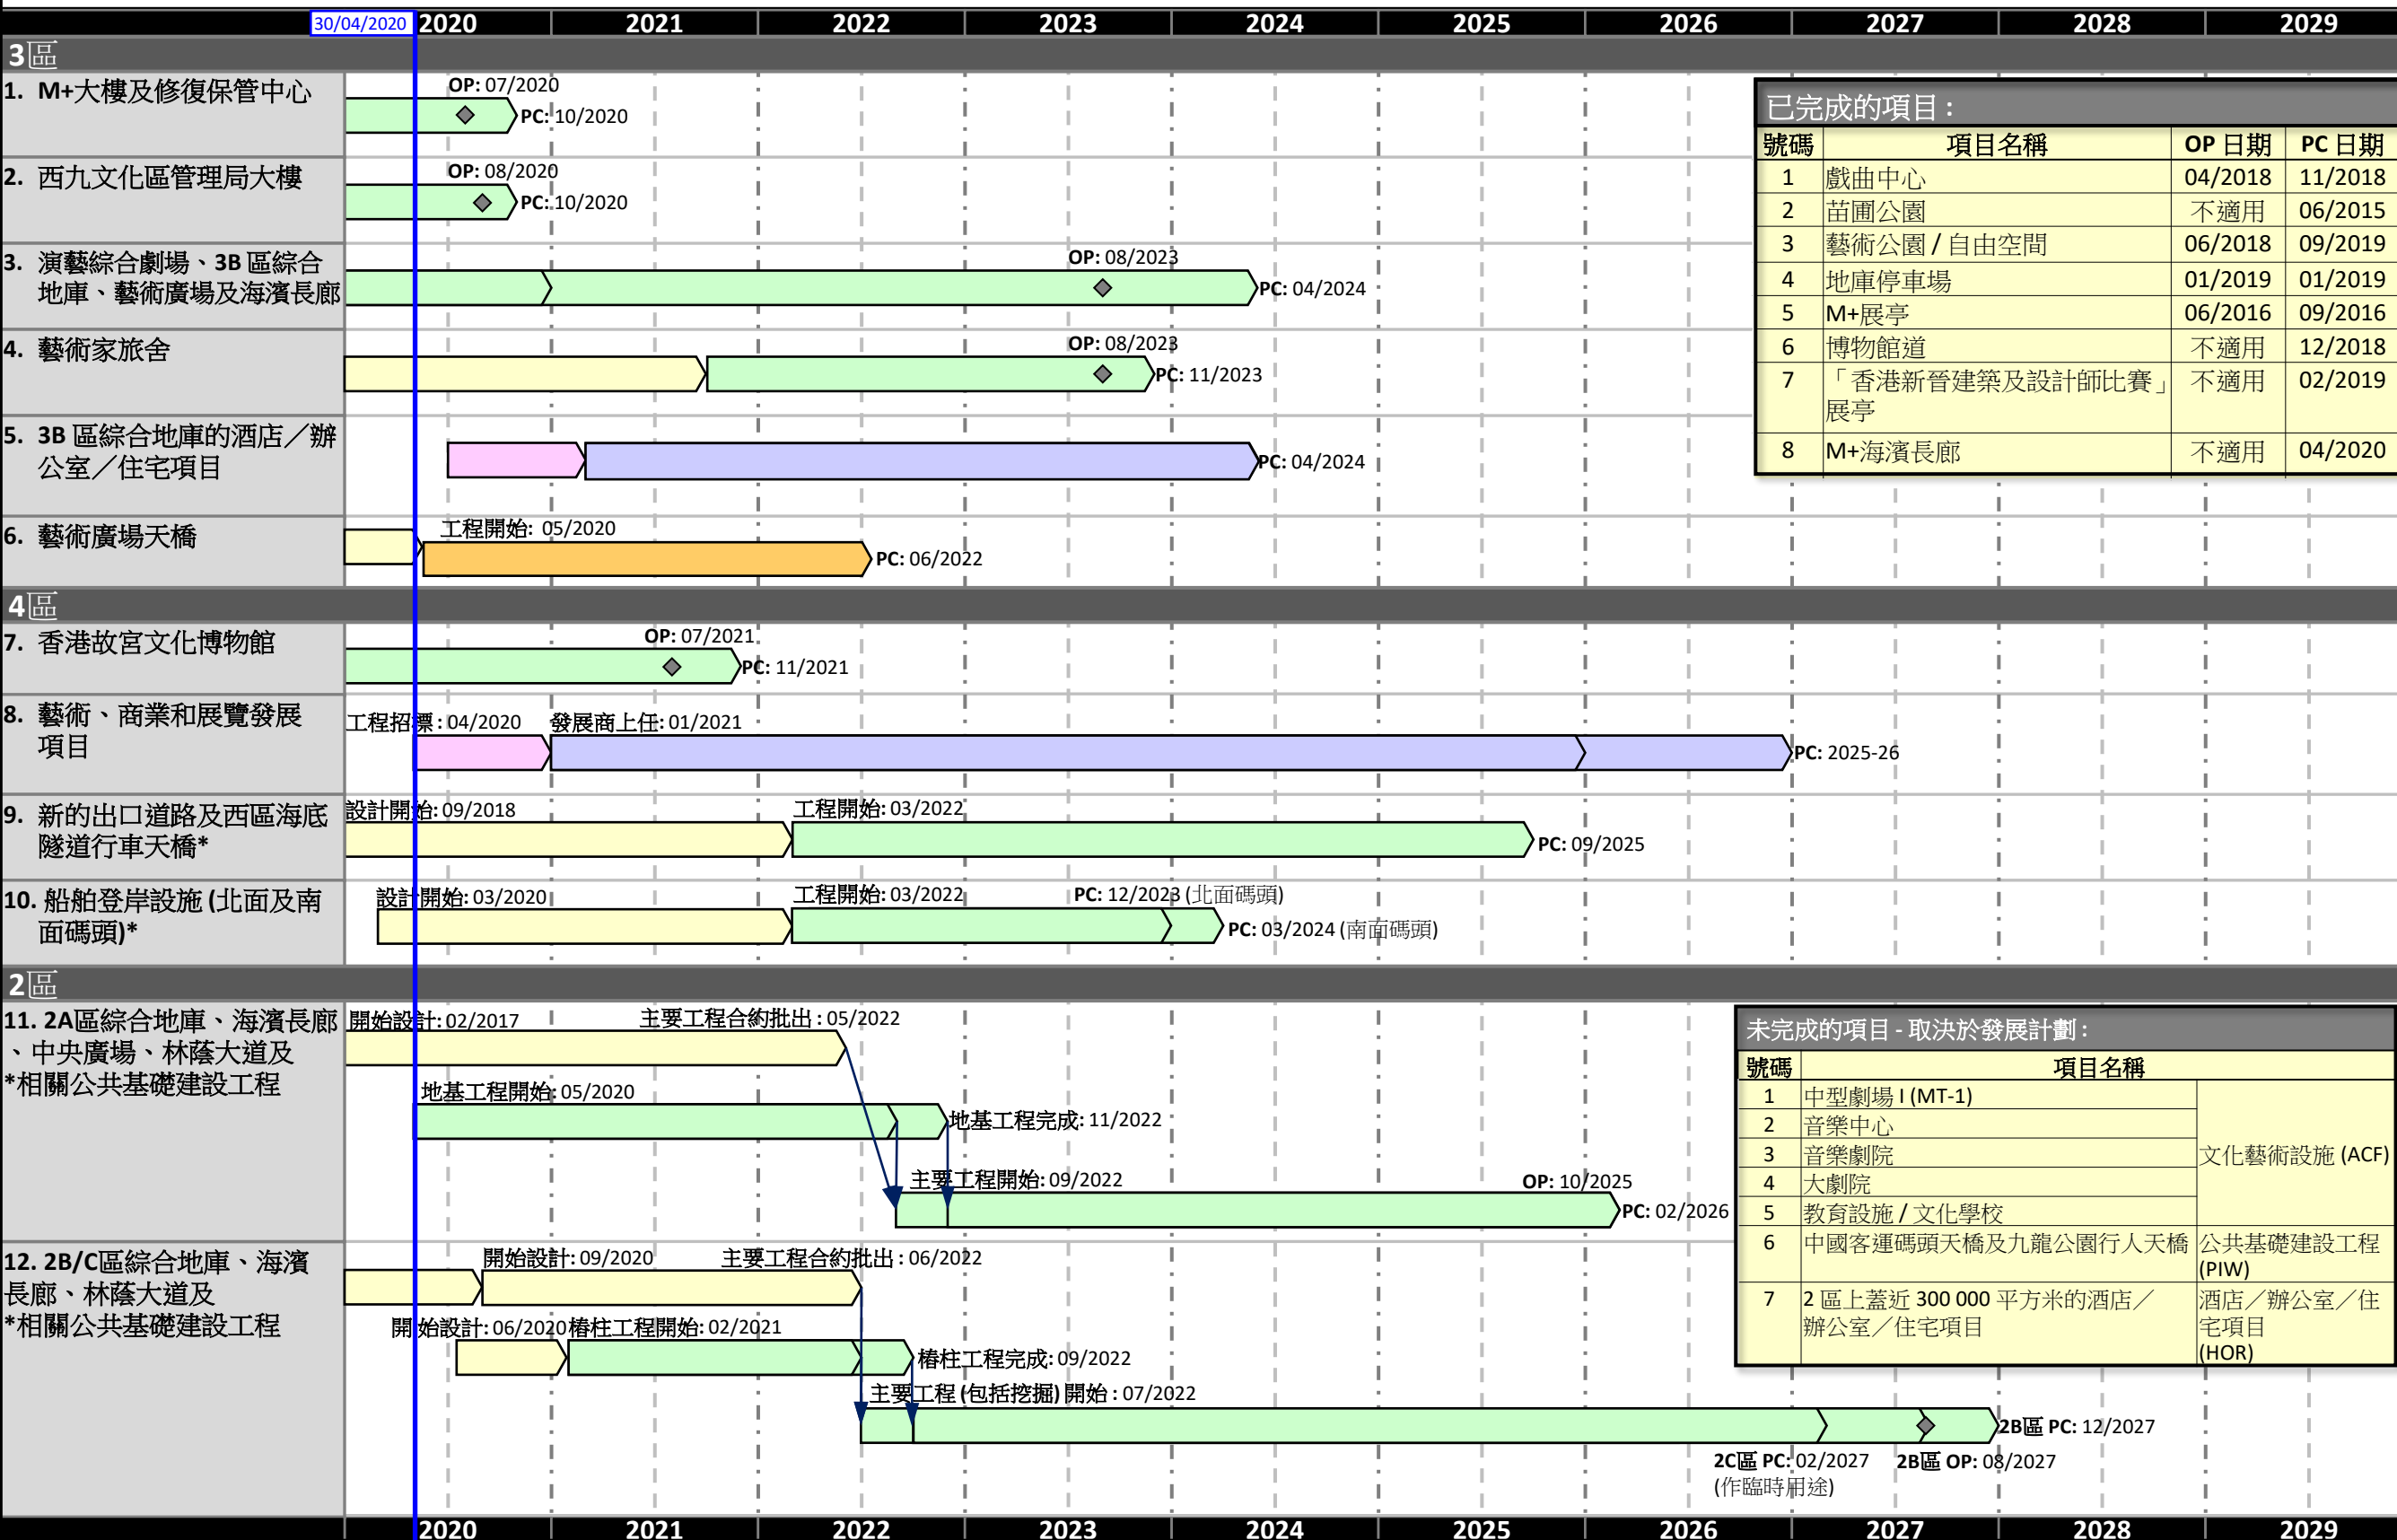

已完成的項目:

號碼	項目名稱	OP 日期	PC 日期
1	戲曲中心	04/2018	11/2018
2	苗圃公園	不適用	06/2015
3	藝術公園 / 自由空間	06/2018	09/2019
4	地庫停車場	01/2019	01/2019
5	M+展亭	06/2016	09/2016
6	博物館道	不適用	12/2018
7	「香港新晉建築及設計師比賽」展亭	不適用	02/2019
8	M+海濱長廊	不適用	04/2020

未完成的項目 - 取決於發展計劃:

號碼	項目名稱	類別
1	中型劇場 I (MT-1)	文化藝術設施 (ACF)
2	音樂中心	
3	音樂劇院	
4	大劇院	
5	教育設施 / 文化學校	公共基礎建設工程 (PIW)
6	中國客運碼頭天橋及九龍公園行人天橋	
7	2 區上蓋近 300 000 平方米的酒店/辦公室/住宅項目	酒店/辦公室/住宅項目 (HOR)

圖例:

- 設計及工程合約採購
- 建築工程
- 設計及建造合約
- 取得佔用許可證 (OP)
- 招標採購 (公私營合作項目)
- 設計、採購及建造 (公私營合作項目)
- OP 佔用許可證
- PC 實際完工
- * 取決於政府撥款而定
