



819TH

屯門公路市中心段交通改善工程



- 工程計劃項目：屯門公路市中心段交通改善工程
- 工程計劃編號：819TH
- 立法會財務委員會提升項目為甲級日期：2009年6月
- 工程核准預算費：18億1,440萬元（按付款當日價格計算）
- 工程開展日期：2009年12月
- 預計完工日期：2013年年底

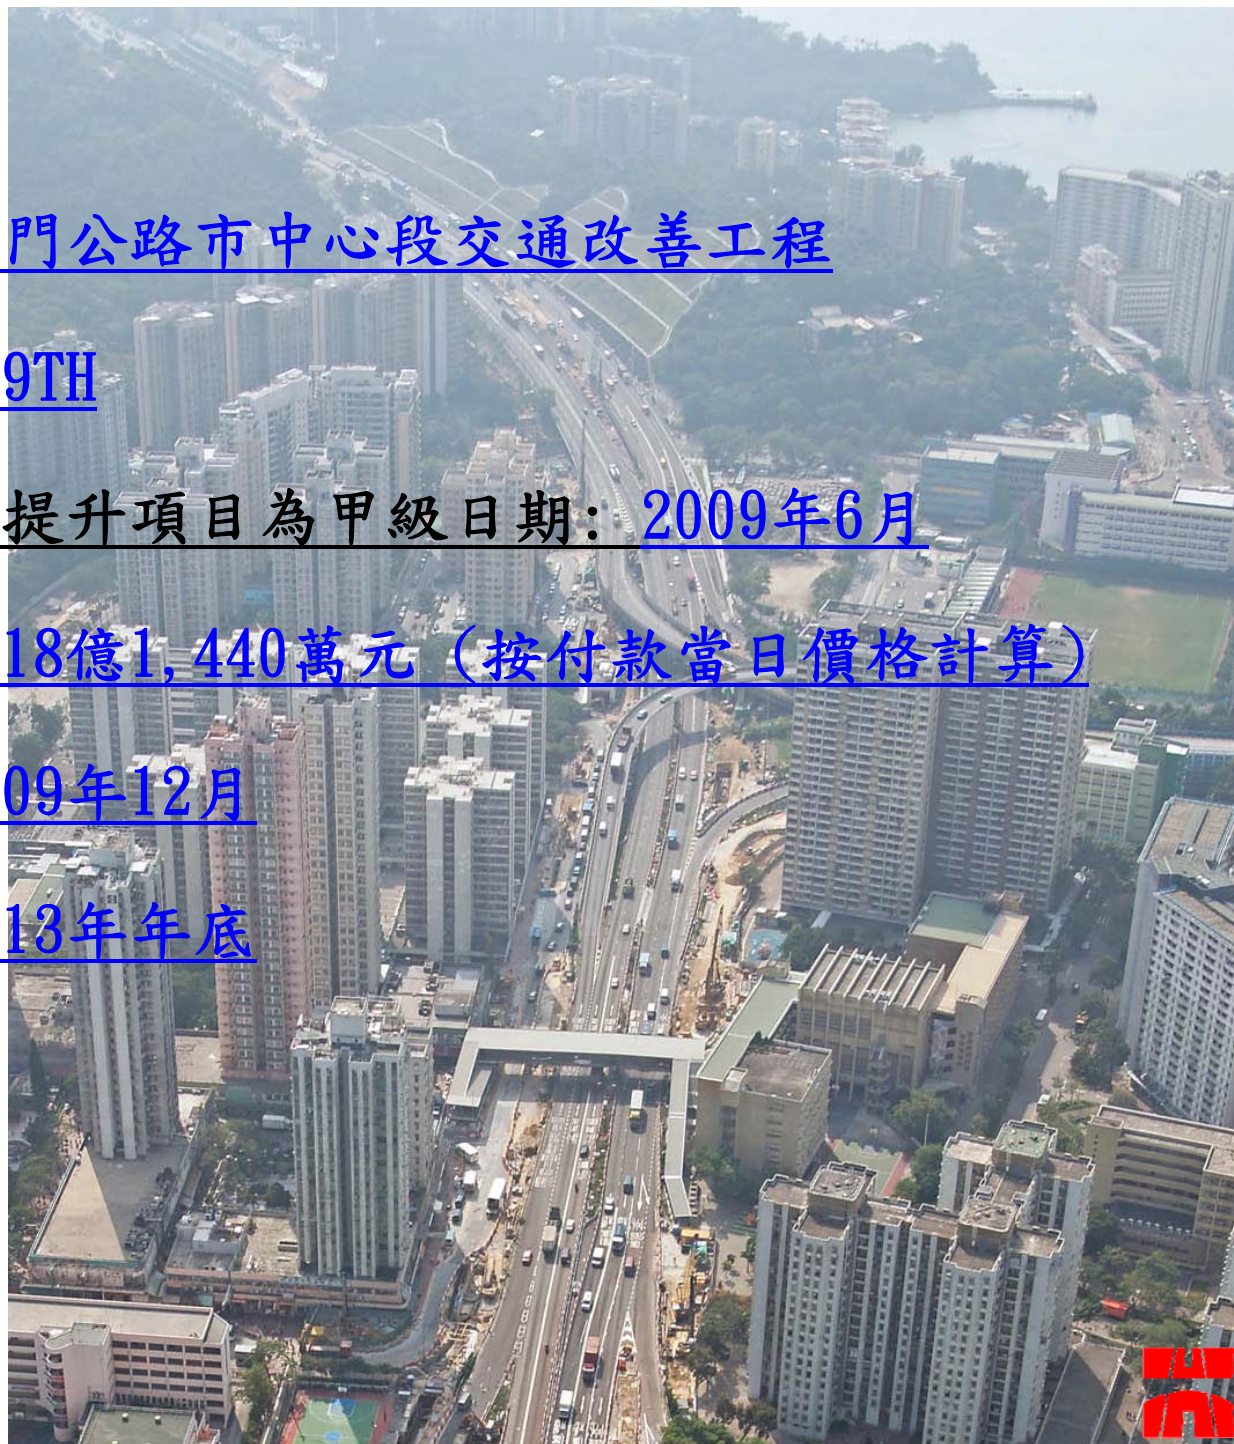

改善工程範圍及細節



| | | | | | | |
|------------|---------|-------|------|-------|-------------|--------|
| 屯門公路市中心段擴闊 | 拆除現有行人橋 | 臨時行人橋 | 新行人橋 | 新行車天橋 | 隔音屏障 隔音罩 | 路口改善工作 |
|------------|---------|-------|------|-------|-------------|--------|





屯門公路市中心段原貌(鳥瞰圖)





屯門市中心段交通改善工程完成後合成圖



垂直綠化 測試中



罩頂綠化
測試中



工程進度

重置行人天橋



置樂行人天橋

2012年10月29日開放予公眾使用



工程進度

隔音罩

現正在鄰近屯門市廣場進行安裝隔音罩的面板工程




工程進度



夜間在屯門公路進行

重置仁愛行人天橋安裝工程

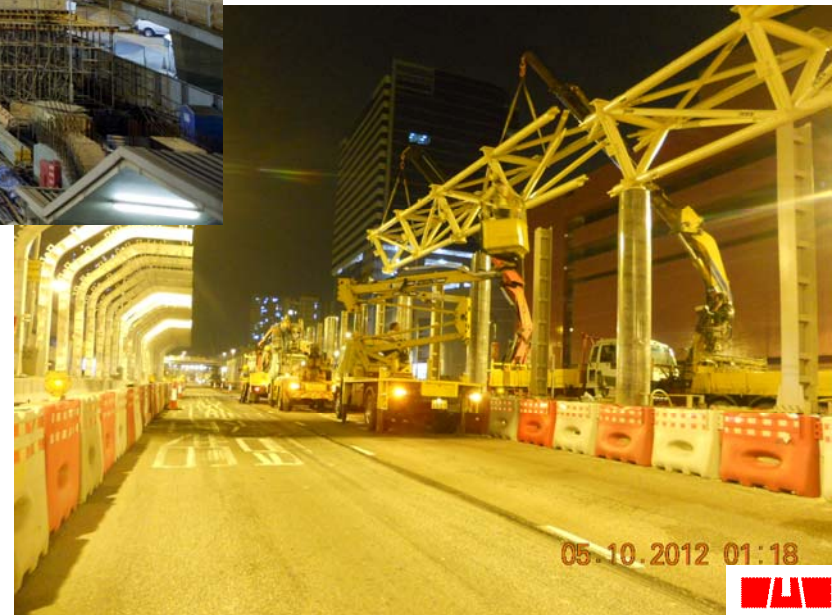

隔音屏障/隔音罩安裝工程



社區聯絡

定期與屯門區議會轄下“交通及運輸委員會”、
“環境、衛生及地區發展委員會”及“綠化專責小組”聯絡



定期探訪屯門區議員及聽取意見




社區聯絡



設立“屯門公路重建及改善工程社區聯絡中心”及
工程網站與居民溝通



探訪鄰近學校、屋苑及商戶講解工程內容及進度



出版工程雙月刊通訊，派發區議會、議員、
區內社區組織、大廈立案法團及區內中小學，
滙報工程進展及未來動向



社區關注




向鄰近商戶解釋工程安排



樹木處理

公眾關注

行人天橋拆卸/興建

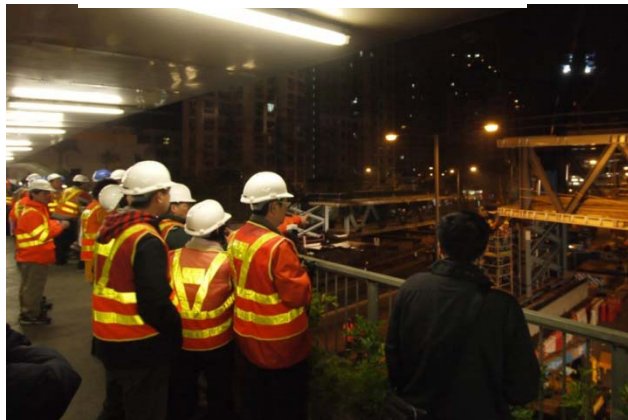

臨時交通安排




819TH 屯門公路市中心段交通改善工程

| 工程計劃預算 | 公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率 | | | | | | | | | 價格調整準備 (\$百萬) | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------|
| | 年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| 核准預算費 (2009年3月) | | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 173.2 |
| 最新預算費 (2012年10月) | | 3.1% | 2.9% | 5.7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 326.7 |
| 增加總額: | | | | | | | | | | 153.5 | |
| <p style="color: red;">工程預算費需要由 18億1,440萬元 增至 19億6,790萬元 (按付款當日價格計算)</p> | | | | | | | | | | | |

預測趨勢增減率
 實際指數



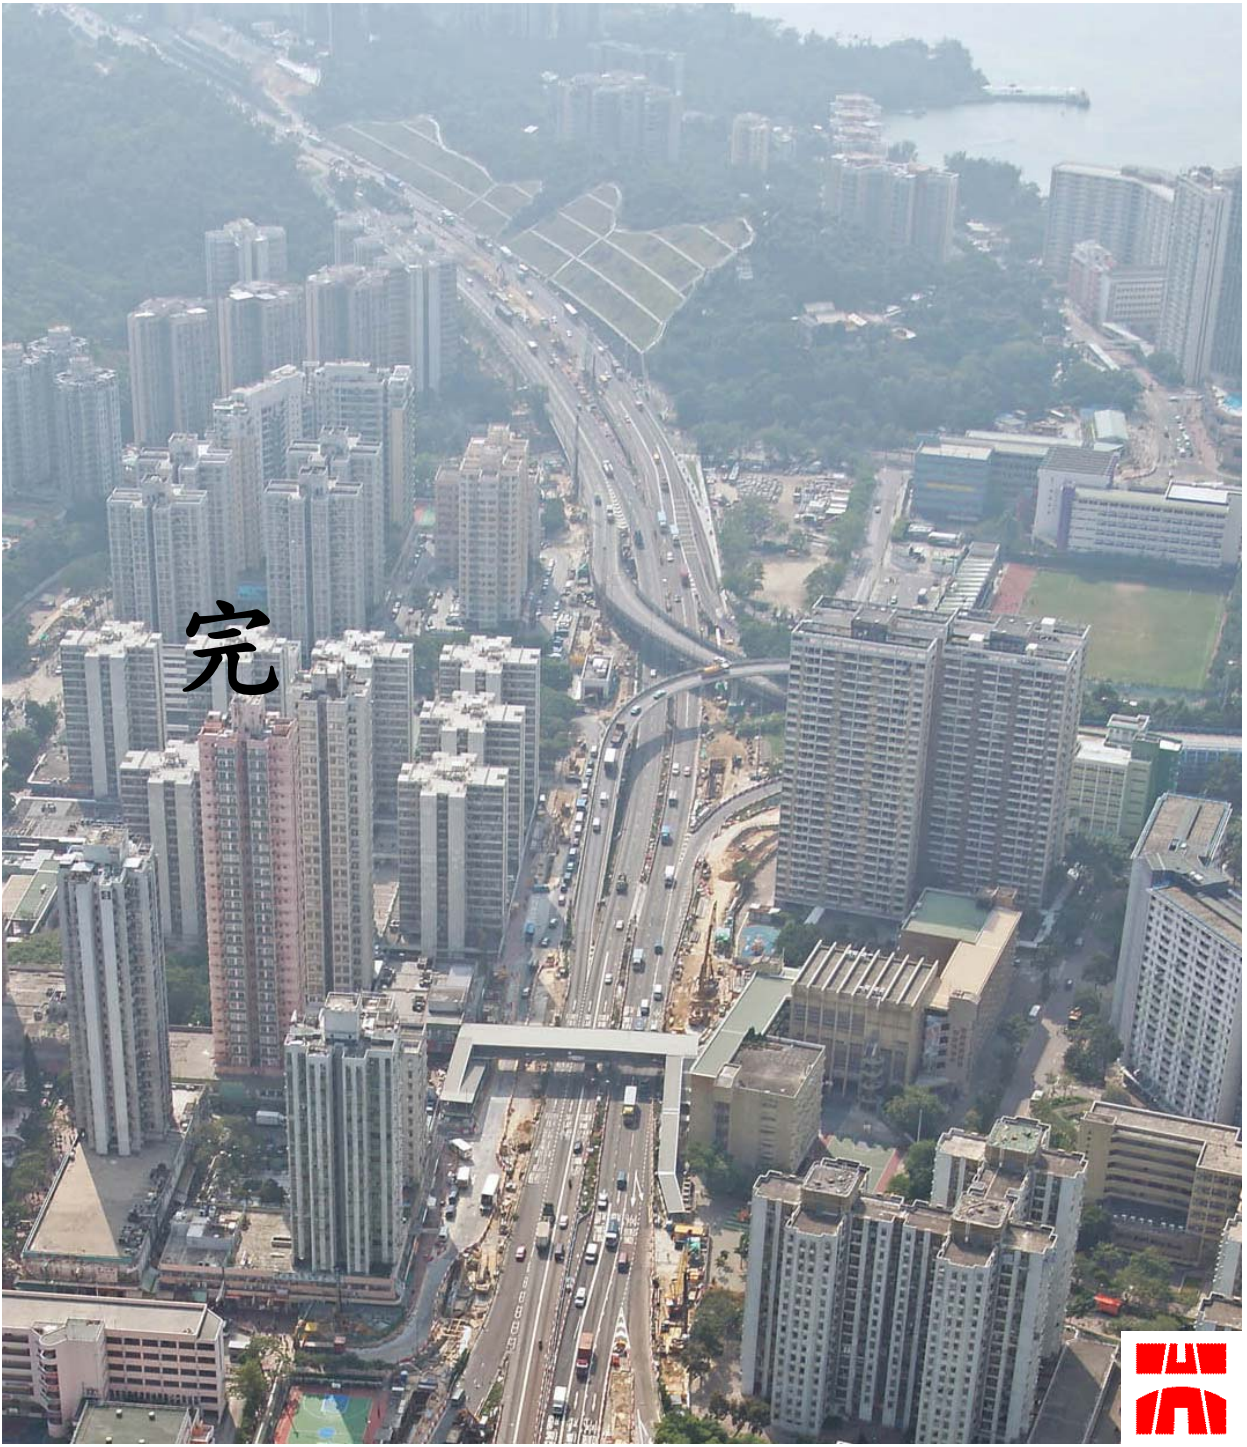

完

