

政府總部
運輸及房屋局
運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



Transport and
Housing Bureau
Government Secretariat
Transport Branch
East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 OUR REF.:
來函檔號 YOUR REF.:

電話 Tel. No.: 3509 7280
傳真 Fax No.: 2136 8017

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓
立法會財務委員會秘書
薛鳳鳴女士

薛女士：

立法會財務委員會
2019年6月28日會議
785TH – T2 主幹路及茶果嶺隧道 – 建造工程

在 2019 年 6 月 28 日的立法會財務委員會會議上，委員在審議 785TH – T2 主幹路及茶果嶺隧道 – 建造工程的撥款申請時，要求政府就啟德發展區一帶各項道路工程的規劃提供資料。

根據發展局、土木工程拓展署及運輸署的資料，土木工程拓展署轄下的啟德辦事處一直按照啟德分區計劃大綱圖，有序地推展各項位於啟德發展區內的運輸基礎建設工程，以配合啟德發展計劃的落實。現附上啟德發展區連繫附近地區主要道路工程的進展及預計完工時間(見附件)，以供委員參考。

運輸及房屋局局長

(陳凱庭



代行)

2019 年 7 月 18 日

副本抄送：

發展局局長
(傳真：2810 8502)


(經辦人：鄧永強先生)

土木工程拓展署署長
(傳真：2739 0076)

(經辦人：梁中立先生)

運輸署署長
(傳真：2827 9237)

(經辦人：張建雄先生)

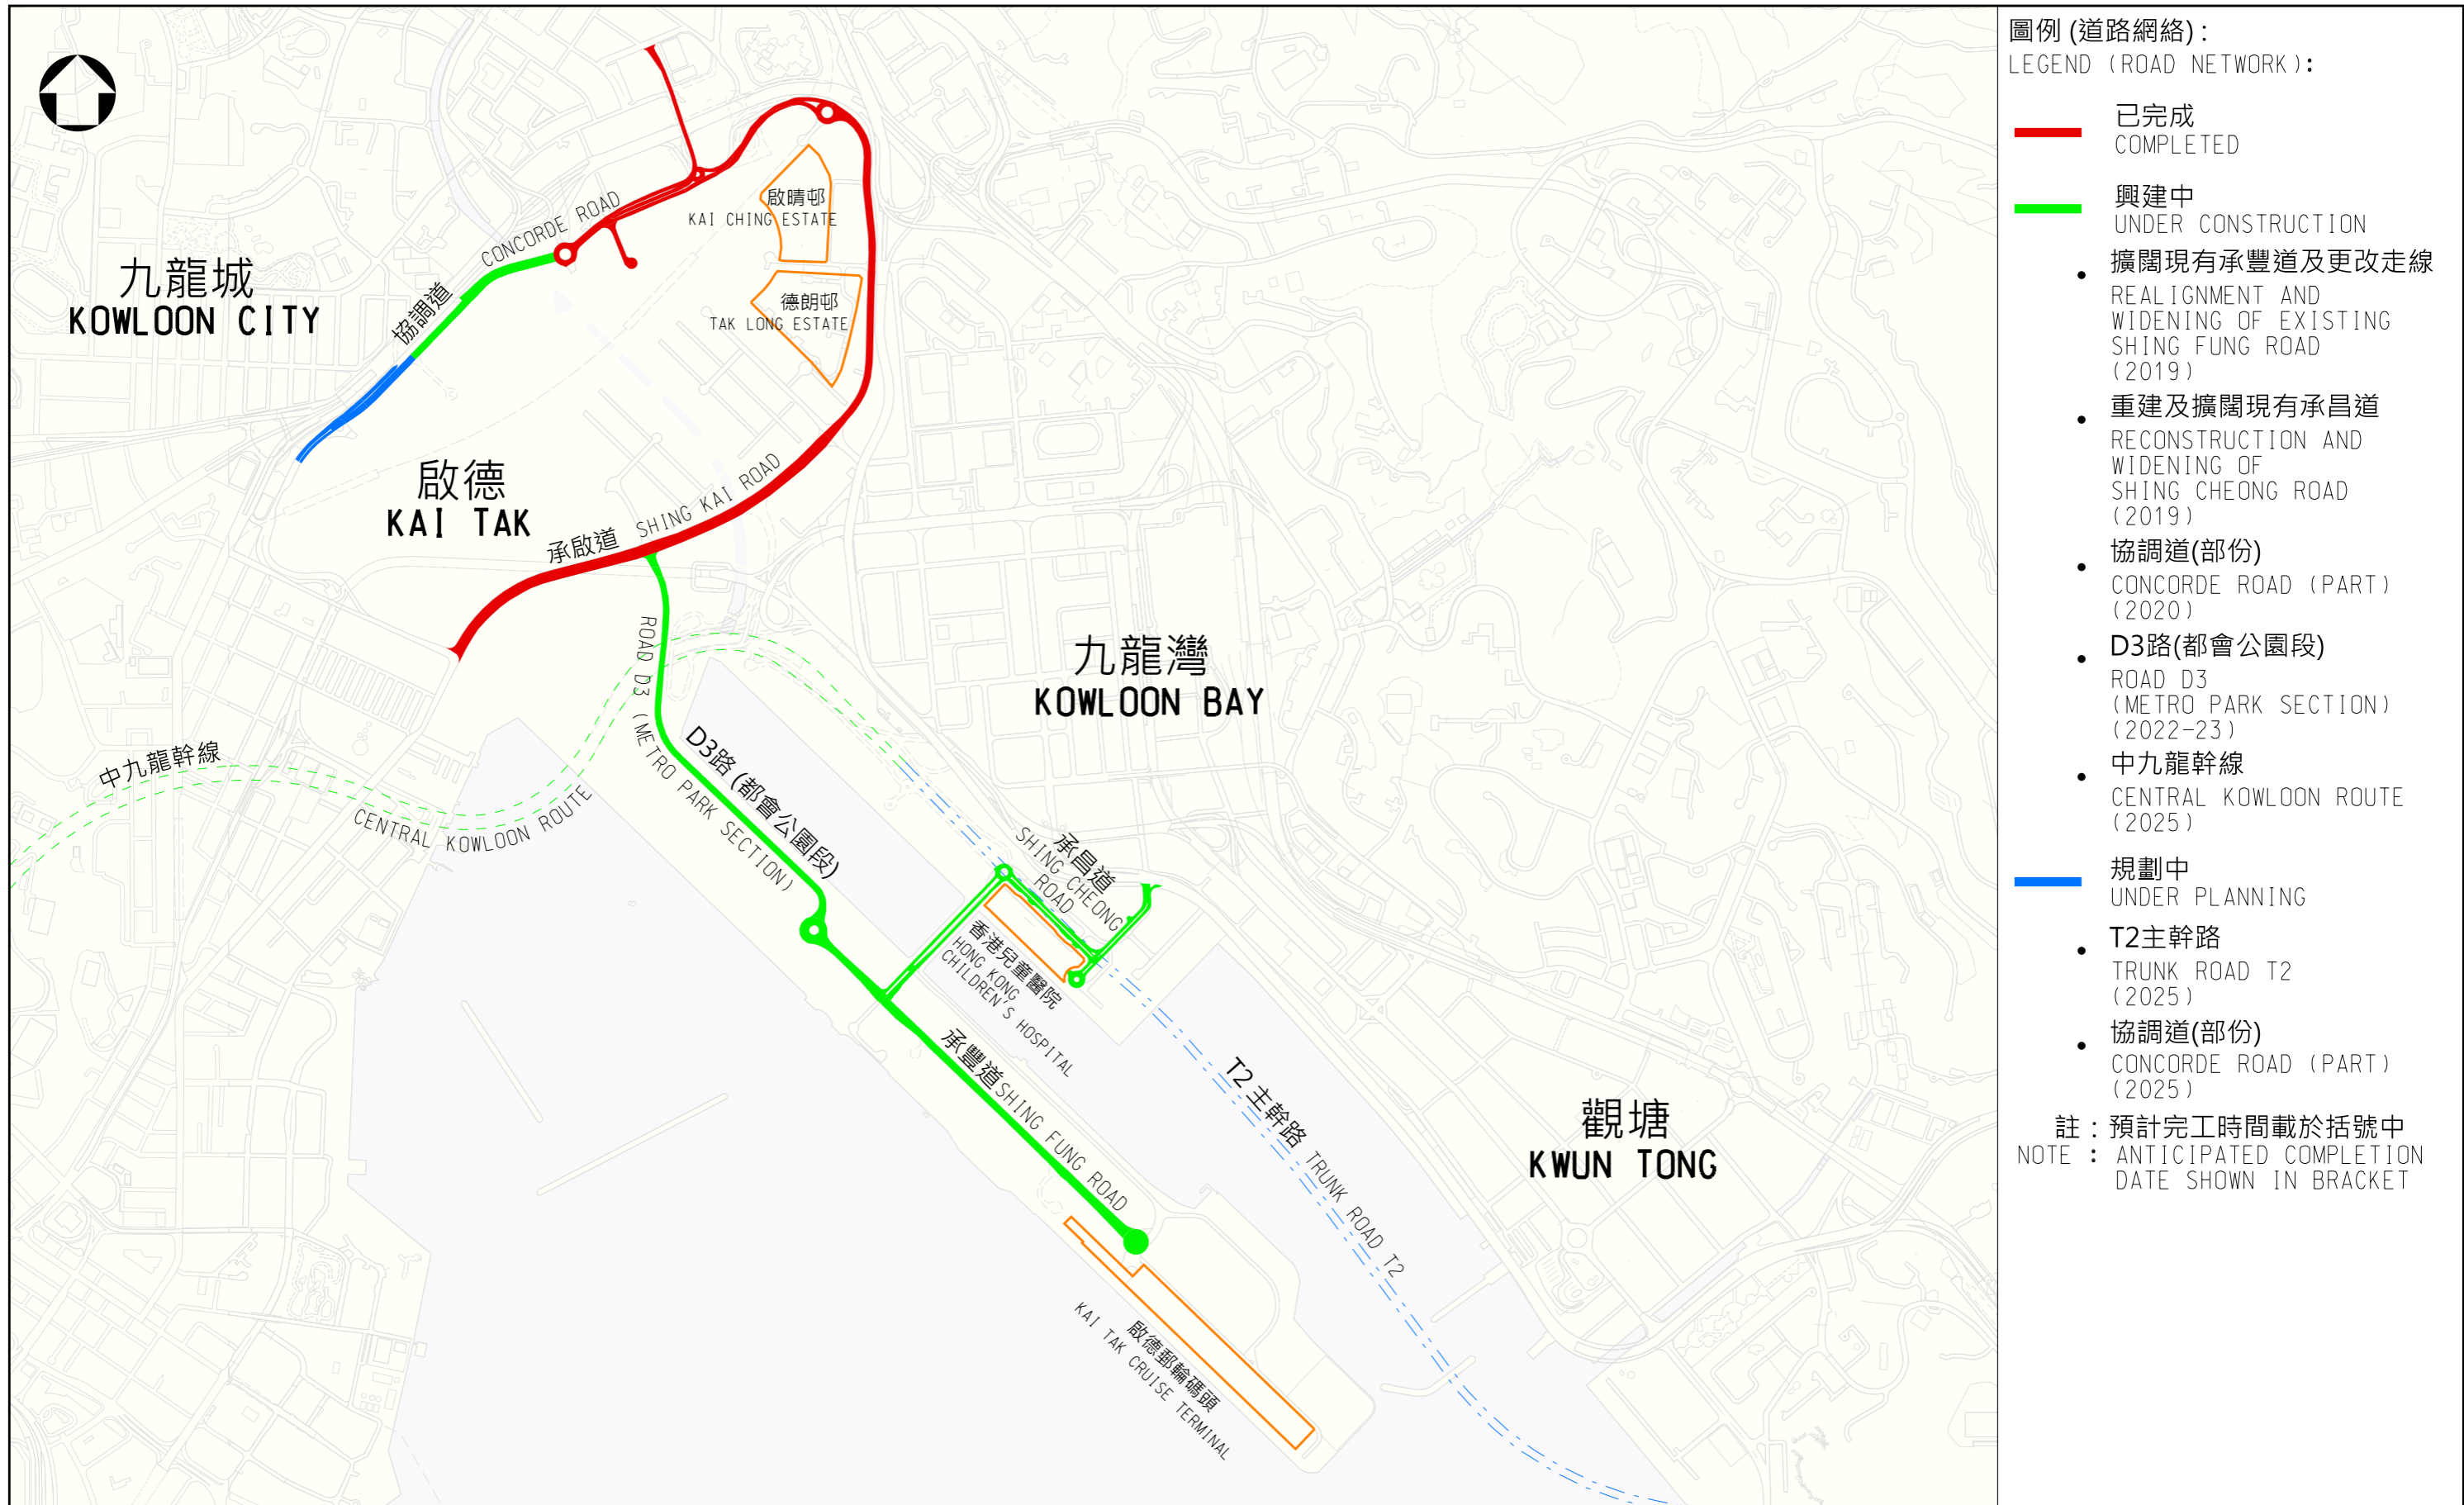

- 圖例 (道路網絡):**
LEGEND (ROAD NETWORK):
- 已完成
COMPLETED
 - 興建中
UNDER CONSTRUCTION
 - 擴闊現有承豐道及更改走線
REALIGNMENT AND WIDENING OF EXISTING SHING FUNG ROAD (2019)
 - 重建及擴闊現有承昌道
RECONSTRUCTION AND WIDENING OF SHING CHEONG ROAD (2019)
 - 協調道(部份)
CONCORDE ROAD (PART) (2020)
 - D3路(都會公園段)
ROAD D3 (METRO PARK SECTION) (2022-23)
 - 中九龍幹線
CENTRAL KOWLOON ROUTE (2025)
 - 規劃中
UNDER PLANNING
 - T2主幹路
TRUNK ROAD T2 (2025)
 - 協調道(部份)
CONCORDE ROAD (PART) (2025)
- 註：預計完工時間載於括號中
 NOTE: ANTICIPATED COMPLETION DATE SHOWN IN BRACKET

圖則名稱 drawing title 啟德發展區連繫附近地區主要道路工程的進展 PROGRESS OF MAJOR ROADWORKS IN KAI TAK DEVELOPMENT CONNECTING WITH HINTERLAND	繪圖 drawn	簽署 initial	日期 date	項目編號 item no.	辦事處 office 東拓展處 EAST DEVELOPMENT OFFICE
	C Y NGAN	(SIGNED)	18.07.19		
	核對 checked	簽署 initial	日期 date	比例 scale	
H K LAU	(SIGNED)	18.07.19	1 : 16 000		
核准 approved	簽署 initial	日期 date	圖則編號 drawing no.		土木工程拓展署 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT
C W WONG	(SIGNED)	18.07.19	CDEKATZ0286		
