立法會發展事務委員會

香港特別行政區支援四川地震災後重建工作進展報告

引言

本文件旨在向各委員匯報香港特別行政區(「特區」)在四川地震災區援建工作的最新進展。

特區援建工作進展報告

2. 我們曾承諾定期向立法會提交報告，匯報有關特區援建工作的最新進展。為此，我們已分別在2009年2月3日、6月18日和11月24日的發展事務委員會會議上提交進展報告。我們現擬備了第四份的進展報告(見**附件一**和**附件二**)，詳述有關特區三個階段的援建項目及非政府機構申請基金撥款工作的最新進展等資料，供委員閱覽。

項目的最新進展

3. 立法會財務委員會(財委會)於2008年7月、2009年2月和7月先後通過撥款合共90億元，注入特區「支援四川地震災區重建工作信託基金」(基金)，以推展特區首、第二和第三階段的援建工作。連同香港賽馬會10億元撥款和民間捐款，我們已達到預期參與援建的整體目標。

4. 特區政府在四川地震災區的援建項目共 151 個，最新估算的總承擔額共 75.03 億元人民幣，折合約 85.88 億港元[1]。這些項目涵蓋五個範疇，包括教育(共 56 所學校)、醫療康復(共 35 個醫院／醫療衞生項目)、基礎建設(共 2 個項目)、臥龍自然保護區(臥龍)(共 23 個項目)，及社會福利(共 35 個項目)。總體而言，截至 2010 年 5 月，共有 2 個項目已經完成／竣工；正在施工的項目達 83 個，其中兩個已基本完成，將於日內進行竣工驗收；在施工前階段的項目有 66 個。預計九成的項目可於 2011 年年底完成。各個階段的進度詳見下文。

首階段項目


5. 財委會在 2008 年 7 月 18 日通過撥款 20 億元，注入基金，以推展特區的首階段援建工作。同年 10 月 11 日，川港雙方簽署《就香港特別行政區支援四川地震災後恢復重建合作的安排》(《特區援建合作安排》)，議定特區政府首階段 20 個援建項目，並同時就特區援建工作的基本原則、項目資金管理安排、項目管理和監督審核安排，及溝通協調機制等事宜定下框架。

6. 首階段的 20 個援建項目涵蓋 5 所學校重建、9 個醫療設施項目、4 個社會福利綜合服務中心、1 個交通基建項目，以及 1 個與臥龍重建相關的規劃編制項目。川港雙方已簽訂所有 20 個首階段項目的《項目合作安排》，內容包括相關項目的範圍、技術標準、工程里程碑、援建金額，以及分期資金撥付和項目監督管

[1] 已支付的部分以當時的實際匯率計算，未支付部分以 2010 年 5 月 7 日匯率 100 港元兌 86.58 元人民幣計算。除特別註明外，本文內所使用的匯率均以此為基礎計算，以便比較。附件一內個別項目的承擔額可能與本文有輕微出入，純因所採用的匯率不同而有所差異。

理等細節。

7. 首階段項目全部均已進入實施階段，其中 2 個項目（臥龍自然保護區規劃編制和汶川縣水磨中學）已完成／竣工。首階段另外 16 個項目正進行主體部分的施工，當中包括工程最為艱巨的交通基建項目－省道 303 公路映秀至臥龍段重建工程。此外，首階段尚有 2 個項目則已完成設計，正就主體工程進行招標(即德陽市社會福利綜合服務中心，以及規模較大、內容較複雜的「四川省人民醫院川港康復科技綜合大樓」)。項目工作進度表列如下－

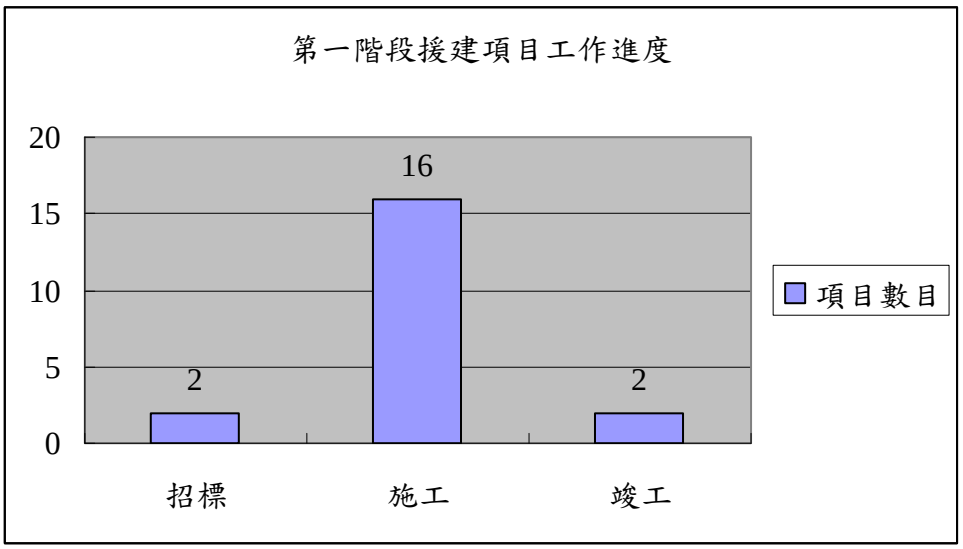

8. 首階段 20 個項目的估算費用為 18.74 億港元(約 16.45 億元人民幣)。按照《特區援建合作安排》的資金管理機制，基金至今共撥付了約 16.12 億港元[2](約 14.18 億元人民幣）至川方在四川省人民政府港澳事務辦公室名義下設立的特定「香港特區援建項目資金專戶」(援建資金專戶)，佔首階段的承擔額約 86.0%。


9. 個別首階段項目的內容和最新進展見**附件一**。

[2] 按照匯款時的實際匯率計算。

第二階段項目

10. 財委會於2009年2月20日的會議上同意增加40億元撥款，注入基金，以推展特區第二階段的援建工作。第二階段項目共100個，包含51個教育、20個醫療設施、7個社會福利，以及22個與臥龍重建相關的項目。

11. 就第二階段而言，川港雙方已簽訂所有100個項目的《項目合作安排》；而相關的撥款程序及實施工作亦已啟動。第二階段項目中，現時有66個項目正進行主體部份的施工，其中2個項目（涪江路小學和西罨學校）的工程已基本完成，正待竣工驗收；另外，有1個項目正進行招標，和33個項目正進行設計的工作。項目工作進度表列如下－

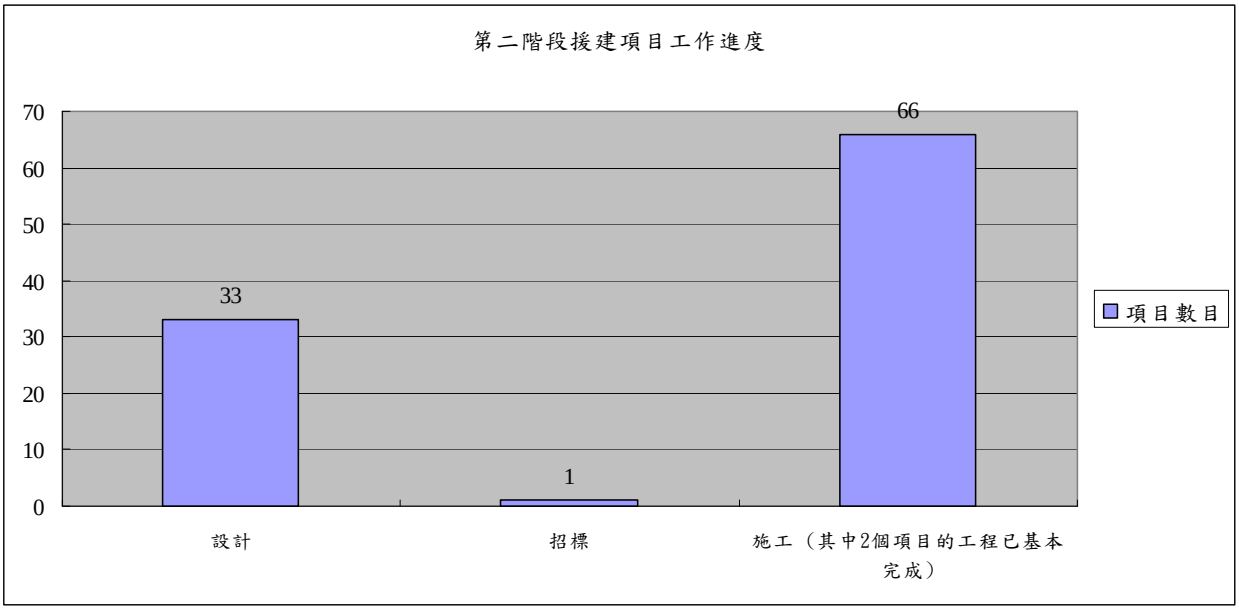


12. 第二階段100個項目的估算費用為38.51億港元(約33.65億元人民幣)。按《特區援建合作安排》下的資金管理機制，基金合共撥付約23.27億港元(約20.46億元人民幣)至川方的援建資金專戶，佔第二階段援建項目承擔額約60.4%。

13. 個別第二階段項目的內容和最新進展見**附件二**。

第三階段項目

14. 財委會隨後在2009年7月3日批准增加撥款30億港元注入基金，即累計撥款額合共為90億元，以推展特區第三階段的援建工作。川港兩地政府在同年7月6日簽署《第三階段意向書》，議定第三階段的合作項目。

15. 第三階段項目共31個，涵蓋1個交通基建項目(即綿茂公路)、6個醫療衞生項目，以及24個縣級殘疾人康復服務中心。川港雙方已簽訂第三階段31個項目的《項目合作安排》。綿茂公路現已進入施工階段，其餘24個縣級殘疾人康復服務中心已開展設計招標工作和6個醫療衞生項目的設計工作正在進行中。項目工作進度表列如下－

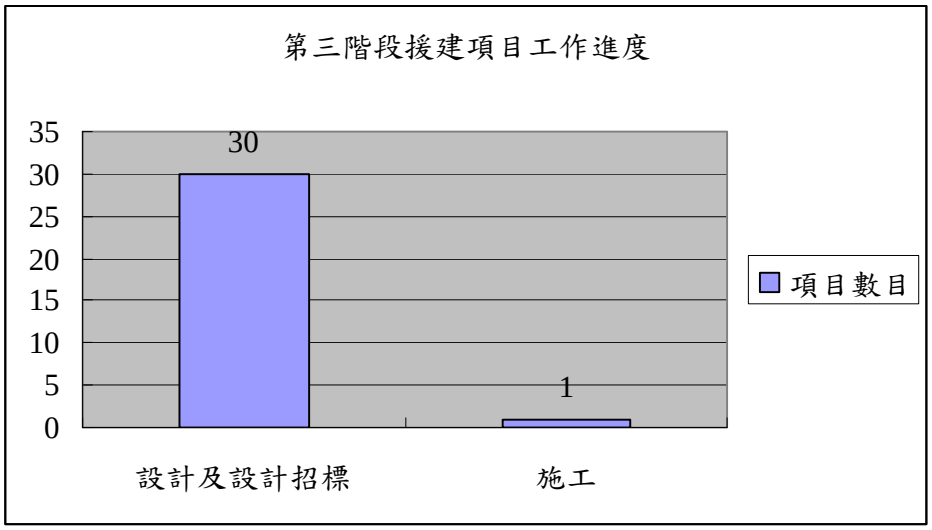

16. 第三階段項目的估算費用為28.63億港元（約24.93億元人民幣）。港方至今撥付了約10.30億港元（約9.06億元人民幣）至川方的援建資金專戶，佔第三階段的承擔額約36.0%。

17. 第三階段援建項目的內容和最新進展見**附件一**。

香港非政府機構申請基金資助參與援建

18. 為了貫徹「政府牽頭、全民參與」的原則，凝聚社會各界的力量，基金在 2008 年 10 月中開始接受香港非政府機構申請資助，協助進行四川災區重建的工作。基金共批出了 36 項申請，涵蓋教育、醫療、肢體及心理康復、社會福利、培訓計劃和社會公共設施等範疇，既有硬件的建設，也有香港非政府機構擅長的軟件服務，涉及的資助總額約 2.84 億港元。其後，有兩間非政府機構分別表示已獲其他資金贊助和未能找到合適的內地合作夥伴而撤回兩個項目(分別為「綿竹市大西街小學災後重建項目」和「阿霸州理縣桃坪鄉佳山村石木結構示範項目」)。撇除上述兩個項目共 1,340 萬港元的資助額，涉及的贊助額上限由原來的 2.84 億港元下調至約 2.70 億港元(詳見**附件一的第三部份**)。剩餘的資助額將會撥作後備款額，以備不時之需。撇除其他所需的撥備款額後，基金餘下已沒有可動用的資金。基金因此已停止公開邀請新的申請。

香港賽馬會的援建工作

19. 香港賽馬會早前曾承諾撥備 10 億港元，支援四川災區重建的工作。該會與四川省相關當局就 4 個項目簽訂了項目合作安排，項目涵蓋醫療康復、中學和體育學校等設施，總承擔額上限約 4.50 億港元（約 4 億元人民幣）(詳情見**附件二**)。該 4 個項目已進入施工階段，其中 1 個中學項目的主體工程已經竣工。此外，該會已落實第二批 2 個承擔額共約 3.35 億港元(約 2.9 億元人民幣)的職業教育項目和災後重建與管理研究項目。至於餘下的撥款，該會會與川方進一步商討有關事宜，正考慮的新項目包括教育及醫療復康設施。

繼續推進援建項目的進度

20. 香港特區支援四川地震災區重建的工作已上軌道，項目資金基本上已按工程進度啟動了撥付程序。接下來，重點將會放在項目管理和監督方面，以確保特區援建項目能質量兼備，以及資金能夠用得其所、有效和到位。

項目管理

21. 正如我們在去年提交的進展報告的詳述，特區援建項目由川方根據內地相關的法律法規實施，抗震設防和其他工程強制性標準都要根據內地最新的規定。此外，根據《特區援建合作安排》和個別項目的《項目合作安排》，特區援建項目要接受四川省監察廳、審計廳及項目業主獨立聘用的監理工程師等監督機構的監督，特區政府相關政策局 / 部門代表和由特區政府聘用的獨立專業顧問還會就特區援建項目進行獨立巡查及提供意見。與此同時，川方也會提供項目實施的進度和質量等相關的資料，包括獨立監理工程師報告，給港方審閱。到目前為止，根據特區政府相關政策局 / 部門及獨立專業顧問的觀察，川方實施單位在執行工作方面並沒有出現重大的問題。就一些技術性問題，川港雙方已經通過現有的溝通協調渠道作出適當的跟進和修正。有關特區在項目管理監督方面的工作，包括工程質量與施工安全及獨立專業顧問的工作，詳情可參閱**附件一的第一部份**。

22. 川方亦非常關注有關的工作，並先後制訂了一系列的規範性文件，明確規範相關的工作程式和權責。川方同時加強了內部的問責和監督架構，在省、市(州)、縣不同的層面均設立了協調機制，明確每個項目的實施管理和監督責任，並責成相關實施單位即時跟進港方提出有關工程質量和施工安全的意見，盡快完成整改。

23. 按照現時的實施進度，預期九成的特區援建項目可於 2011 年年底前完成，當中包括所有的教學項目、大部份的臥龍項目、社會福利綜合服務中心及醫療項目。部分項目由於規模龐大、內容較為複雜和受地理因素所限，包括兩個基建項目、3 個醫療項目及 6 個社會福利項目，預計會在 2012 年方可完成。

<u>資金管理</u>

24. 根據現行的安排，特區援建工作，包括相關的資金管理工作，會以項目為基礎並會按照《項目合作安排》中列明預算的里程碑時間表及資金分期撥付的安排，分期把援建資金撥付至四川省政府的香港特區援建項目資金專戶。川方會實行專戶管理和核算，專款專用，由專戶直接轉撥至省級項目的實施單位，或按實際進度轉撥至項目實施地的市(州)、縣政府所設立的援建資金專戶，支付當地的項目實施單位。正如我們在 2009 年 1 月提交的進展報告(一)和同年 11 月提交的進展報告(三)內詳述，首期資金會預先撥付，之後的分期資金會按照個別項目的實際進度撥付。川港雙方並會進行年度檢查，檢視項目的工程進度，及進行實地考察。

25. 川港雙方已在本年2月3日進行年度檢查及舉行會議。川港雙方於會前實地考察了多個特區援建的項目，檢視工程的進度和質量。雙方在該年度檢查會議上，檢視了特區援建項目的進度和項目資金預算，並因應最新的項目實際進度情況修訂第二期，即2010年全年所需的資金預算。經修訂後的撥付資金為25.96億元人民幣（實際撥付約29.55億港元），約佔特區援建項目總承擔額的35%。

26. 就資金監督工作而言，川方通過既定的溝通協調機制（詳情見下文第28段），向港方通報援建款項的接收、撥付和使用情況。特區方面，基金受託人（即民政事務局局長法團）按照《民政事務局局長法團條例》（香港法例第1044章）的規定，將經審計的帳目表一份，連同審計署署長的報告，以及法團就經審計帳目報表所涵蓋的期間的基金管理所作的報告，不遲於法團從審計署署長接獲經審計的帳目報表及就該報表作出的報告的3個月呈交立法會。有關報告會包括基金的審計帳目。基金的首份審計帳目(截至2009年3月31日)已經完成，並已在2009年12月16日由基金受託人按照上述規定呈立法會。

27. 川港雙方已就三個階段合共151個援建項目簽訂了《項目合作安排》，啟動了撥款的安排，至今，基金共撥付49.69億港元予川方的特區資金專戶，佔特區援建項目預算資金的57.9%。上述資金撥付機制運作暢順。川港雙方會繼續保持緊密聯繫，並會按照既定的程序繼續處理有關的工作。

<u>繼續加強兩地的溝通和聯繫</u>

28. 正如我們在去年提交的進展報告內詳述，川港雙方已建立三層的協調機制，以加強兩地相關部門的

溝通和聯繫。除了由特區政府政務司司長及四川省副省長作為召集人的高層會議外，還包括由特區政府相關政策局 / 部門與四川省政府相關部門組成的協調工作小組會議，以及針對個別援建範疇的項目專責小組。

29. 截至 2010 年 5 月 31 日，按照有關的溝通協調機制，川港雙方共召開了 2 次高層會議、5 次協調工作小組會議、26 次項目專責小組會議和 230 次其他工作層面的會議。除了特區政府相關政策局 / 部門代表的參與外，特區政府相關平台的非政府人員和專家也按需要參與了專責小組和工作層面的會議。期間，港方代表還參與了 94 次的實地考察活動(不包括特區政府獨立專業顧問的考察工作)，涉及的工作量共約 1,085 個人日，範圍基本上包括所有特區援建的項目。

30. 過去六個月內，我們已安排了兩個分別由四川省港澳辦及審計廳，和四川省監察廳及發改委等代表組成的考察團到港學習考察，與各有關的政策局及部門，以及相關的獨立機構如廉政公署等會面交流。這都有助雙方更順利推行援建項目的監督監管工作。

特區援建工作的整體資金承擔分佈

31. 財委會早前同意開立的承擔額合共 90 億元，連同基金至今收到的民間捐款和滾存的利息合共約 1,996 萬元(截至 2010 年 5 月 18 日)，兩者合計共 90.20 億元。截至 2010 年 5 月 10 日，基金就三個階段的承擔額為 85.88 億元，可動用的餘額約 0.49 億元。整體資金承擔分佈情況大致如下 –

範疇		預算開支（億元人民幣）	預算開支(億港元)
(a)	首階段 20 個援建項目	16.45	18.74
(b)	第二階段 100 個援建項目	33.65	38.51
(c)	第三階段 31 個援建項目	24.93	28.63
(d)	已批的 34 個非政府機構項目	--	2.70
(e)	人手及營運開支（包括由發展局聘請獨立專業顧問的費用）	--	1.13
(f)	應急費用	--	0.49
	總計:	--	**90.20**

下一步

32. 特區政府會繼續和四川省政府保持緊密溝通和聯繫，繼續推進援建的進度和做好工程及資金運用的監督工作。我們亦會定期向立法會相關的事務委員會匯報特區援建工作的最新進展，並會把有關的報告上載特區政府政制及內地事務局的網頁，給市民參閱。

政制及內地事務局
發展局
2010 年 5 月



「希望本是無所謂有，
無所謂無的。
這正如地上的路；
其實地上本沒有路，
走的人多了，
也便成了路。」

摘自魯迅《故鄉》

香港特區支援

四川地震
災後恢復重建

工作進展報告
2010年5月

四川重建
sichuan rebuild

香港特別行政區政府發展局

第一部份：援建工程整體情況

頁

(一) 香港特區參與四川重建歷程紀要 1

(二) 政府牽頭・全民參與

1. 發展局及技術支援架構 4
2. 發展局和其他政府部門的參與 5
3. 技術支援機構的參與 5

(三) 援建項目整體概覽：

1. 項目類別、分佈、數目及金額 6
2. 援建項目進度 7
3. 工程質量與施工安全 8
4. 「獨立專業顧問」工作 9
5. 資金管理 15

第二部份：個別項目資料及進度

(四) 援建項目清單 16

(五) 基建項目：

1. 省道 303 線映秀至臥龍段公路恢復重建工程 19
2. 綿茂公路漢旺至牛圈溝段恢復重建工程 20

(六) 臥龍自然保護區項目：

1. 臥龍自然保護區規劃編制方案 21
2. 都江堰大熊貓救護與疾病防控中心 22
3. 災後電力能源恢復與新建 23
4. 中國保護大熊貓研究中心 24
5. 管理局辦公與職工工作用房 25
6. 耿達一貫制學校 26
7. 臥龍鎮中心小學校 27
8. 醫療保健重建 28
9. 臥龍鎮社會福利院 29
10. 垃圾處埋和轉運系統 30
11. 供排水設施恢復與重建 31
12. 五一棚大熊貓野外生態觀察站 32
13. 鄧生、木江坪、三江基層保護站(點)重建 33
14. 邛崍山系世界自然遺產地自然與地震博物館 34
15. 巡護監測路網恢復重建 35
16. 大熊貓棲息地植被恢復 36
17. 道路交通設施恢復與新建 37
18. 地質災害治理與防治 38
19. 鄉土文化遺產災後重建 39
20. 標樁、標牌設施災後重建 40
21. "數字臥龍"系統工程 41

(七) 教育項目：

1. 水磨中學 42
2. 蒼溪中學校 43
3. 三台縣第一中學 44
4. 德陽市第一小學 45
5. 華山路小學 46
6. 東汽小學 47
7. 魏城鎮中心小學 48
8. 雲溪初級中學 49
9. 南隆鎮第一小學 50

10. 寶飛鎮初級中學 51
11. 青龍鎮初級中學 52
12. 書院初級中學 53
13. 興賢小學 54
14. 隴東中學 55
15. 蜂桶寨小學 56
16. 五龍中心校 57
17. 金山鎮第一小學 58
18. 略坪鎮小學 59
19. 合江鎮中心校 60
20. 隆興中心校 61
21. 文昌鎮初級中學 62
22. 夾江中學 63
23. 仁義初級中學 64
24. 天全縣初級中學 65
25. 樂英初級中學 66
26. 滎經中學 67
27. 泗坪中學 68
28. 嚴橋三九學校 69
29. 涪江路小學 70
30. 城北中學 71
31. 小河壩中學 72
32. 永興鎮初級中學 73
33. 巴中中學 74
34. 巴州區第一小學 75
35. 玉井鄉中心小學校 76
36. 邱家小學 77
37. 平昌縣第二中學 78
38. 平昌中學 79
39. 平昌縣實驗小學 80
40. 麻石鎮中心小學 81
41. 通江縣第二中學 82
42. 馬鞍中學 83
43. 新政初級中學 84
44. 西罨學校 85
45. 北外中心校 86
46. 渠縣中學 87
47. 石棉縣幼兒園 88
48. 恩陽中學 89
49. 巴州區第四中學 90
50. 朝陽中學 91
51. 南部中學 92
52. 綿陽中學 93
53. 儀隴中學 94
54. 小河職業中學 95
55. 蘆山縣初級中學 96
56. 白塔中學 97
(八) 社會福利綜合服務設施項目：
1. 朝天區社會福利綜合服務中心 98
2. 元壩區社會福利綜合服務中心 99

3. 游仙區社會福利綜合服務中心 100
4. 德陽市社會福利綜合服務中心 101
5. 旺蒼縣社會福利綜合服務中心 102
6. 蒼溪縣社會福利綜合服務中心 103
7. 羅江縣社會福利綜合服務中心 104
8. 廣漢市社會福利綜合服務中心 105
9. 大邑縣悅來敬老院 106
10. 江油市殘疾人康復服務中心 107
11. 綿竹市殘疾人康復服務中心 108
12. 南江縣殘疾人康復服務中心 109
13. 大邑县残疾人康复服务中心 110
14. 崇州市殘疾人康復服務中心 111
15. 九寨溝縣殘疾人康復服務中心 112
16. 小金縣殘疾人康復服務中心 113
17. 松潘縣殘疾人康復服務中心 114
18. 茂縣殘疾人康復服務中心 115
19. 理縣殘疾人康復服務中心 116
20. 黑水縣殘疾人康復服務中心 117
21. 閬中市殘疾人康復服務中心 118
22. 石棉縣殘疾人康復服務中心 119
23. 漢源縣殘疾人康復服務中心 120
24. 寶興縣殘疾人康復服務中心 121
25. 蘆山縣殘疾人康復服務中心 122
26. 三台縣殘疾人康復服務中心 123
27. 北川縣殘疾人康復服務中心 124
28. 平武縣殘疾人康復服務中心 125
29. 安縣殘疾人康復服務中心 126
30. 梓潼縣殘疾人康復服務中心 127
31. 涪城區殘疾人康復服務中心 128
32. 鹽亭縣殘疾人康復服務中心 129
33. 劍閣縣殘疾人康復服務中心 130
34. 中江縣殘疾人康復服務中心 131
35. 旌陽區殘疾人康復服務中心 132

（九）醫療康復項目：

1. 朝天區中醫醫院 133
2. 旺蒼縣人民醫院 134
3. 元壩區人民醫院 135
4. 梓潼縣人民醫院 136
5. 鹽亭縣中醫院 137
6. 德陽市第二人民醫院（一期工程） 138
7. 旌陽區中醫院 139
8. 廣漢市人民醫院 140
9. 川港康復科技綜合大樓 141
10. 朝天區人民醫院 142
11. 旺蒼縣中醫院 143
12. 元壩區中醫院 144
13. 鹽亭縣人民醫院 145
14. 德陽市中西醫結合醫院 146
15. 羅江縣中醫院 147
16. 涪城區吳家鎮中心衛生院 148

17. 三台縣中醫院 149
18. 梓潼縣中醫院 150
19. 滎經縣人民醫院 151
20. 名山縣人民醫院 152
21. 百丈中心衛生院 153
22. 儀隴縣婦幼保健院 154
23. 仁壽縣精神衛生保健院 155
24. 宣漢縣人民醫院第二住院大樓 156
25. 樂至縣石湍中心衛生院 157
26. 平昌縣人民醫院 158
27. 南江縣人民醫院 159
28. 東汽醫院(德陽市第六人民醫院) 160
29. 德陽市第二人民醫院（二期工程） 161
30. 雅安市中醫院 162
31. 雅安市婦幼保健院 163
32. 華西醫院遠端醫療網絡平臺 164
33. 綿陽市中心醫院 165
34. 綿陽市中醫院 166
35. 綿陽市婦幼保健院 167

第三部份： 特區援建基金同意資助的香港非政府機構申請項目 168



汶川大地震發生後，立法會先後三次批准撥款，共港幣 90 億元，注入「支援四川地震災區重建工作信託基金」。香港特區參與四川重建歷程，簡列於後頁。

2008 年 5 月 12 汶川大地震



2008 年 5 月 14 立法會批准賑災基金撥款 3.5 億元

2008 年 6 月 12 **政府牽頭 全民參與**
香港建造界 5.12 重建工程聯席會議成立

四川重建 sichuan rebuild

2008 年 6 月 26 香港特區支援四川地震災區重建督導委員會成立

2008 年 6 月 27~29 特首到災區考察



2008 年 7 月 4~6 立法會議員到災區考察

2008 年 7 月 18 立法會批准首階段撥款 20 億元注入支援四川地震災區重建工作信託基金

2008 年 8 月 1 政務司司長與四川省政府常務副省長召開「災後重建川港聯絡協調小組」第一次會議



2008 年 9 月 8~10 川港工作協調小組第一次會議

2008 年 10 月 11 川港簽署《支援四川災後恢復重建合作安排》《援建省道 303 線映秀至臥龍段意向書》《援助並連同海洋公園參與「臥龍保護區規劃編制專案」意向書》



2008 年 10 月 30~3 2008 年 11 月 與建造界 5.12 重建工程聯席會議成員及海洋公園專家實地考察臥龍自然保護區重建項目選址



2008 年 11 月 7 川港簽署《川港康復中心意向書》



2009 年 2 月 20 立法會批准第二階段撥款 40 億元注入支援四川地震災區重建工作信託基金，基金總額 60 億元

2009 年 3 月 27 川港簽署《第二階段援建工作意向書》



2009 年 4 月 8 川港簽署援助臥龍保護區規劃編制及省道 303 線映秀至臥龍段公路恢復重建工程《項目合作安排》



2009 年 7 月 3 立法會批准第三階段撥款 30 億元注入支援四川地震災區重建工作信託基金，基金總額 90 億元

2009 年 5 月 12

政務司司長出席汶川地震周年紀念活動



2009 年 5 月 18

川港工作協調小組第二次會議

2009 年 7 月 6

川港簽署《第三階段援建工作意向書》



2009 年 8 月 20,28

發展局聘請獨立專業顧問協助重建項目技術檢查工作

2009 年 8 月 29

發展局與四川省林業廳於深圳聯合舉辦《臥龍未來發展的挑戰》工作坊



2009 年 8 月 31 2009 年 9 月 1,2

政務司司長考察特區支援災後重建項目進度並主持汶川水磨中學教學樓的揭牌儀式和德陽袁家小學的開學禮



2009 年 9 月 24~26

立法會議員考察地震災後恢復重建的情況

2009 年 11 月 9

川港工作協調小組第三次會議

2009 年 11 月 21~24

「臥龍重點項目」建築專家顧問團實地考察臥龍重建兩個重點項目(臥龍中國保護大熊貓研究中心、都江堰大熊貓救護與疾病防控中心)



2010 年 2 月 3

川港工作協調小組第四次會議暨特區援建項目年度檢查

2010 年 4 月 29

發展局與四川省林業廳於深圳聯合舉辦《臥龍中國保護大熊貓研究中心、都江堰大熊貓救護與疾病防控中心建築設計》工作坊




2010 年 5 月 27

發展局於成都舉辦《工程質量及施工安全》工作坊
川港工作協調小組第五次會議

1. 發展局及技術支援架構

香港特區支援四川地震災後重建，發展局有賴建築界及保育界相關機構，以及各政府部門鼎力支持，提供技術支援，工作得以順利推展。

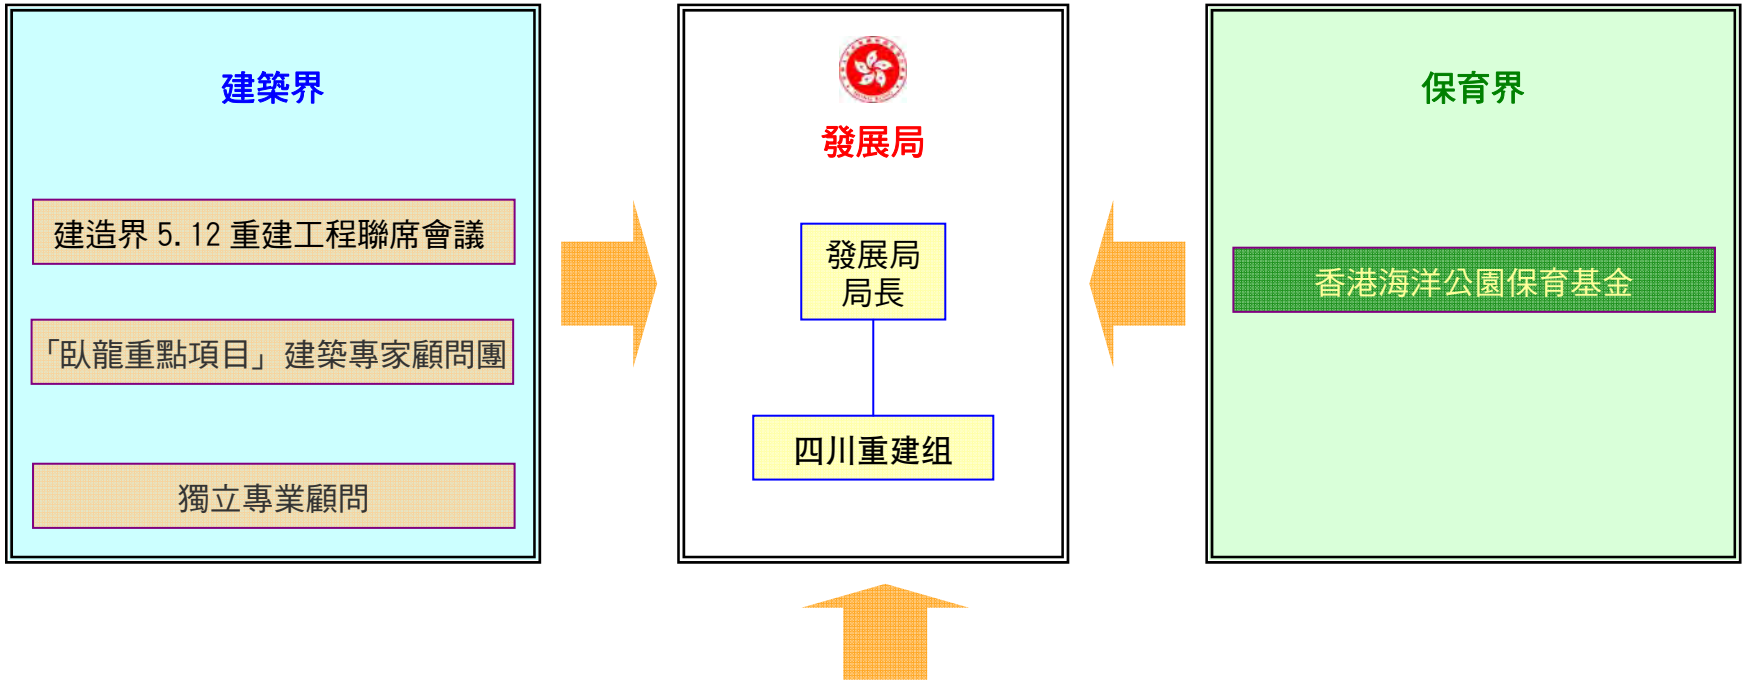

2. 發展局和其他政府部門的參與

(截至 20/5/2010)

發展局:

往內地開會/實地考察/巡查次數:	81
參與人次:	194

其他政府部門:

往內地開會/實地考察/巡查次數:	5
參與人次:	9

3. 技術支援機構的參與

(截至 20/5/2010)

技術支援機構*:

往內地開會/實地考察/巡查次數:	29
參與人次:	109

*參與的技術支援機構包括：


- 建造界 5.12 重建工程聯席會議成員：
  - 香港建築師學會
  - 香港工程師學會
  - 香港測量師學會
  - 香港規劃師學會
  - 香港園境師學會
  - 建築師事務所商會
  - 香港顧問工程師協會
  - 香港建造商會
  - 香港機電工程商協會
  - 中華建設基金
- 「臥龍重點項目」建築專家顧問團
- 香港海洋公園保育基金

1. 項目類別、分佈、數目及金額


香港特區支援四川地震災後重建項目數目及金額

	階段			總計	金額 (億港元)
	一	二	三		
基建	1	0	1	2	31.65
臥龍	1	22	0	23	15.90
教育	5	51	0	56	15.78
社福	4	7	24	35	5.71
醫療康復	9	20	6	35	16.79
總計	20	100	31	151	85.83
金額 (億港元)	18.73	38.49	28.61	85.83	

援建項目金額分佈

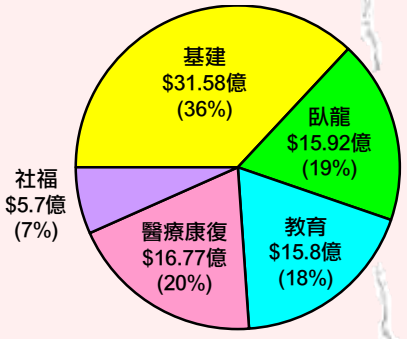

香港特區支援四川地震災後重建項目分佈

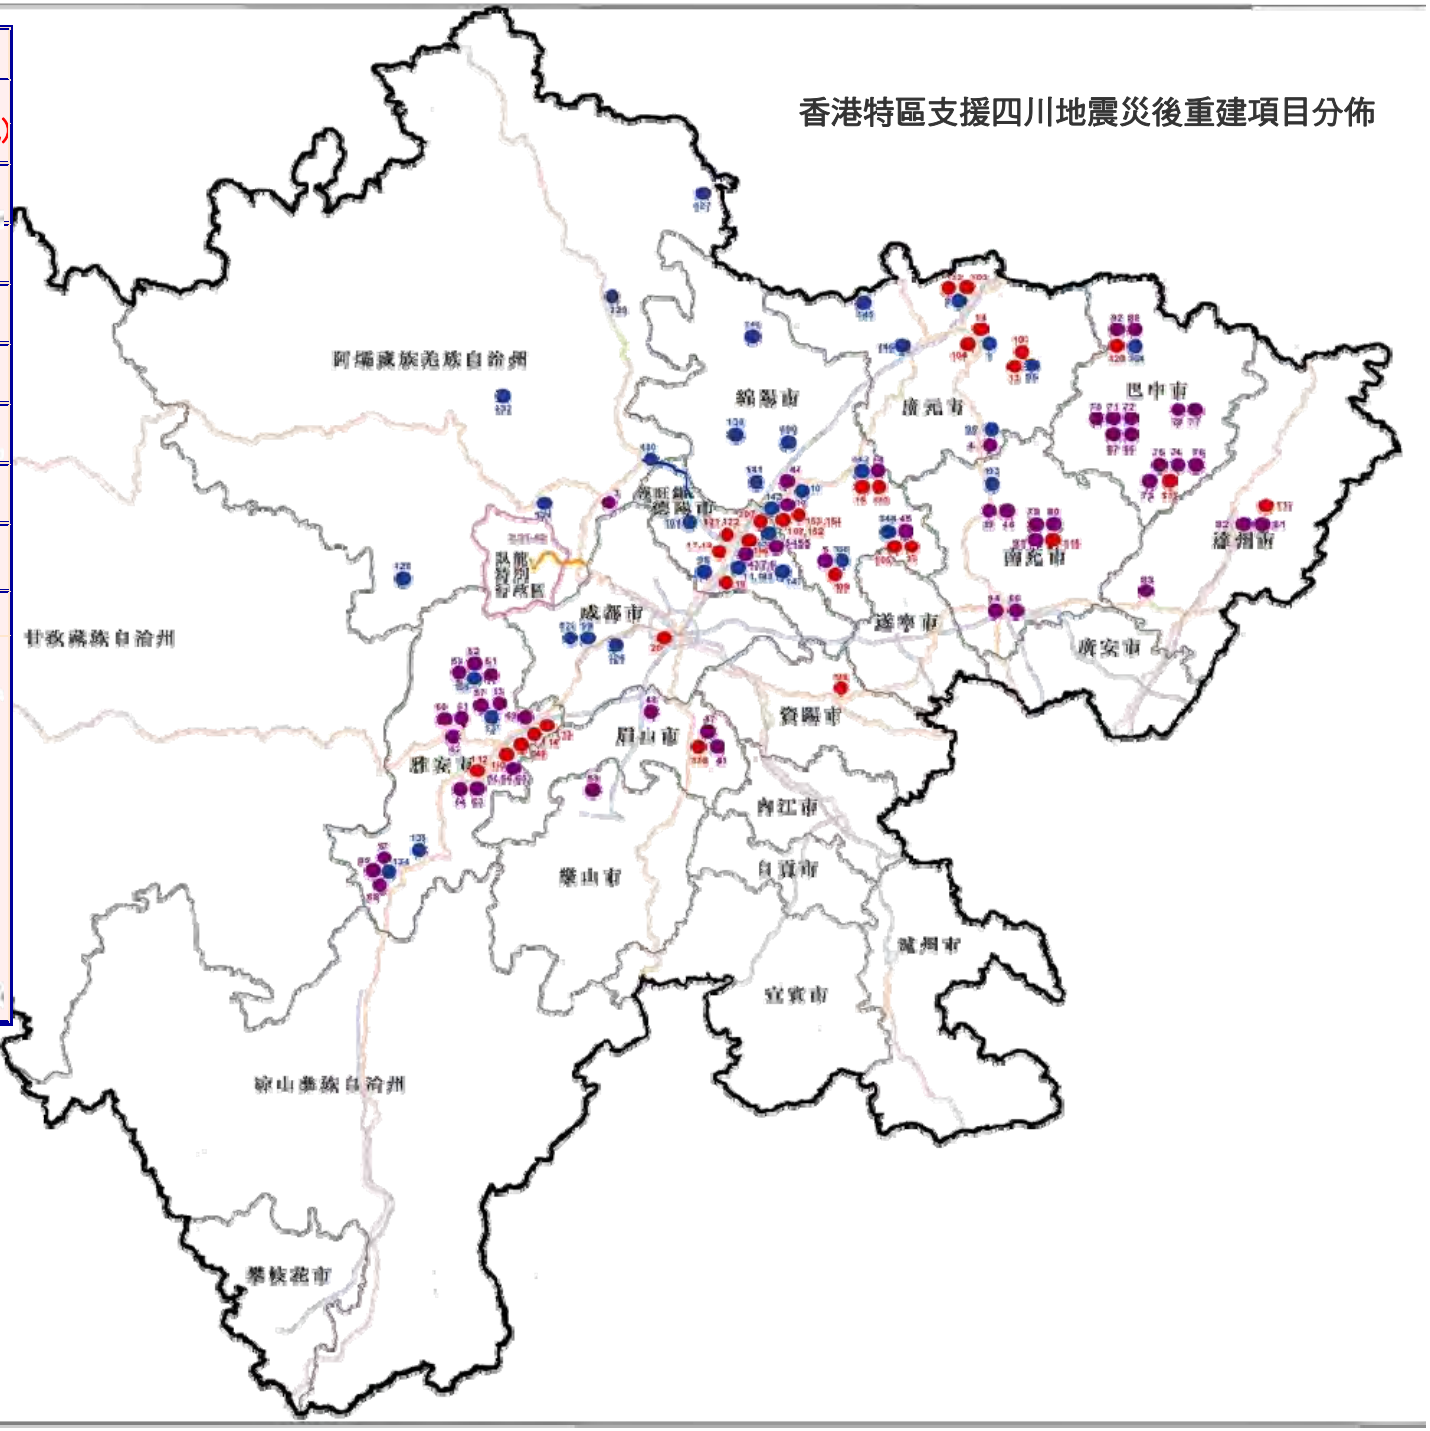

圖例

- 學校
- 醫院
- 社福
- 省內公路
- 臥龍
- 國道
- 區界
- 省界

(圓點旁數字為項目序號，其代表項目請參閱第 16-18 頁)

2. 援建項目進度

i) 整體情況

立法會財務委員會於 2008 年 7 月、2009 年 2 月和 7 月先後通過撥款合共 90 億元，注入特區「支援四川地震災區重建工作信託基金」，以推展特區首、第二和第三階段的援建工作。

截至 2010 年 5 月，特區援建四川地震災區的的 151 項目，其中 2 個項目（臥龍自然保護區規劃編制和汶川縣水磨中學）已經竣工；正在施工的項目達 83 個(55%)；在施工前階段的項目有 66 個。

ii) 各類援建項目推展情況

特區援建的兩個基建項目，包括省道 303 公路映秀至臥龍段，以及綿茂公路，已進入施工階段，雖然工程艱巨，進展大致順利。教育及醫療康復項目，分別有 79%(44 項)及 71%(25 項)的項目正在施工。社會福利綜合服務設施方面，正在施工的項目有 26%(9 項)，正在設計或施工招標項目共有兩個，其餘屬第三階段的 24 個殘疾人康復服務中心，則正在就設計進行招標。至於臥龍自然保護區項目，由於受重建中的省道 303 限制，大部份項目正進行施工前的準備工作，其中 3 個項目，包括兩所學校及供電網絡工程，剛於 5 月中動工。


iii) 項目完成日期


按照現時的實施進度，預期約九成的特區援建項目可於 2011 年年底前完成，大體上可達致三年基本完成重建工作的目標，當中包括所有的教育項目、大部份的醫療康復、臥龍及社會福利綜合服務設施項目。部份項目，由於規模龐大及內容較為複雜，包括兩個基建項目及 3 個醫療康復項目，預計會在 2012 年方可完成。

各類援建項目進度表

(截至 20/5/2010)

	未動工			施工中	已竣工	總計
	準備設計	正在設計	施工招標			
基建	-	-	-	2		2
臥龍	-	19	-	3	1	23
教育	-	10	1	44	1	56
社福	24	1	1	9	-	35
醫療康復	-	9	1	25	-	35
總計	24	39	3	83	2	151
比率	16%	26%	2%	55%	1%	100%
	44%			55%	1%	100%

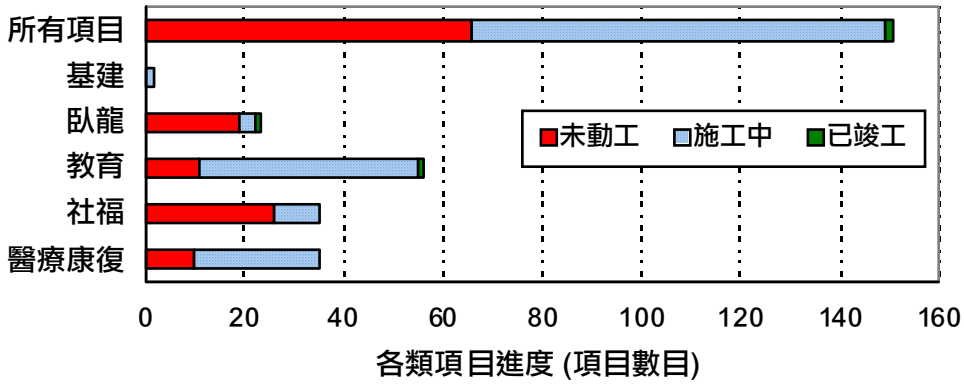

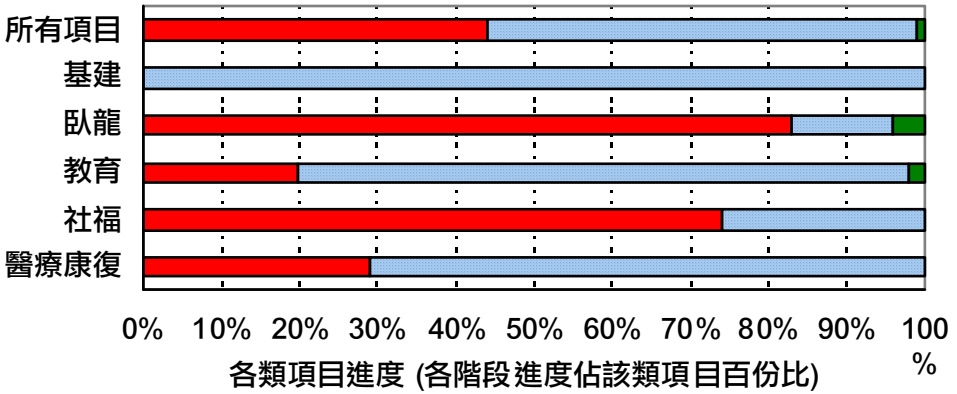

3. 工程質量與施工安全

i) 整體情況

從去年 9 月至今，「獨立顧問」分別就 70 個援建項目，進行實地技術檢查共 174 次(實地技術檢查工作進度及觀察概要見本報告第 9 頁及第 10 至 14 頁)。自援建項目動工以來，發展局亦作出 77 次實地巡視。綜合觀察所得的整體情況，歸納如下：

工程質量

- ❑ 整體工程質量，並沒有出現重大的問題。個別項目在施工及建材質量和紀錄管理上，仍可再進一步改善。川方在收到港方的意見後，已立即跟進及整改，而港方亦已完成覆檢，確認問題已經解解決。
- ❑ 工程質量管理系統方面，已有明顯的改善。

施工安全

- ❑ 工地安全方面，並沒有出現重大的事故。部份項目在施工安全管理上，仍有不足之處，川方已在港方提出整改意見後，作出跟進和修正。

現時，發展局收到的「獨立專業顧問」技術檢查報告共 143 份，由川方提供的內地監理工程師報告共 148 份。由於數目眾多，未能將報告副本夾附在本報告內。發展局已將報告存檔，如有需要，可在發展局檔案室閱覽。

ii) 川港監察措施

為確保援建項目質量，川港同意進一步完善現有監察機制，包括：

- ❑ 若出現涉及重大安全問題的事宜，川方會在港方提出意見後立即跟進。其他事項，川方會在港方提出整改意見後 7 天內處理，相關「項目專責小組」亦會作出適當跟進。
- ❑ 川港雙方會建立表現評核制度，監察每個承建商和監理單位的表現，將表現持續欠理想的承建商和監理單位，列入監察名單內，加強巡查這些項目的密度，並實施行政處分，以收阻嚇作用。

iii) 工程質量與施工安全工作坊」

為了讓川港雙方更深入交流工程質量管理與施工安全的經驗，發展局已安排於 2010 年 5 月 27 日在成都舉辦「工程質量與施工安全工作坊」，邀請兩地專家及參與特區援建工程相關單位(包括四川省/地方政府官員、項目建設單位、業主、承建商、監理單位、設計單位等代表)出席，透過個案分析和經驗交流，進一步推動優質建設和安全施工。

4. 「獨立專業顧問」工作

i) 「獨立專業顧問」的聘請

特區政府援建四川重建項目共 151 個，遍佈於四川 12 個受災地區。由於監察工程質量的工作至為重要，而援建工程項目繁多，現場視察工程的工作量既龐大亦繁重，發展局於去年 8 月聘請在內地工程項目及審核方面有豐富經驗的「獨立專業顧問」，協助執行實地巡視工作。

「獨立專業顧問」技術檢查服務，按地域分為 3 個合約，主要工作範圍包括：

- ❑ 在每個援建項目的重要階段進行實地視察工程進度、質量及資金使用等事宜。
- ❑ 審視川方提交的有關文件。
- ❑ 向發展局提交檢查報告，詳述重建項目的整體進度、資金使用及質量管理狀況，並就巡視時的觀察提出意見及建議。

ii) 「獨立專業顧問」工作概況

自 2009 年 9 月，「獨立專業顧問」分別就 70 個援建項目，實地進行獨立技術檢查 174 次(見附表 4.1)。「獨立專業顧問」每次實地巡視後，會在現場與建設、施工及監理單位就技術檢查所發現的問題進行交流，以求作出改善。

港方亦會就「獨立專業顧問」就技術檢查報告內提出的重大事項，與川方跟進，確保有關單位即時進行整改。


整體上，技術檢查並未發現重建工程在質量上嚴重問題，「獨立專業顧問」就援建項目的質量管理、安全管理、記錄管理及工程進度方面的觀察，見附表 4.2。

4.1「獨立專業顧問」實地技術檢查工作進度

(截至 20/5/2010)

		基建	臥龍	教育	醫療	社福	合計
1	已動工項目	2	3	44	25	9	83
2	已作技術檢查項目	2	0	43	21	4	70*
	已作技術檢查比率	**100%**	**0%**	**98%**	**84%**	**44%**	**84%**
3	技術檢查次數	18	0	100	47	9	174
4	已呈交技術檢查報告	16	0	79	41	7	143

*部份項目由於剛開始動工，技術檢查工作於稍後時間執行

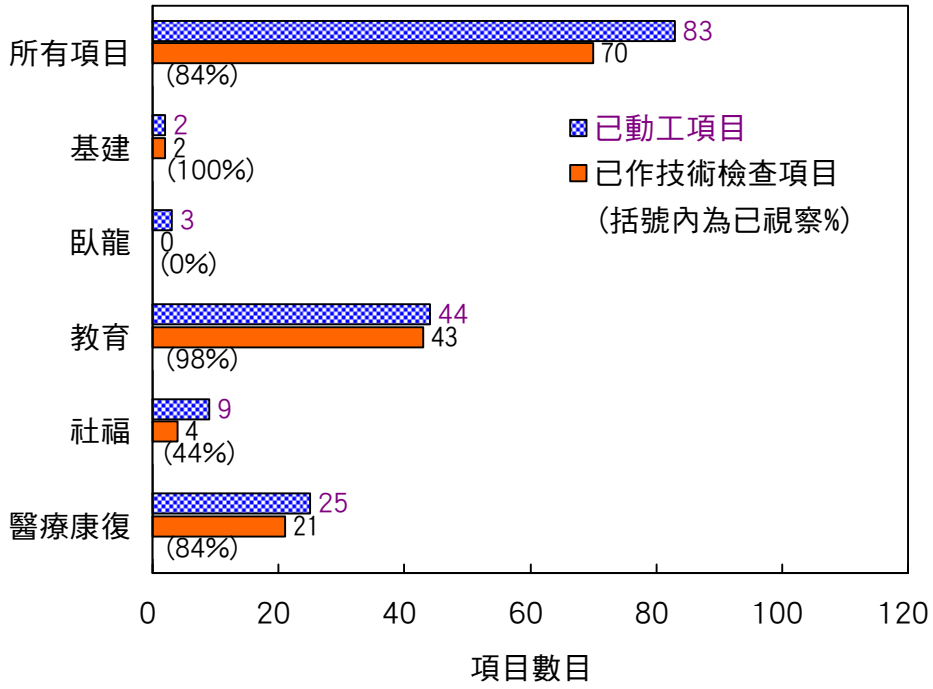

4.2 「獨立專業顧問」實地技術檢查觀察概要

2009 年 9 月至 2010 年 5 月（截至 5 月 20 日）

序號	重建項目	日期	觀察要點	跟進工作
(A) 質量管理				
1	廣元市元壩區人民醫院	2009.09.22	• 樁基礎垂直度偏差超出規範的規定 • 欠垂直度和水準偏差記錄	• 顧問已即時建議建設單位將有關問題與設計單位跟進。 • 建設單位與設計單位之後為可能受影響的樁柱進行檢測並提供了檢測報告，確認各樁柱滿足設計要求。 • 建設單位之後提供了施工之後進行的預制樁柱垂直度偏差的複檢記錄，確認其他樁柱垂直度偏差，並無超出規範的規定。
2	省道 303 (合同 YW1)	2009.10.15	• 混凝土攪拌站沒有足夠計量設備，影響混凝土材料配合比的準確性	• 顧問已要求加置計量設備及附上清晰標示，以方便管理人員隨時檢查。
3	省道 303 (合同 YW4)	2009.10.16	• 樁基礎頂部預留豎向搭接鋼筋未完全依圖施工	• 施工單位在檢查翌日已即時把樁基礎頂部的混凝土打掉，並與顧問複查，確定樁內鋼筋為按圖施工。 • 顧問亦已即時要求施工單位整改有關鋼筋彎折及間距，以及改善自檢系統。
4	綿陽市監亭中醫院	2009.10.27	• 部份鋼筋佈置，與規範有些偏差	• 顧問已即時要求施工單位儘快採取適當措施以更正及防止偏差發生。 • 顧問於 12 月檢查時，監理及建設單位確認已跟進及整改。
5	綿陽市蒼溪中學	2009.10.28	• 對混凝土結構中的鋼筋保護層厚度控制不嚴	• 顧問已即時要求施工單位採取措施更正及加強厚度控制。
6	省道 303	2009.11.25	• 監理部的部分“現場品質檢驗報告單”出現兩格“現場監理工程師”簽名欄，而沒有“專業監理工程師”簽名欄，需查看是否表格出錯	• 顧問已於 12 月的檢查中確認監理部已整改“現場品質檢驗報告單”表格。
7	省道 303	2009.12.22	• 漁子溪 3 號橋預製張拉梁外觀品質差，有部分張拉錨固位置混凝土出現泡沫孔和缺口掉塊	• 顧問已即時建議監理部就張拉錨固位置混凝土強度做試驗，並要求施工單位提供整改方案和通知設計院檢查。 • 顧問已於 1 月的檢查中確認施工單位已整改。
8	新政初級中學	2009.12.22	• 沉管灌注樁位置偏差超過規範規定	• 設計單位隨後覆檢設計，確定樁移位可接受。
9	巴州區恩陽中學	2010.01.21	• 部份樓梯梁鋼筋數量與圖紙不符	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。 • 顧問於 3 月檢查時，確認施工單位已整改，部份結構已通過驗收。
10	省道 303	2010.01.22	• 預製橋樑樑體高度未滿足設計要求高度 • 橋墩未按照設計圖鑿除破碎範圍 • 漁子溪預製樑預拱未符合設計要求 • 集料分區未按設計要求劃分成四級	• 發展局於 3 月份要求業主、設計院及施工單位跟進整改。修訂後的整改方案已經監理確認。 • 設計單位已到現場檢查，認為台帽無須鑿除，並已於 2 月 2 日簽字認可施工單位的施工工序。 • 施工單位將對漁子溪 3 號橋預製片梁進行每片梁靜載試驗，不合格片梁將報廢,然後重做新梁。 • 設計單位於 3 月 9 日已到現場視察，已確認碎石基層可用三級分區，並修改設計說明。

序號	重建項目	日期	觀察要點	跟進工作
11	城北中學	2010.03.02	• 因混凝土漏漿以致基礎變形及需整改	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。 • 顧問於 4 月檢查時，確認施工單位已整改。
12	朝陽中學	2010.03.02	• 設計單位未能出示宿舍樓附近的擋土牆（堡坎）的結構施工圖	• 設計單位在顧問提出要求後，已提供擋土牆設計圖。
13	馬鞍中學	2010.03.02	• 個別柱預留鋼筋長度與圖紙不符 • 部份混凝土發現蜂窩情況	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
14	大邑縣悅來敬老院	2010.03.04	• 部分柱鋼筋移位元，鋼筋接焊縫不夠飽滿	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
15	三台縣第一中學	2010.03.05	• 部份混凝土柱有蜂窩情況	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
16	鹽亭中醫院	2010.03.05	• 個別樓梯發現蜂窩情況 • 個別間牆磚發現裂紋	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制。顧問會於下次檢查時跟進。
17	涪江路小學	2010.01.20	• 部份混凝土柱有蜂窩情況	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制。 • 顧問於 3 月檢查時，確認施工單位已整改。
18	渠縣中學	2010.03.22	• 個別柱的預留鋼筋的位置偏差超過規範規定 • 部份樑內鋼筋的混凝土保護層小於規範要求	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
19	蒼溪中學校	2010.03.23	• 預留鋼筋長度不足	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止偏差再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
20	朝天區社會福利綜合服務中心	2010.03.25	• 個別樑大小不合規格 • 個別鋼筋長度不足	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
21	梓潼縣人民醫院	2010.03.26	• 樓板厚度與設計不符	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制。顧問會於下次檢查時跟進。
22	石湍中心衛生院	2010.03.29	• 鋼筋保護層不足 • 部份混凝土柱角有局部漏漿情況 • 預製樓面板下空間未回填 • 砂與石子存放時沒有分隔開	• 顧問已即時要求施工單位進行整改。發展局已指示顧問加密巡查，以監察監理及施工單位落實整改的情況。
23	德陽市中西醫結合醫院	2010.03.31	• 部分柱基礎混凝土有露筋現象 • 柱鋼筋的電渣壓加焊接頭不合格	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
24	德陽市東汽職工醫院	2010.04.01	• 消能減震預埋件未有除銹漬 • 部分已完成的磚牆磚體破損 • 砌體牆的預埋電線喉管的開槽部位在抹牆灰前未有加上鐵絲網	• 顧問已即時要求施工單位進行除銹及更換已破損的磚體。顧問會於下次檢查時跟進。
25	省道 303 (合同 YW2)	2010.04.25	• 明洞伸縮縫出現滲水情況	• 顧問已即時要求監理部檢查及整改仲縮縫防水物料。顧問會於下次檢查時跟進。
26	綿茂公路 (合同 A1)	2010.04.25	• 為解決臨時道路通車問題，施工單位元自行將部分擋牆背臨時回填	• 顧問已即時要求監理對這些臨時回填部位逐一進行登記，在正式回填前移除臨時回填物，並拍照存證。顧問會於下次檢查時跟進。

序號	重建項目	日期	觀察要點	跟進工作
27	吳家鎮中心衛生院	2010.04.26	• 柱鋼筋的混凝土保護層不符規範規定 • 柱鋼筋的錨固長度不符規範規定 • 已完成的樑柱不平整 • 已完成的上層柱與下層柱的接縫處有漏漿引起之蜂窩	• 顧問已即時要求施工單位更正及加強質量控制，以防止事件再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
28	興賢小學	2010.04.28	• 混凝土柱腳、樓梯板有漏漿情況，造成蜂窩	• 顧問已即時要求施工單位整改及加強質量控制，以防止事件再次發生。顧問會於下次檢查時跟進。
• (B) 安全管理				
1	廣元市元壩區人民醫院	2009.09.22	• 基坑開挖未按規範進行放坡式設置臨時支護結構 • 基坑旁堆放大量砂石或土方，構成安全隱患	• 顧問已即時要求施工單位採取適當措施以防止安全事故的發生。翌日，施工單位已運走了多餘土方；目前基礎施工完畢，土方已完全回填，土方邊坡的安全隱患已解除。
2	仁壽縣精神衛生保健院	2009.11.25	• 沒有臨時排水系統，低窪位置有雨水淹浸危險	• 顧問已即時要求施工單位元制訂臨時排水系統，並儘快實施有關措施。 • 發展局 2 月份的視察時，確認施工單位已整改完成。
3	巴州區第四中學	2010.01.20	• 人工挖孔樁與地面平甚至低於地面（容易導致物體墜落或地面水流入孔內） • 斜坡的坡度不符合規範規定且無臨時或永久擋土結構	• 顧問已即時要求施工單位整改以防止危險事故發生。 • 顧問於 4 月檢查時，監理單位確認已跟進及整改。
4	巴州區巴中中學	2010.01.22	• 土方開挖深度超過 2 米，基本無放坡或設立臨時支撐 • 挖出的土方堆放處太高且臨近居民區，堆土僅由普通磚砌圍牆支擋，存在安全隱患 • 人工挖孔樁與地面平甚至低於地面（容易導致物體墜落或地面水流入孔內）	• 顧問已即時要求施工單位整改，以防止危險事故發生。 • 顧問於 4 月檢查時，監理和施工單位確認已跟進及整改。
5	朝陽中學	2010.03.02	• 場地附近的斜坡保護及排洪設施的設計與施工尚未落實	• 顧問已即時要求施工單位整改，以防止危險事故發生。顧問會於下次檢查時跟進。
6	儀隴縣婦幼保健院	2010.03.02	• 施工單位須跟進地下 4 米深大坑之基坑開挖，儘快修正及處理。 • 人工挖孔樁周圍沒有加裝安全圍欄	• 顧問已即時要求施工單位整改，以防止危險事故發生。 • 顧問於 4 月檢查時，基礎工程已完成及通過驗收。
7	元壩區社會福利綜合服務中心	2010.03.04	• 場地附近的斜坡保護及排洪設施工程的設計與施工尚未落實	• 顧問已即時要求施工單位整改，以防止危險事故發生。顧問 2010 年 4 月再巡查時，排洪設施已完成，設計單位已提供斜坡保護工程設計圖。
8	平昌中學	2010.03.26	• 女生宿舍樓工地場地平整與斜坡加固工程存在安全隱患	• 顧問已即時要求施工單位整改，以防止危險事故發生。顧問會於下次檢查時跟進。
9	石湍中心衛生院	2010.03.29	• 樓面支撐架穩定性不足，影響承載能力 • 樓面孔口沒有覆蓋，樓梯邊沒有搭設臨時護欄	• 顧問已即時要求施工單位對支撐架進行整改，並採取適當措施以防止危險事故發生。顧問會於下次檢查時跟進。

序號	重建項目	日期	觀察要點	跟進工作
10	眉山市仁壽縣精神衛生保健院	2010.03.29	• 部分護坡高度達到 10 米高 • 防護網有孔洞	• 顧問已即時要求施工單位整改，以防止危險事故發生。顧問會於下次檢查時跟進。
11	德陽羅江縣中醫院	2010.04.29	• 地基開挖，靠近舊房位置須安裝支撐及位移監控措施，其他開挖位置亦須安裝適當支撐	• 顧問已即時要求施工單位整改，以防止危險事故發生。顧問會於下次檢查時跟進。
• (C) 記錄管理				
1	省道 303	2009.09.22	• 項目管理單位未向品質監督機構辦理監督業務手續（即質安登記）	• 建設單位已於 10 月份與發展局的會面中提交相關文件。
2	綿茂公路 (合同 A1 及 A2)	2009.10.19	• 施工單位未能提供安全培訓記錄	• 顧問已即時要求施工單位存檔有關記錄，建設單位於 11 月 10 日回應施工單位已將有關記錄存檔，並提供了施工單位的相關記錄副本。
3	西罨學校	2009.10.30	• 建設單位未能提供齊備的施工日誌、設計變更記錄、施工試驗記錄、竣工驗收記錄等	• 顧問已擬定補充提交有關資料的清單，要求川方跟進。 • 川方已於 2010 年 4 月提供補充資料。
4	旺蒼縣人民醫院	2009.12.21	• 施工單位未能提供工程開工報告，完整的圖紙會審記錄，材料設備進場清單，完整的施工日誌 • 監理單位未能提供實驗室的資質資料，監理旁站記錄及工程例會會議紀要	• 顧問已即時要求施工單位儘快存檔有關記錄。 • 川方已於 2010 年 3 月提供補充資料。
5	綿茂公路 (合同 A1)	2010.12.29	• 對天池大橋鋼筋焊接工程檢查了 5 個焊工的焊工資質證書，發規部分證書在持證者手上而未能提供。	• 顧問 3 月份檢查時，施工單位已提供了焊工資質證書。
6	儀隴縣婦幼保健院	2010.01.21	• 施工單位未能提供正式技術交底記錄及應急方案	• 顧問已即時擬定補充提交有關資料的清單，要求川方跟進。 • 在顧問提出要求後，川方已提供補充資料。
7	馬鞍中學	2010.03.02	• 施工單位未能提供水泥、砂石料等產品品質證明檔	• 顧問已即時擬定補充提交有關資料的清單，要求川方跟進。顧問會於下次檢查時跟進。
8	儀隴縣婦幼保健院	2010.03.02	• 施工單位未能提供樁基施工記錄、基礎工程隱蔽驗收記錄 • 施工單位須提供完整的工程進度計畫 • 施工單位安全施工記錄不齊全	• 顧問已即時擬定補充提交有關資料的清單，要求川方跟進。 • 在顧問提出要求後，川方已提供補充資料。
9	元壩區社會福利綜合服務中心	2010.03.04	• 施工單位未能提供建設工程開工審查表、辦理工程品質監督手續證明、建設工程施工許可證、工程開工報告	• 顧問已即時擬定補充提交有關資料的清單，要求川方跟進。 • 在顧問提出要求後，川方已提供補充資料。
10	嚴橋三九學校	2010.03.10	• 施工單位未能提供監測站就上蓋結構的檢測記錄	• 顧問已即時擬定補充提交有關資料的清單，要求川方跟進。顧問會於下次檢查時跟進。
11	玉井鄉中心小學	2010.03.23	• 施工單位未能提供工程開工報審表、建設工程施工許可證、工程開工報告	• 顧問已即時擬定補充提交有關資料的清單，要求川方跟進。顧問會於下次檢查時跟進。

序號	重建項目	日期	觀察要點	跟進工作
• (D) 工程進度				
1	省道 303(合同 YW2、YW3 及 YW4)	2009.10.15	• 9 月及 10 月份持續天雨造成沿線多處大量泥石流、飛石、河水上漲及河道堵塞等問題	• 建設單位及施工單位表示會調整設計，繞避嚴重泥石流及飛石路段，並且在旱季加大努動力追趕進度。
2	綿茂公路(合同 A1 及 A2)	2009.10.19	• 受持續天雨影響，導致泥石流及湖水上升及交通中斷 • 國慶前後停止了一切炸藥的供應，影響隧道挖掘工程進度 • 徵地拆遷進度較緩慢	• 建設單位於 2009.11.10 回應如下: – 10 月起降雨未產生新的地質災害； – 建設單位已制定及執行多項措施(如安排斜坡鞏固工程在 2010 年 5 月前基本完成施工等),以減少氣候和地質災害對項目的影響； – 施工單位已於 10 月 25 日領取炸藥，並全面展開隧道挖掘工程； • 建設單位繼續積極跟進綿竹市政府就徵地拆遷的工作進度。
3	蒼溪中學	2010.12.22	• 由於基礎設計變更，導致工期延誤約 5 個月	• 建設單位與施工單位表示會在修改設計方案批准後，加快施工進度儘量縮短延誤時間。

5. 資金管理

i) 管理機制

特區援建四川重建的資金管理工作，以項目為基礎，並按照《項目合作安排》中列明預算的里程碑時間表及資金需求，分期撥付至四川省政府的香港特區援建項目資金專戶。川方實行專戶管理和核算，專款專用，由專戶直接轉撥至省級項目的實施單位，或按實際進度分期轉撥至項目實施地的市（州）、縣政府所設立的援建資金專戶，支付當地的項目實施單位。

ii) 資金撥付

特區政府在 2009 年預先撥付首期資金之後，分期資金按照個別項目的實際進度撥付。至今，「支援四川地震災區重建工作信託基金」已就三個階段合共 151 個援建項目，共撥付 49.69 億港元予川方的特區資金專戶，佔特區援建項目預算資金的 57.9%。


iii) 監察措施

為確保特區援助資金用得其所，港方繼續強化監察措施；除了透過川港協調機制，監察援建資金撥付和使用，及由「獨立專業顧問」作技術檢查外，每年底川港雙方更會進行年度檢查和實地考察，以核實工程開支和進度，並檢視來年的工程計劃和預算。

川港雙方已在本年 2 月 3 日完成 2009 年的年度檢查及實地考察，並制定 2010 年全年所需的資金預算。經修訂後的撥付資金為 25.96 億元人民幣（折合約 29.55 億港元），約佔特區援建項目總承擔額的 35%。此外，川港雙方亦共同制訂《項目變更管理辦法》，建立法規和制度，控制資金使用，避免出現不規範或超支情況。

資金撥付情況（$億港元）

	已撥付川方金額			港方承擔額	已撥付百份比
	2009 年撥付	2010 年撥付	累計撥付		
基建	8.08	9.43	17.51	31.65	55.3%
臥龍	2.20	4.25	6.45	15.90	40.5%
教育	5.21	7.94	13.15	15.78	83.3%
社福	1.38	1.12	2.50	5.71	43.8%
醫療康復	3.27	6.81	10.08	16.79	60.0%
總計	**20.14**	**29.55**	**49.69**	**85.83**	**57.9%**

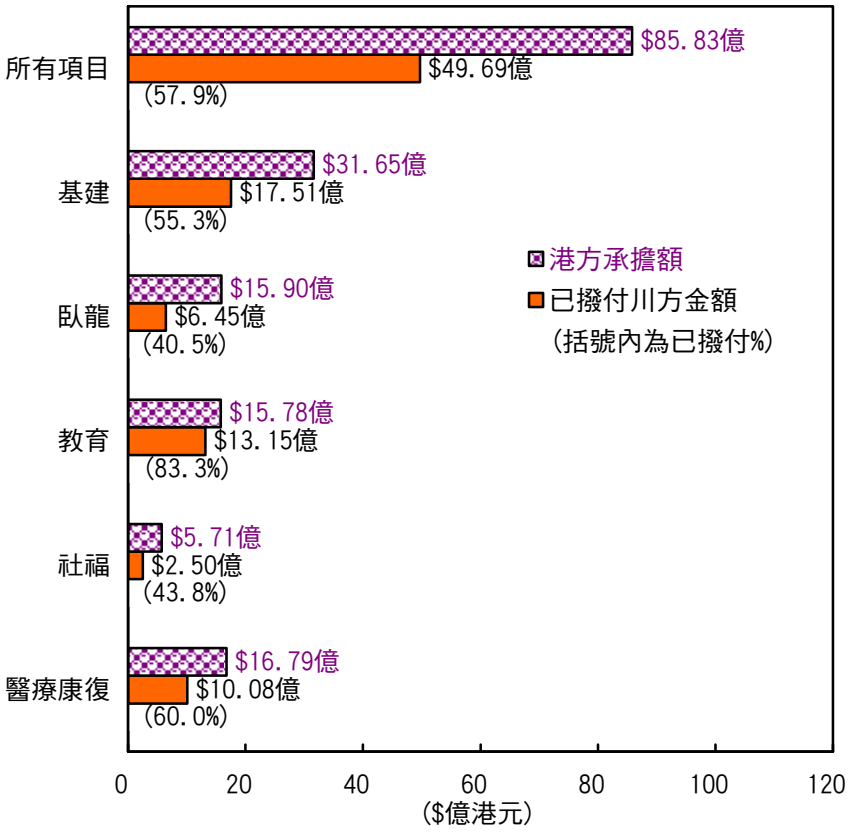

序號	市	縣區	階段	項目名稱	香港承擔額(¥億)	進度	頁[1]
基建							
1	阿壩	省道	一	省道 303 公路映秀至臥龍段	7.6560	施工	19
123	德陽 阿壩	綿竹 茂縣	三	綿茂公路	20.000	施工	20
臥龍自然保護區							
2	阿壩	臥龍	一	規劃編制專案	0.0654	竣工	21
21	阿壩	臥龍	二	都江堰大熊貓救護與疾病防控中心	0.9124	設計	22
22	阿壩	臥龍	二	災後電力能源恢復與重建	3.2546	施工	23
23	阿壩	臥龍	二	中國大熊貓研究中心	1.3327	設計	24
24	阿壩	臥龍	二	管理局辦公和職工工作用房	1.0443	設計	25
25	阿壩	臥龍	二	耿達一貫制學校	0.3998	施工	26
26	阿壩	臥龍	二	臥龍中心學校	0.2055	施工	27
27	阿壩	臥龍	二	醫療保健重建	0.2027	設計	28
28	阿壩	臥龍	二	臥龍社會福利院	0.0584	設計	29
29	阿壩	臥龍	二	垃圾處理和轉運系統	0.0836	設計	30
30	阿壩	臥龍	二	供排水設施恢復與新建	1.1118	設計	31
31	阿壩	臥龍	二	「五一棚」大熊貓野外生態觀察站重建	0.0845	設計	32
32	阿壩	臥龍	二	鄧生保護站	0.3730	設計	33
33	阿壩	臥龍	二	木江坪保護站			
34	阿壩	臥龍	二	三江保護站			
35	阿壩	臥龍	二	邛峽山系世界自然遺產地自然與地震博物館	0.5372	設計	34
36	阿壩	臥龍	二	巡護監測路網恢復重建	0.0457	設計	35
37	阿壩	臥龍	二	大熊貓棲息地植被恢復	1.1099	設計	36
38	阿壩	臥龍	二	道路交通設施恢復與新建	0.1111	設計	37
39	阿壩	臥龍	二	地質災害治理與防治	1.5467	設計	38
40	阿壩	臥龍	二	鄉土文化遺產災後恢復重建	0.2230	設計	39
41	阿壩	臥龍	二	標牌、標樁設施	0.0205	設計	40
42	阿壩	臥龍	二	"數字臥龍"系統工程	1.1371	設計	41
教育							
3	阿壩	汶川	一	水磨中學	0.5562	竣工	42
4	廣元	蒼溪	一	蒼溪中學校	0.6523	施工	43
5	綿陽	三台	一	三台縣第一中學	0.7737	施工	44
6	德陽	旌陽	一	德陽市第一小學	0.1481	施工	45
7	德陽	旌陽	一	華山路小學	0.1604	施工	46
43	德陽	旌陽	二	東汽小學	0.4310	施工	47
44	綿陽	遊仙	二	魏城鎮中心小學	0.3052	施工	48
45	綿陽	鹽亭	二	雲溪初級中學	0.3982	施工	49
46	南充	南部	二	南隆鎮一小	0.2710	施工	50
47	眉山	仁壽	二	寶飛鎮初級中學	0.0954	施工	51
48	眉山	彭山	二	青龍鎮初級中學	0.1460	施工	52
49	眉山	仁壽	二	書院路初級中學	0.1200	施工	53
50	雅安	雨城	二	興賢小學	0.1745	施工	54
51	雅安	寶興	二	隴東中學	0.0624	設計	55
52	雅安	寶興	二	蜂桶寨小學	0.1500	設計	56
53	雅安	寶興	二	五龍中心校	0.0585	設計	57
54	德陽	羅江	二	金山鎮一小	0.2734	施工	58
55	德陽	羅江	二	略平鎮小學	0.1636	施工	59
56	雅安	雨城	二	合江中心校	0.0568	施工	60
57	雅安	蘆山	二	隆興中心校	0.0864	施工	61
58	綿陽	梓潼	二	文昌初級中學	0.4654	施工	62
59	樂山	夾江	二	夾江中學	0.2038	施工	63
60	雅安	天全	二	仁義初級中學	0.0665	設計	64
61	雅安	天全	二	天全縣初級中學	0.3086	設計	65
62	雅安	天全	二	樂英初級中學	0.0886	設計	66
63	雅安	滎經	二	滎經中學	0.4375	設計	67
64	雅安	滎經	二	泗坪中學	0.0786	設計	68
65	雅安	雨城	二	嚴橋三九學校	0.0921	施工	69

[1]項目詳細資料在本報告內的頁數

序號	市	縣區	階段	項目名稱	香港承擔額(¥億)	進度	頁(1)
66	南充	高坪	二	涪江路小學	0.1531	施工	70
67	雅安	石棉	二	城北中學	0.1074	施工	71
68	雅安	石棉	二	小河壩中學	0.1044	施工	72
69	雅安	名山	二	永興鎮初級中學	0.1294	設計	73
70	巴中	巴州	二	巴中中學	0.3110	施工	74
71	巴中	巴州	二	巴州區第一小學	0.2239	施工	75
72	巴中	巴州	二	玉井中心小學	0.1468	施工	76
73	巴中	平昌	二	邱家小學	0.1200	施工	77
74	巴中	平昌	二	平昌縣第二中學	0.1885	施工	78
75	巴中	平昌	二	平昌中學	0.1898	施工	79
76	巴中	平昌	二	平昌縣實驗小學	0.1500	施工	80
77	巴中	通江	二	麻石鎮中心小學	0.1713	施工	81
78	巴中	通江	二	通江縣第二中學	0.3798	施工	82
79	南充	儀隴	二	馬鞍中學	0.0950	施工	83
80	南充	儀隴	二	新政初級中學	0.0960	施工	84
81	達州	通川	二	西罨學校	0.0813	施工	85
82	達州	通川	二	北外中心校	0.1050	施工	86
83	達州	渠縣	二	渠縣中學	0.1620	施工	87
85	雅安	石棉	二	石棉縣幼稚園	0.1116	施工	88
86	巴中	巴州	二	恩陽中學	0.4712	施工	89
87	巴中	巴州	二	巴州區第四中學	0.4845	施工	90
88	巴中	南江	二	朝陽中學	0.3180	施工	91
89	南充	南部	二	南部中學	0.4900	招標	92
90	綿陽	涪城	二	綿陽中學	0.7436	施工	93
91	南充	儀隴	二	儀隴中學	0.3600	施工	94
92	巴中	南江	二	小河職業中學	0.4600	施工	95
93	雅安	蘆山	二	蘆山縣初級中學	0.3137	施工	96
94	南充	高坪	二	白塔中學	0.3496	設計	97
社會福利綜合服務設施							
8	廣元	朝天	一	朝天區社會福利綜合服務中心	0.2998	施工	98
9	廣元	元壩	一	元壩區社會福利綜合服務中心	0.2989	施工	99
10	綿陽	遊仙	一	游仙區社會福利綜合服務中心	0.2554	施工	100
11	德陽	旌陽	一	德陽市社會福利綜合服務中心	0.4720	招標	101
95	廣元	旺蒼	二	旺蒼縣社會福利綜合服務中心	0.2974	施工	102
96	廣元	蒼溪	二	蒼溪縣社會福利綜合服務中心	0.2424	設計	103
97	德陽	羅江	二	羅江縣社會福利綜合服務中心	0.1732	施工	104
98	德陽	廣漢	二	廣漢市社會福利綜合服務中心	0.2400	施工	105
99	成都	大邑	二	大邑縣悅來敬老院	0.0778	施工	106
100	綿陽	江油	二	江油市殘疾人康復服務中心	0.1500	施工	107
101	德陽	綿竹	二	綿竹縣殘疾人康復服務中心	0.1200	施工	108
124	巴中	南江	三	南江縣殘疾人康復服務中心	0.1107	設計招標	109
125	成都	大邑	三	大邑縣殘疾人康復服務中心	0.1200	設計招標	110
126	成都	崇州	三	崇州市殘疾人康復服務中心	0.1200	設計招標	111
127	阿壩	九寨	三	九寨溝縣殘疾人康復服務中心	0.0593	設計招標	112
128	阿壩	小金	三	小金縣殘疾人康復服務中心	0.0593	設計招標	113
129	阿壩	松潘	三	松潘縣殘疾人康復服務中心	0.0593	設計招標	114
130	阿壩	茂縣	三	茂縣殘疾人康復服務中心	0.0732	設計招標	115
131	阿壩	理縣	三	理縣殘疾人康復服務中心	0.0593	設計招標	116
132	阿壩	黑水	三	黑水縣殘疾人康復服務中心	0.0593	設計招標	117
133	南充	閬中	三	閬中市殘疾人康復服務中心	0.1376	設計招標	118
134	雅安	石棉	三	石棉縣殘疾人康復服務中心	0.0732	設計招標	119
135	雅安	漢源	三	漢源縣殘疾人康復服務中心	0.1200	設計招標	120

序號	市	縣區	階段	項目名稱	香港承擔額(¥億)	進度	頁(1)
136	雅安	寶興	三	寶興縣殘疾人康復服務中心	0.0593	設計招標	121
137	雅安	蘆山	三	蘆山縣殘疾人康復服務中心	0.0691	設計招標	122
138	綿陽	三台	三	三台縣殘疾人康復服務中心	0.1376	設計招標	123
139	綿陽	北川	三	北川縣殘疾人康復服務中心	0.1262	設計招標	124
140	綿陽	平武	三	平武縣殘疾人康復服務中心	0.0732	設計招標	125
141	綿陽	安縣	三	安縣殘疾人康復服務中心	0.1200	設計招標	126
142	綿陽	梓潼	三	梓潼縣殘疾人康復服務中心	0.1107	設計招標	127
143	綿陽	涪城	三	涪城區殘疾人康復服務中心	0.1200	設計招標	128
144	綿陽	鹽亭	三	鹽亭縣殘疾人康復服務中心	0.1107	設計招標	129
146	廣元	劍閣	三	劍閣縣殘疾人康復服務中心	0.1200	設計招標	130
147	德陽	中江	三	中江縣殘疾人康復服務中心	0.1500	設計招標	131
148	德陽	旌陽	三	旌陽區殘疾人康復服務中心	0.1200	設計招標	132
醫療康復							
12	廣元	朝天	一	朝天區中醫院	0.2378	施工	133
13	廣元	旺蒼	一	旺蒼縣人民醫院	0.3600	施工	134
14	廣元	元壩	一	元壩區人民醫院	0.1343	施工	135
15	綿陽	梓潼	一	梓潼縣人民醫院	0.6228	施工	136
16	綿陽	鹽亭	一	鹽亭縣中醫院	0.1985	施工	137
17	德陽	旌陽	一	德陽市第二人民醫院（一期）	0.7701	施工	138
18	德陽	旌陽	一	旌陽區中醫院（人民醫院）	0.2998	施工	139
19	德陽	廣漢	一	廣漢市人民醫院	0.2460	施工	140
20	成都	成都	一	四川省人民醫院川港康復科技綜合大樓	2.2454	招標	141
102	廣元	朝天	二	朝天區人民醫院	0.5545	施工	142
103	廣元	旺蒼	二	旺蒼縣中醫院	0.3955	施工	143
104	廣元	元壩	二	元壩區中醫院	0.1249	施工	144
105	綿陽	鹽亭	二	鹽亭縣人民醫院	0.9650	施工	145
106	德陽	旌陽	二	德陽市中西醫結合醫院	0.3149	施工	146
107	德陽	羅江	二	羅江縣中醫院	0.0761	施工	147
108	綿陽	涪城	二	涪城區吳家鎮中心衛生院	0.0525	施工	148
109	綿陽	三台	二	三台縣中醫院	0.3500	施工	149
110	綿陽	梓潼	二	梓潼縣中醫院	0.4307	施工	150
112	雅安	滎經	二	滎經縣人民醫院	0.2400	設計	151
113	雅安	名山	二	名山縣人民醫院	0.4220	設計	152
114	雅安	名山	二	百丈中心衛生院	0.0482	設計	153
115	南充	儀隴	二	儀隴保健院	0.0905	施工	154
116	眉山	仁壽	二	仁壽縣精神衛生保健院	0.1400	施工	155
117	達州	宣漢	二	宣漢縣醫院	0.3500	施工	156
118	資陽	樂至	二	石湍中心衛生院	0.0773	施工	157
119	巴中	平昌	二	平昌縣人民醫院	0.2898	施工	158
120	巴中	南江	二	南江縣人民醫院	0.4725	施工	159
121	德陽	旌陽	二	德陽市東汽職工（市六）醫院	1.1570	施工	160
122	德陽	旌陽	二	德陽市第二人民醫院（二期）	0.4529	施工	161
149	雅安	雨城	三	雅安市中醫院	0.4596	設計	162
150	雅安	雨城	三	雅安市婦幼保健院	0.1240	設計	163
151	成都		三	華西醫院遠端醫療網路平臺	0.5660	設計	164
152	綿陽	涪城	三	綿陽市中心醫院	0.4000	設計	165
153	綿陽	涪城	三	綿陽市中醫院	0.8700	設計	166
154	綿陽	涪城	三	綿陽市婦幼保健院	0.1400	設計	167

省道 303 線映秀至臥龍段公路恢復重建工程

序號： 1

地點： 阿壩州汶川縣映秀至臥龍

估算： 8 億 119 萬元人民幣

(香港承擔 7 億 656 萬元人民幣)

受災情況

省道 303 線映秀至臥龍段公路是通往四川省臥龍特區的「生命通道」，5・12 四川汶川大地震對該段公路造成了極其嚴重的破壞

重建規模

- 路基工程：新建及修復 45 km 道路
- 橋樑工程：新建 9 座橋樑及加固現有橋樑
- 隧道工程：新建 2 條隧道及加固現有隧道
- 明洞及涵洞建設，主、被動防護網等

目標受惠對象

臥龍特別行政區近 6,000 名居民。重建有助提高對基本生活物質運輸的保障，並促進該區域未來經濟社會發展和滿足未來交通的需求，有助促進阿壩州旅遊業和社會經濟發展的發展



路線圖



受災情況



受災情況

預計竣工

2011 年 7 月

最新進度

施工中：公路路基已完成 92%



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2010 年 2 月

綿茂公路漢旺至牛圈溝段恢復重建工程

序號： 123

地點： 德陽阿壩公路綿竹至茂縣段

估算： 21 億 6,000 萬元人民幣
(香港承擔 20 億元人民幣)

受災情況

5.12 汶川大地震令茂縣至綿竹漢旺鎮僅有通道受到嚴重破壞。公路被嚴重毀壞或淹埋，橋樑垮塌

重建規模

- 路基工程：新建及修復 44 km 道路
- 橋樑工程：新建 39 座橋樑及加固 4 座現有橋樑
- 隧道工程：新建 7 條隧道
- 明洞及涵洞建設，主、被動防護網等

目標受惠對象

漢旺、茂縣和沿線鄉縣超過 188,000 居民



平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工

2012 年 8 月

最新進度

施工中：一期工程完成第一個里程碑，二期工程正進行招投標工作



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2010 年 2 月

臥龍自然保護區
規劃編制方案

序號： 2

地點： 臥龍自然保護區

估算： 653 萬 5 千元人民幣

受災情況


臥龍自然保護區 98%的民房被毀，基礎設施、醫療衛生和學校等都受到嚴重破壞。大熊貓科研和圈養設施、野外大熊貓監測及保護設施等都嚴重受損。山體滑坡和泥石流令原有植物大面積喪失，影響大熊貓棲息地

重建規模

按《汶川地震災後恢復重建總體規劃》的要求，進行“臥龍保護區規劃” 的編制，包括臥龍災後重建城鄉規劃和重建項目的可行性研究


目標受惠對象

規劃整個臥龍自然保護區 2,000 平方公里範圍內野生動植物資源的保護，區內近 6,000 居民的社區，以及保護區的長遠發展

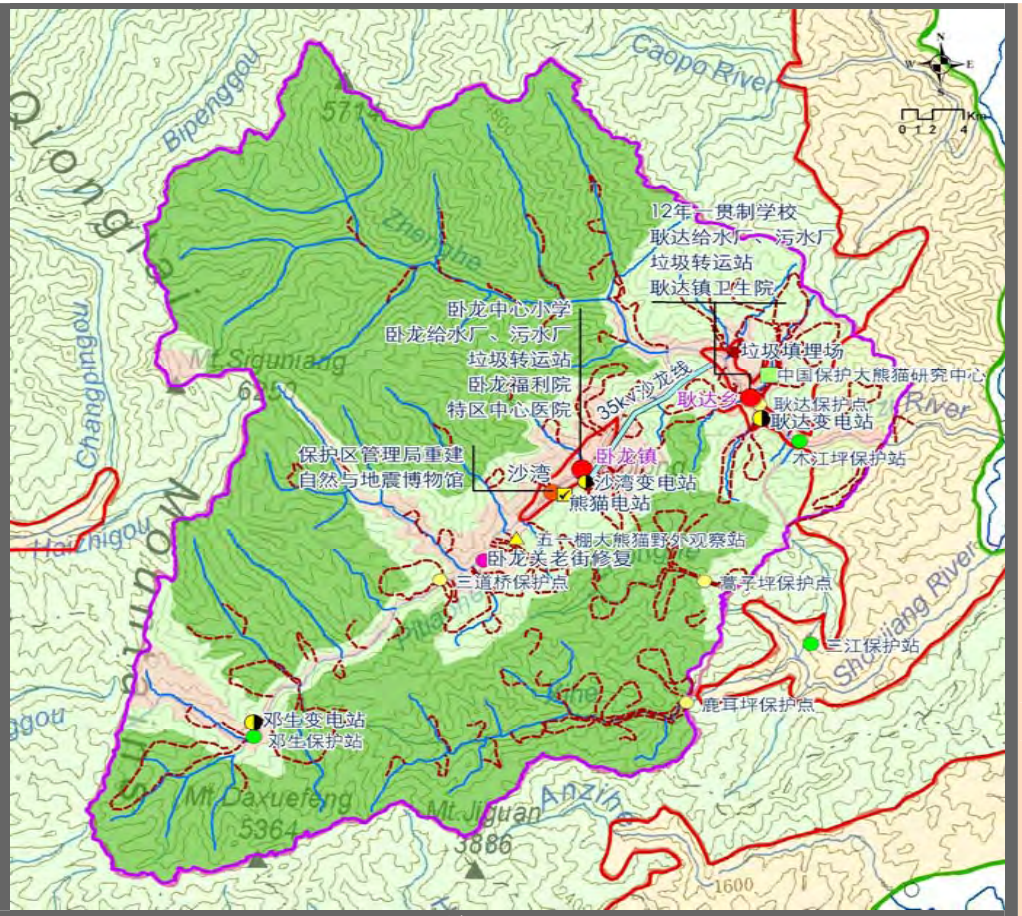

總平面圖


生態旅遊規劃圖

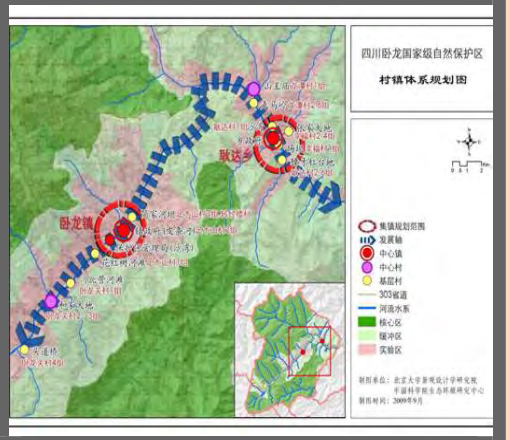

村鎮體系規劃圖

預計竣工

2009 年 12 月

最新進度

已完成

都江堰大熊貓救護與疾病防控中心

序號： 21

地點： 都江堰市青城山鎮石橋村

估算： 9,124 萬元人民幣

受災情況

臥龍大熊貓科研設施嚴重破壞；通往研究中心飼養場的橋樑受損嚴重；飼養場大門通道被垮塌的巨石和泥土堵死。山體滑坡使 32 套大熊貓圈舍中的 14 套被掩埋或被毀壞；18 套圈舍受損嚴重；大熊貓醫院成為危房

重建規模

- 總建築面積: 約 10,785 m^2
- 研究實驗室和獸醫院
- 熊貓圈舍
- 基礎配套設施
- 監控監測與科學研究儀器設備
- 遊客中心
- 後勤保障

目標受惠對象

作為科學研究基地，供中國和海外研究人員進行大熊貓疾控科研，同時減低大熊貓核心種群，被疾病交叉感染的風險，有利於整個種群的安全和發展



總平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2011 年 12 月

最新進度

設計中

災後電力能源恢復與新建

序號： 22

地點： 臥龍自然保護區耿達鄉、臥龍鎮

估算： 3 億 2,546 萬元人民幣

受災情況


所有電站癱瘓、輸配電網路毀壞、給排水管綫、設施及水源都造成很大的破壞。當地生產、生活造成嚴重困難。災後只能恢復 70%電力

重建規模

- 熊貓水電站
- 35 千伏變電站 4 座
- 35 千伏綫路 5 條
- 電力調度中心及辦公用房
- 10 千伏綫路 7 條
- 配變台區 28 個（總容量 18850KVA）
- 400 伏低壓線路 112.45 公里
- 表箱 1,949 戶
- 修復生態電站和沙灣電站

目標受惠對象

區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客

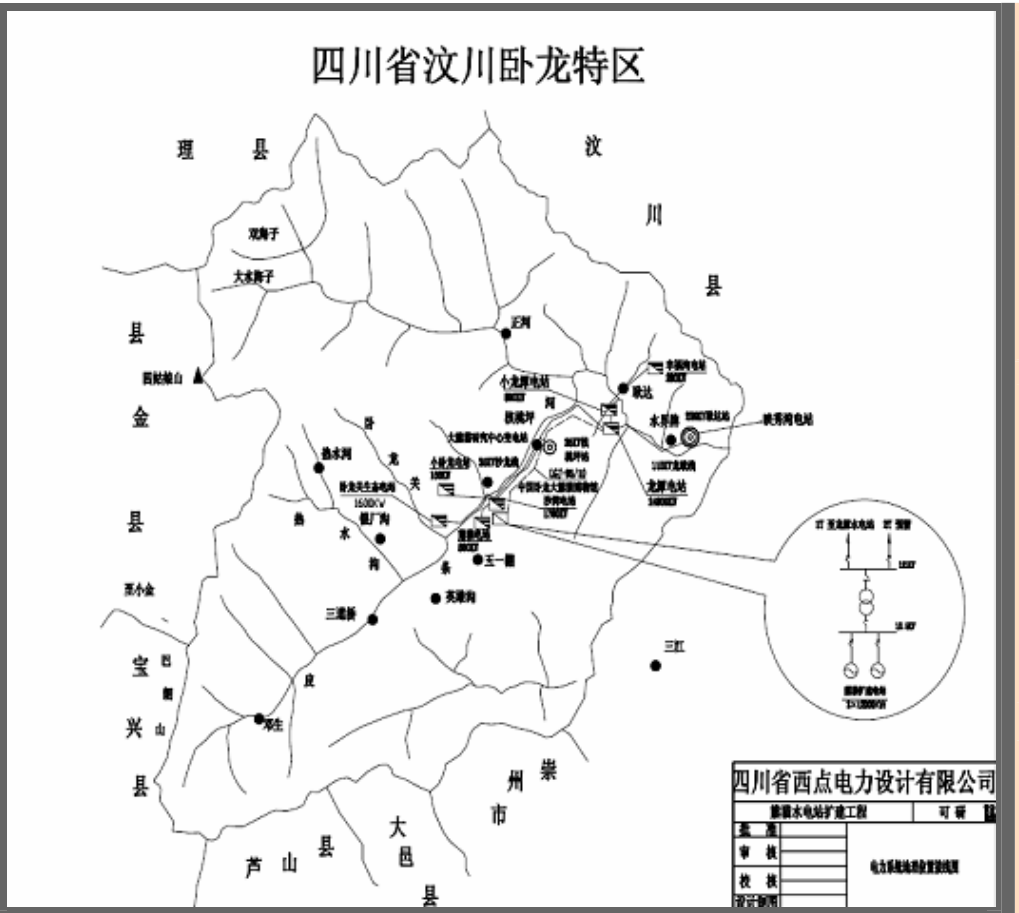

總平面圖



皮條河熊貓水電站樞紐佈置圖



熊貓水電站選址

預計竣工

2012 年 7 月

最新進度

施工中：10 千伏輸配電網於 4 月 19 日動工。

設計中：35 千伏及其他

中國保護大熊貓研究中心

序號： 23
地點： 臥龍自然保護區耿達鄉
估算： 1 億 3,327 萬元人民幣

受災情況

臥龍大熊貓科研設施嚴重破壞；通往研究中心飼養場的橋樑受損嚴重；飼養場大門通道被垮塌的巨石和泥土堵死。山體滑坡使 32 套大熊貓圈舍中的 14 套被掩埋或被毀壞；18 套圈舍受損嚴重。大熊貓醫院成為危房

重建規模

- 總建築面積: 13,808 m^2
- 人工繁育飼養研究與環境教育區，包括獸醫院、科研中心、博物館和遊客中心
- 大熊貓野化過渡培訓區
- 大熊貓野化培訓區

目標受惠對象

作為科學研究基地，供中國和海外研究人員進行保育大熊貓科研，及作為自然保護教育基地，供每年約 40 萬人次遊客到訪



總平面圖


鳥瞰圖


遊客中心效果圖

預計竣工
2011 年 12 月

最新進度
設計中

管理局辦公與職工工作用房

序號： 24

地點： 臥龍自然保護區耿達鄉、臥龍鎮

估算： 1 億 443 萬元人民幣

受災情況


辦公用房和職工工作用房在地震中被徹底破壞

重建規模

- 辦公樓：2,648 m^2
- 職工工作用房： 20,950 m^2 (臥龍鎮沙灣及耿達鄉)
- 維修加固： 3,830 m^2 (臥龍鎮沙灣)

目標受惠對象

臥龍自然保護區管理局，職工編制人員約 477 人

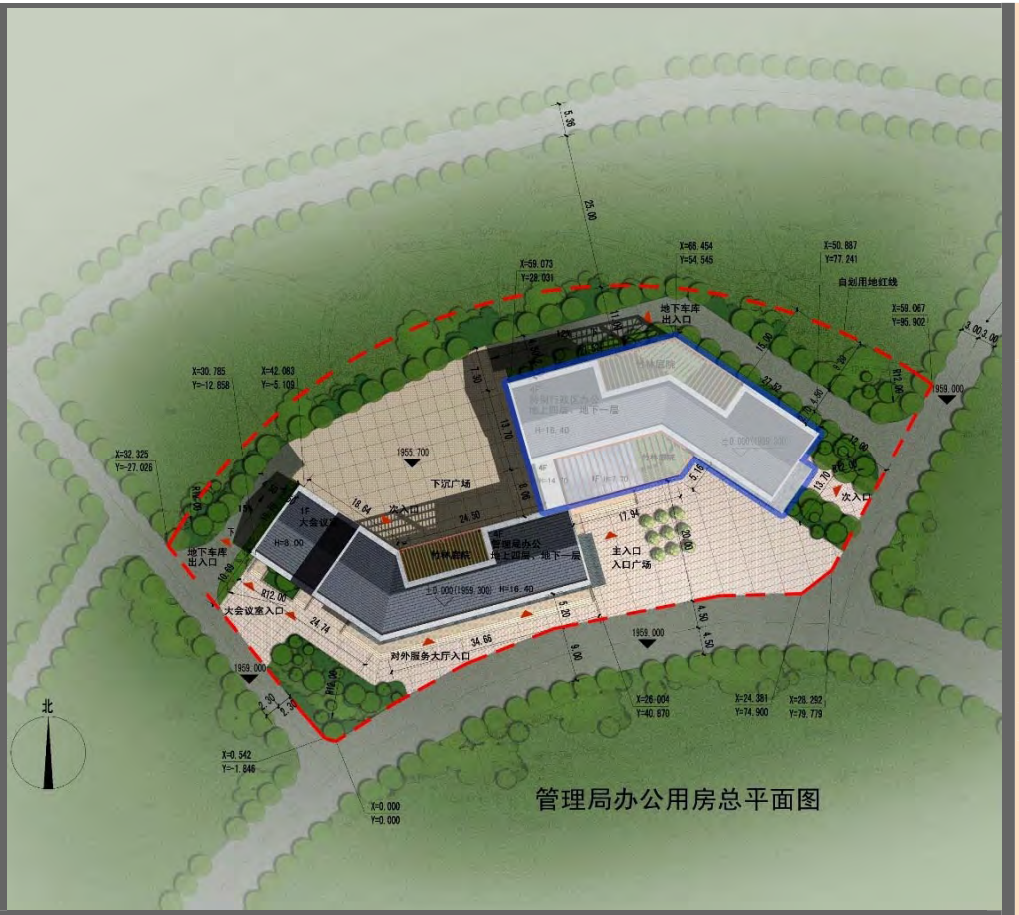

總平面圖



辦公樓鳥瞰圖



工作用房鳥瞰圖

預計竣工

2011 年 6 月

最新進度

設計中

耿達一貫制學校

序號： 25

地點： 臥龍自然保護區耿達鄉

估算： 3,998 萬元人民幣

受災情況


- 原耿達小學 1,815 m^2 校舍被列為危房
- 480m^2 校舍倒塌

重建規模

- 中學教學樓：2,790 m^2
- 中學宿舍：2,002 m^2
- 小學教學樓：2,360 m^2
- 小學宿舍：1,494 m^2
- 學前部：513m^2
- 食堂：1,326 m^2
- 行政綜合樓：910 m^2
- 室內體育室：900 m2

目標受惠對象

區內約 1,000 適齡學生

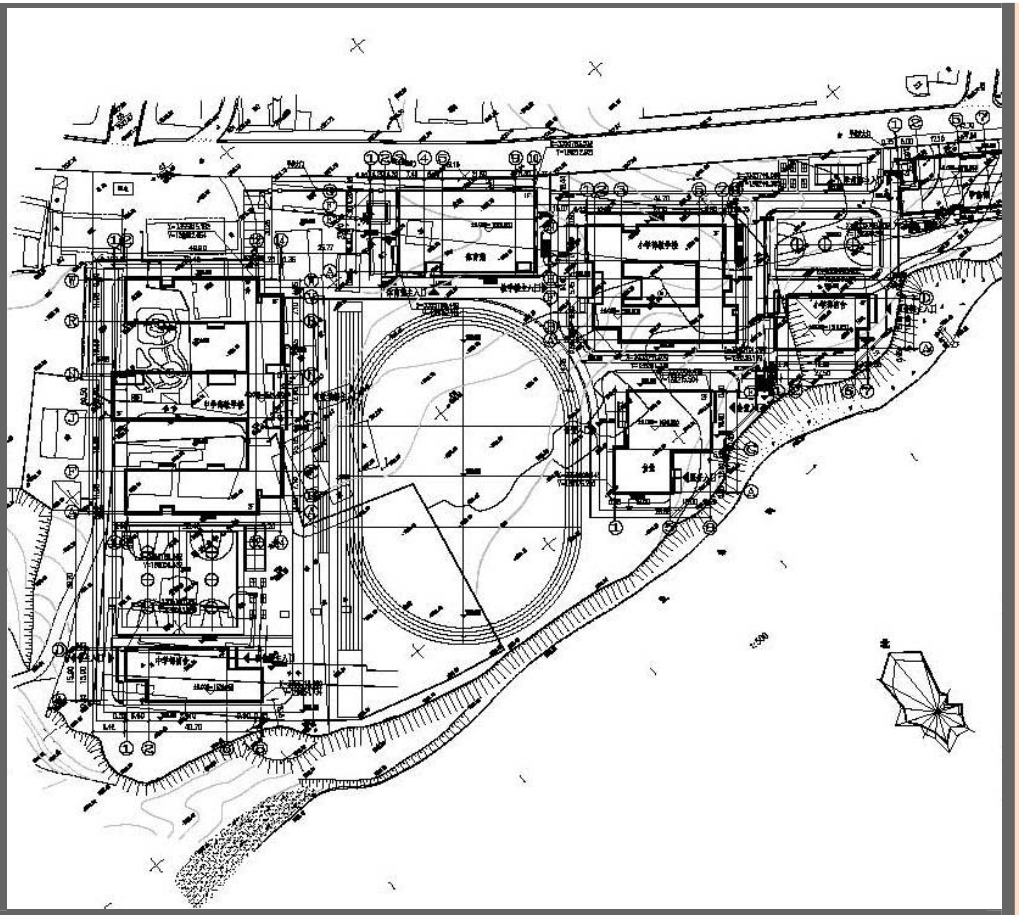

總平面圖



鳥瞰圖



建築群效果圖

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：工程於 2010 年 5 月開展

臥龍鎮中心小學校

序號： 26

地點： 臥龍自然保護區臥龍鎮

估算： 2,055 萬元人民幣

受災情況


- 原臥龍中心小學 1,983 m^2 校舍被列危房

重建規模

- 行政辦公綜合樓：800 m^2
- 教學樓：1,330 m^2
- 學前班樓：502 m^2
- 食堂及多功能廳：1,120m^2
- 宿舍樓：1,524 m^2

目標受惠對象

區內約 1,000 適齡學童

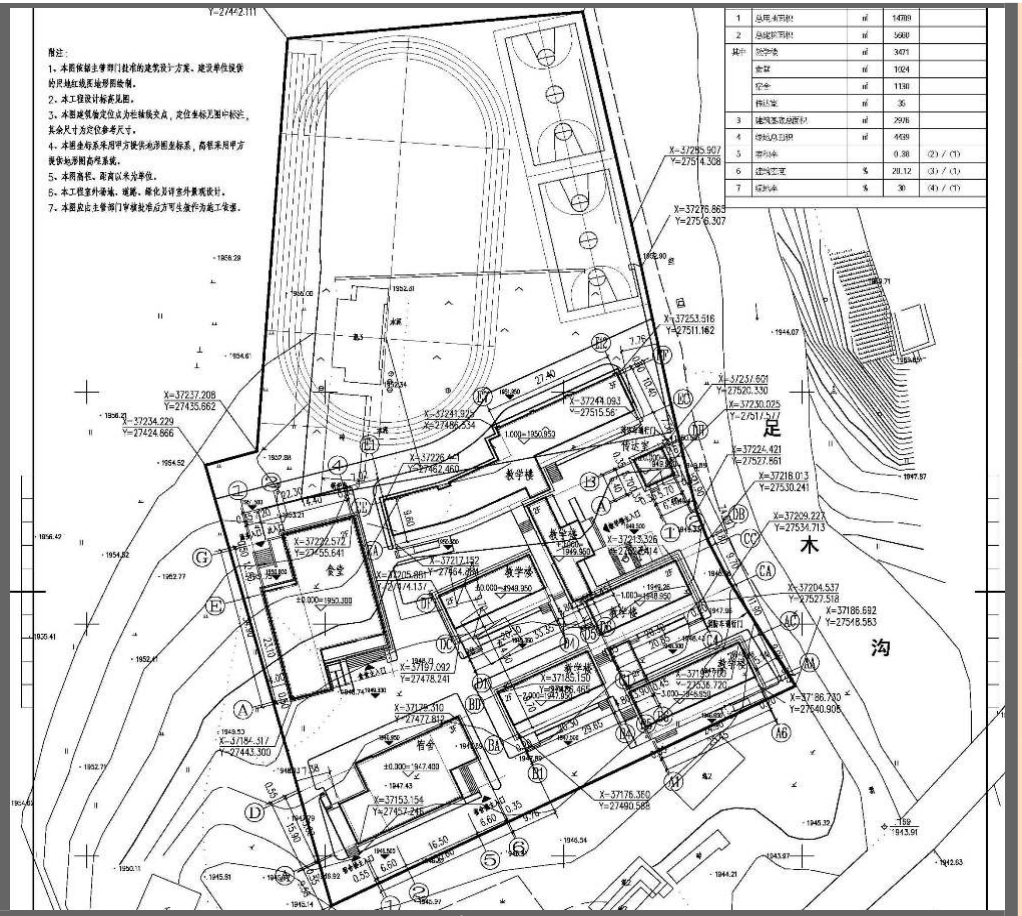

總平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：工程於 2010 年 5 月開展

醫療保健重建

序號： 27

地點： 臥龍自然保護區耿達鄉、臥龍鎮

估算： 2,027 萬元人民幣

受災情況


全部醫療衛生機構的房屋全部倒塌或受損，成為危房

重建規模

- 臥龍中心醫院：2,000 m^2
- 耿達鄉衛生院：1,800 m^2

目標受惠對象

區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客

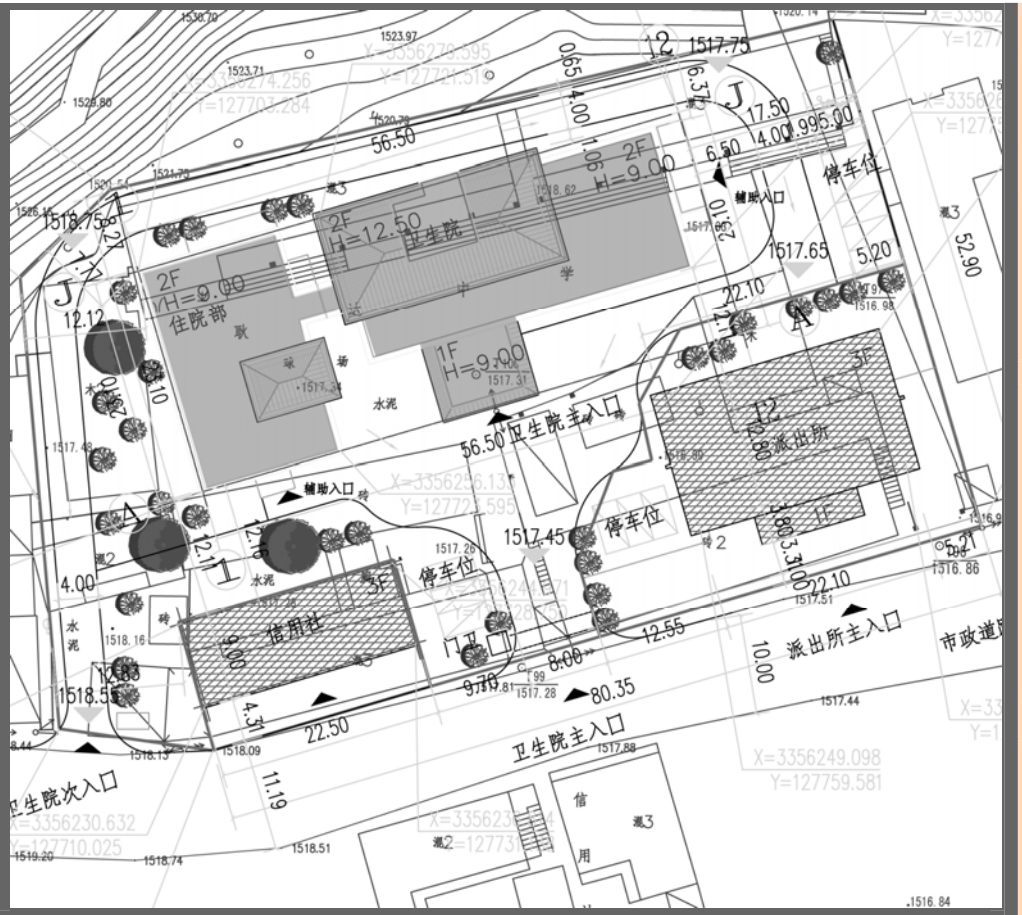

耿達衛生院 總平面圖



臥龍中心醫院 鳥瞰圖



耿達衛生院 鳥瞰圖

預計竣工

2011 年 5 月

最新進度

設計中：預計於 2010 年 5 月底招標

臥龍鎮社會福利院

序號： 28

地點： 臥龍自然保護區臥龍鎮

估算： 584 萬元人民幣

受災情況


臥龍自然保護區 98%的民房被毀，基礎設施. 、醫療衛生和學校等都受到嚴重破壞。地震後，區內就業量相對較小，青年勞動力往外輸送，造成老年人無人照顧。受傷的人員安置需求增加

重建規模

辦公、住宿樓一幢：1,591 m^2

目標受惠對象

區內無人照顧的老年人和地震造成的傷殘人員

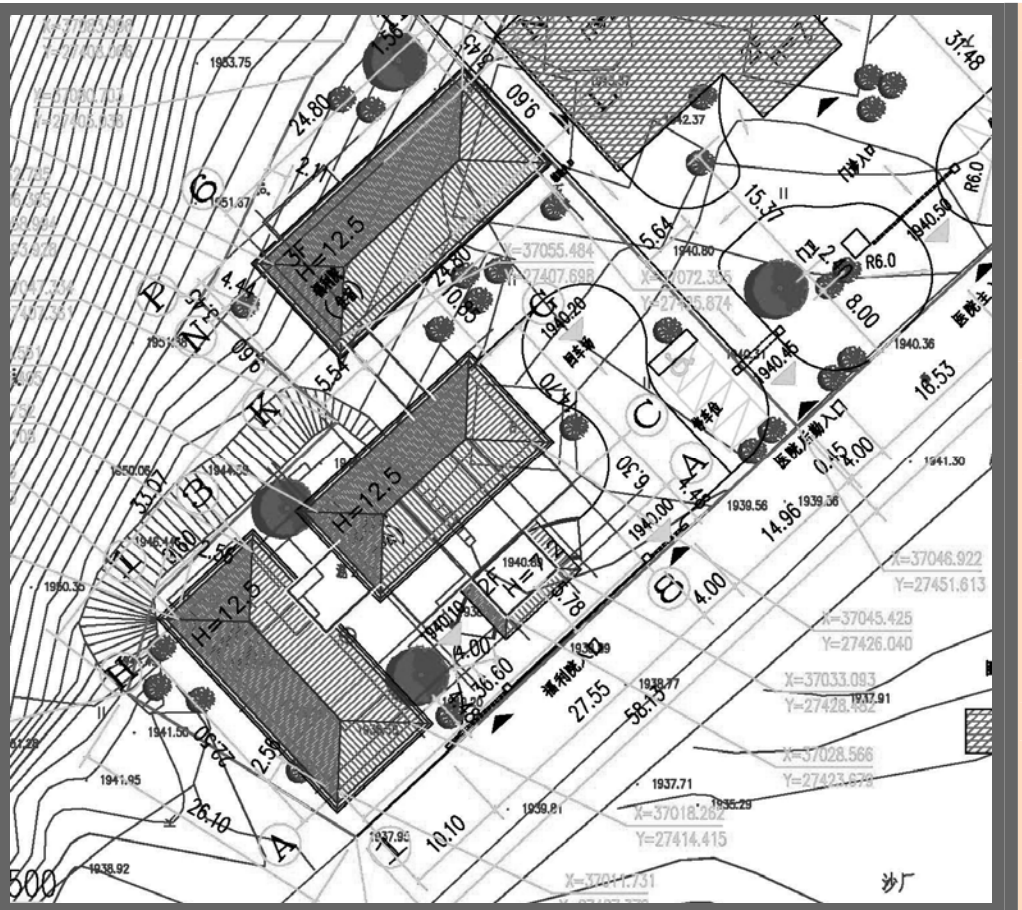

總平面圖





福利院效果圖

預計竣工

2011 年 5 月

最新進度

設計中：預計於 2010 年 5 月底招標

垃圾處埋和轉運系統

序號： 29

地點： 臥龍自然保護區耿達鄉、臥龍鎮

估算： 836 萬元人民幣

受災情況

臥龍自然保護區 98%的民房被毀，基礎設施.、醫療衛生和學校等都受到嚴重破壞。臥龍重建後，將成為國際生態旅遊目的地；原有的垃圾處理方式遠遠達不到自然保護區建設的要求，必須對區內的垃圾進行徹底安全的處理，回收廢物，促進資源再利用

重建規模


- 建立垃圾收集系統及中轉站，採用垃圾壓縮車轉運至區外
- 垃圾分類收集。合理配置垃圾中轉站以及垃圾運輸設備

目標受惠對象

區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客



總平面圖

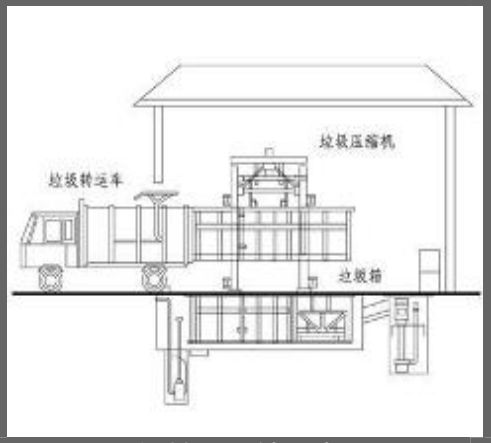

垃圾轉運系統示意圖



大英溝選址

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

設計中

供排水設施恢復與重建

序號： 30

地點： 臥龍自然保護區耿達鄉、臥龍鎮

估算： 1 億 1,118 萬元人民幣

受災情況

臥龍自然保護區給水設施、排水設施遭受巨大破壞

重建規模

給水部分：

- 耿達鄉給水廠新建工程
- 臥龍沙灣給水廠修復改造升級工程
- 臥龍鎮給水廠新建工程
- 耿達鄉給水配水管網工程
- 沙灣配水管網工程
- 臥龍鎮配水管網工程

排水部分：

- 耿達鄉污水廠升級改造工程
- 臥龍鎮污水廠工程
- 耿達鄉污水收集管網
- 臥龍鎮污水收集管網

供暖部分：


- 管理局機關供暖工程

目標受惠對象

區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客



總平面圖

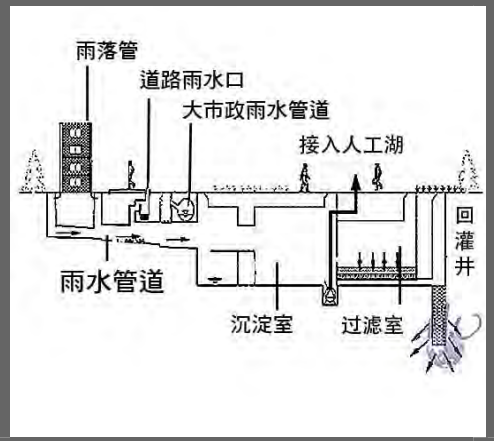

供排水系統示意圖



足木溝水廠選址圖

預計竣工

2012 年 12 月

最新進度

設計中

五一棚大熊貓野外生態觀察站

序號： 31

地點： 臥龍自然保護區

估算： 845 萬元人民幣

受災情況


五一棚大熊貓野外生態觀察站到嚴重損害。周邊的基礎設施管網和道路也多處受到泥石流的沖毀。損毀阻礙科研人員的研究，對例行的野外巡護和觀察工作帶來困難

重建規模


- 生活及辦公用房：740 m^2
- 修復加固庫房：80 m^2
- 修復道路：742 m^2

目標受惠對象


國內外野生動物保護科研人員

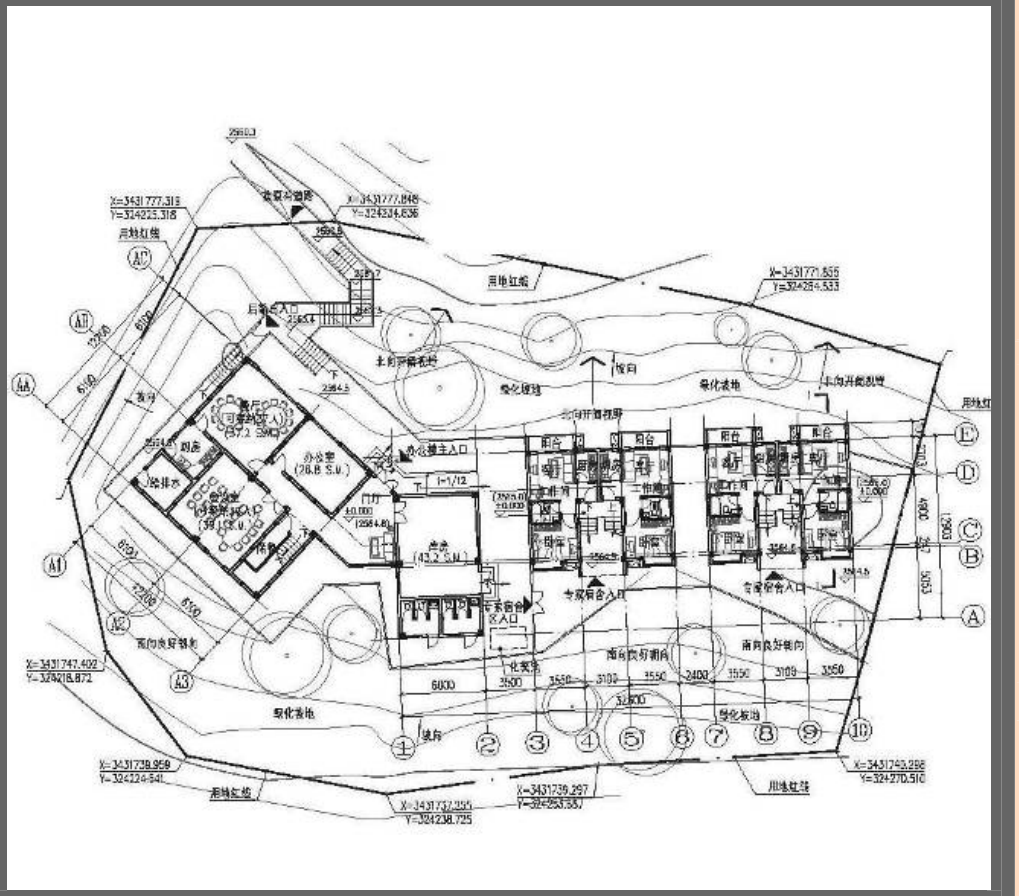

平面圖

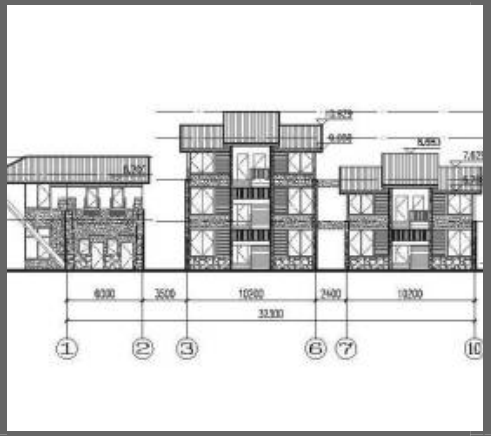

立面圖

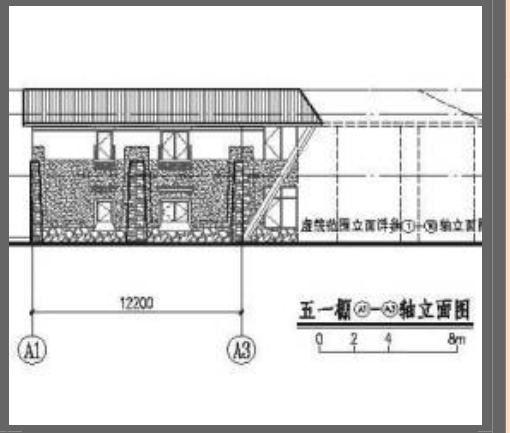

立面圖

預計竣工

2011 年 8 月

最新進度

設計中

鄧生、木江坪、三江基層保護站(點)重建

序號： 32-34

地點： 臥龍自然保護區及汶川縣三江鄉

估算： 3,730 萬元人民幣

受災情況


基層保護站損毀嚴重。工作環境的基礎設施和儀器設備等全部被毀

重建規模

- 鄧生保護站（含巴郎山保護點）2,190 m^2
- 木江坪保護站（含耿達保護點）：1,930 m^2
- 三江保護站（含蒿子坪和鹿爾坪保護點）:2,340 m^2

目標受惠對象


國內外野生動物保護科研人員

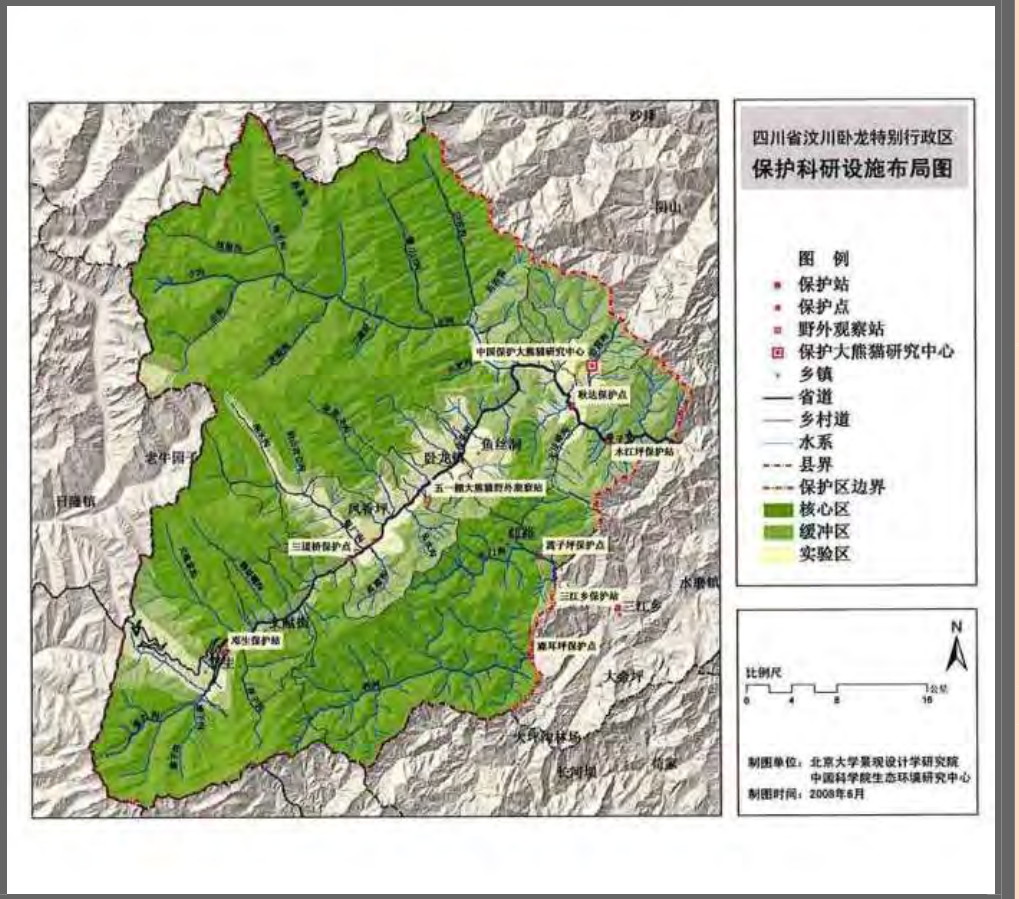

位置圖



木江坪保護站 受災情況

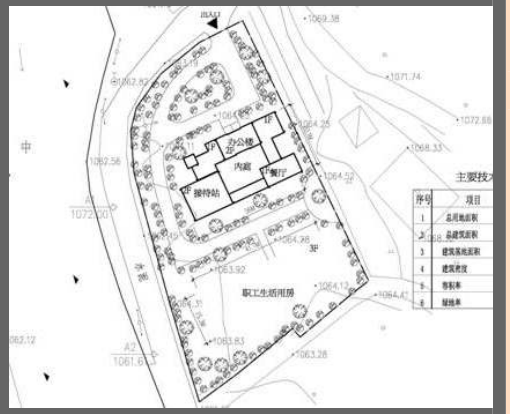

三江保護站 平面圖

預計竣工

2011 年 8 月

最新進度

設計中

邛崍山系世界自然遺產地自然與地震博物館

序號： 35
地點： 臥龍自然保護區臥龍鎮
估算： 5,372 萬元人民幣

受災情況

自然與地震博物館的破壞被鑒定為 ASU 級，不影響整體承載。需按照新的抗震設防標準進行維修與加固，改造與裝飾

重建規模

- 博物館外牆裝修: 6,470 m^2
- 博物館內部改造（包括室內地面、立面和天花板): 20,000 m^2
- 博物館展覽區展臺設計與佈置: 3,650 m^2
- 工作區佈置: 640 m^2
- 配套設備的配置及室外工程的修復

目標受惠對象

為區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客提供展覽與教育場所，促進國內外訪客對自然科學與地震災害的認識



位置圖


現時外觀


效果圖

預計竣工
2012 年 4 月

最新進度
設計中

巡護監測路網恢復重建

序號： 36

地點： 臥龍自然保護區

估算： 457 萬元人民幣

受災情況


保護區巡護綫路遭滑坡、崩塌、泥石流嚴重損毀

重建規模

- 新建及復修 94 條巡護綫路巡護綫路 (總長 568km)
- 新建 32 個巡護人員休息站
- 修復原有巡護人員休息站

目標受惠對象

國內外野生動物保護科研人員

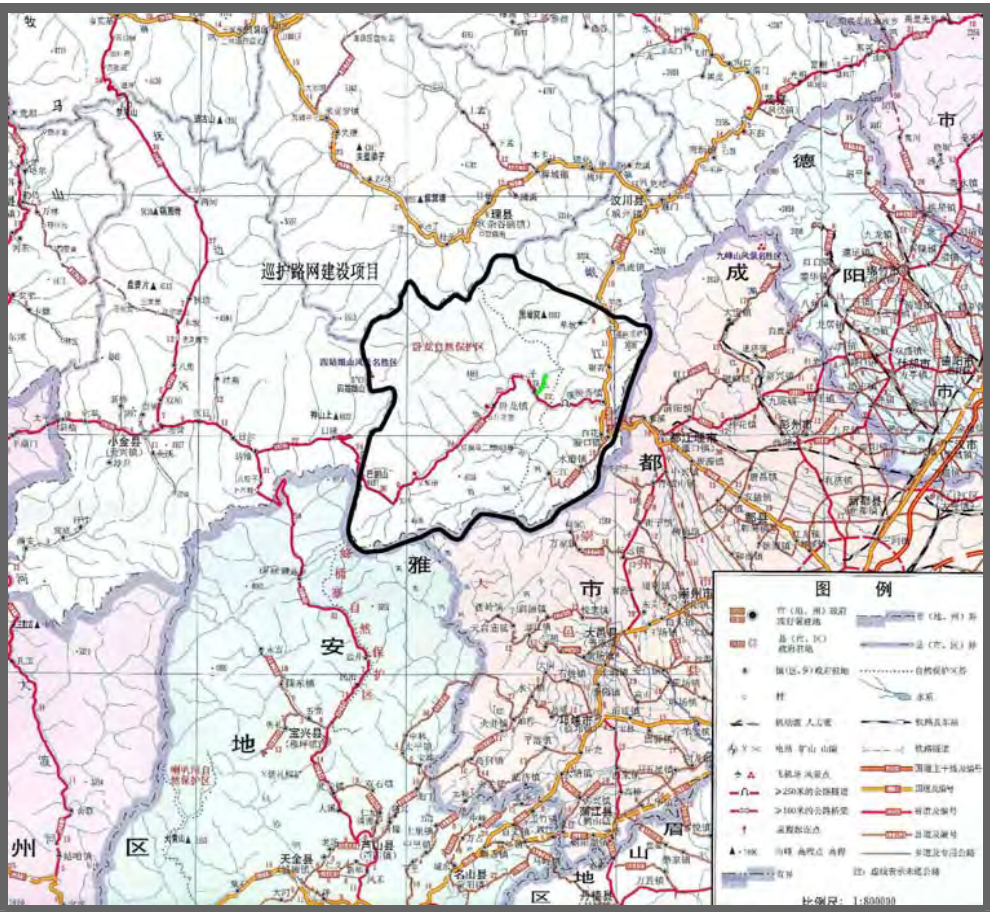

位置圖



五一棚附近 野外巡護路網



路線佈置圖

預計竣工

2011 年 12 月

最新進度

設計中

大熊貓棲息地植被恢復

序號： 37

地點： 臥龍自然保護區

估算： 1 億 1,099 萬元人民幣

受災情況


臥龍自然保護區植被喪失。低海拔地區竹子出現大面積死亡。大熊貓棲息地破壞面積 6,388 公頃 (約佔臥龍保護區面積的 3%)

重建規模


- 人工促進棲息地自然恢復：2,404 公頃
- 人工植苗恢復：1,872 公頃（其中含大熊貓可食竹恢復面積 119 公頃）
- 設鄉土樹種苗圃地 1 個：1.375 公頃

目標受惠對象

讓野生大熊貓得以棲息繁衍，促進生物多樣性和世界自然遺產保護

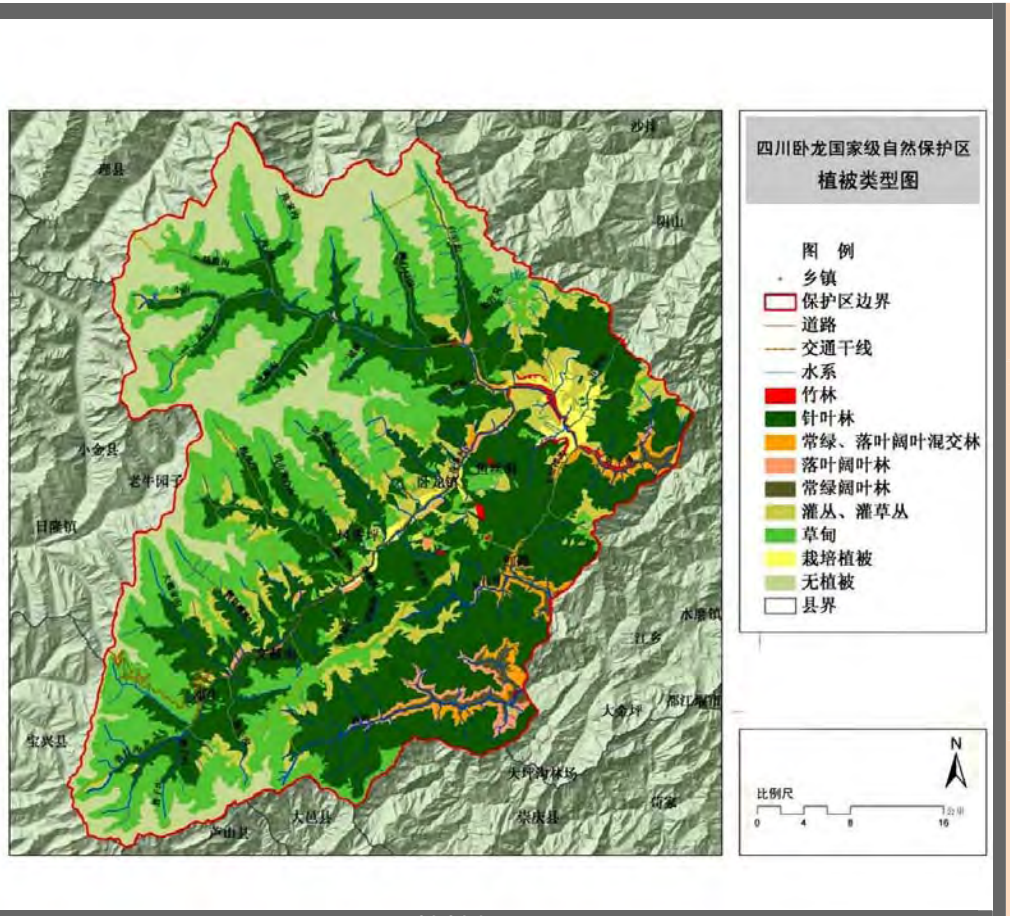

植被類型圖

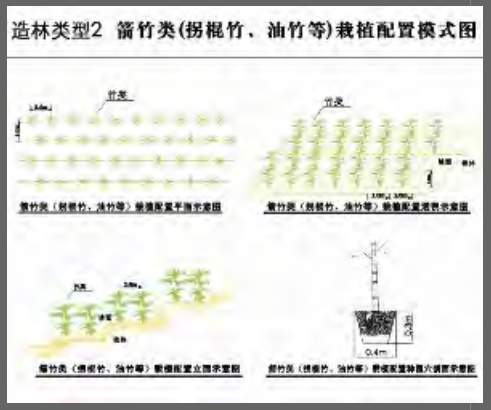

造林類型示意圖 – 箭竹類



造林類型效果圖 – 針葉與闊葉樹

預計竣工

2012 年 5 月

最新進度

設計中

道路交通設施恢復與新建

序號： 38

地點： 臥龍自然保護區

估算： 1,164 萬元人民幣
(香港承擔 1,111 萬元人民幣)

受災情況


由於距離震中僅 7 公里，道路被嚴重掩埋或損毀，原路基無法再用

重建規模


重建道路 8.13 km，包括路面工程及排水及防護工程

目標受惠對象

區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客

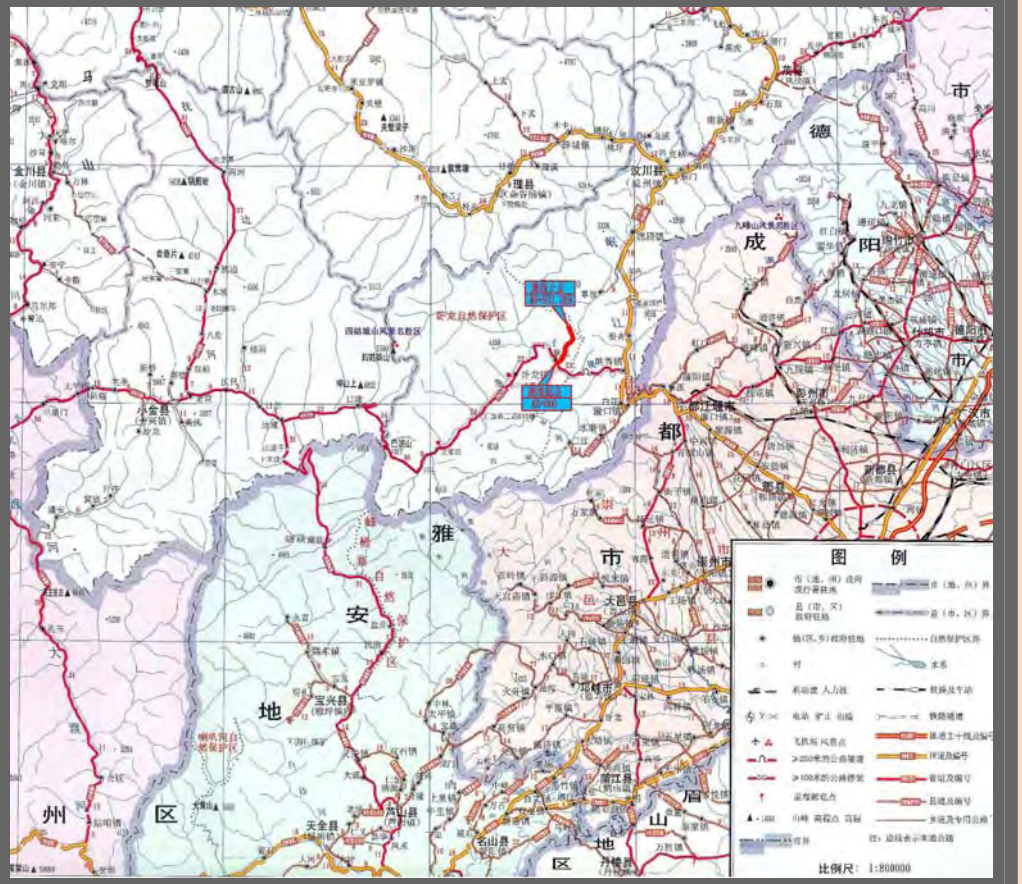

地理位置圖

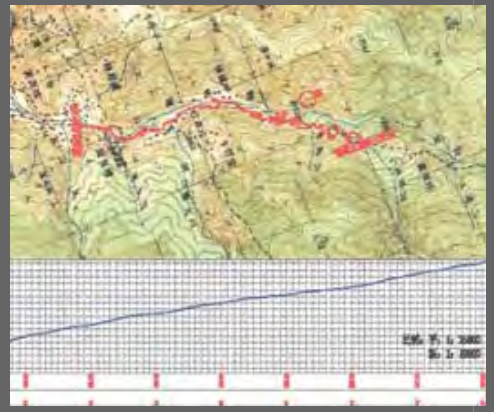

平面圖



受災情況

預計竣工

2012 年 1 月

最新進度

設計中

地質災害治理與防治

序號： 39

地點： 臥龍自然保護區
耿達鄉、臥龍鎮

估算： 1 億 5,467 萬元人民幣

受災情況


臥龍自然保護區多處出現崩塌、滑坡、泥石流等地質災害。大量植被被破壞，大量樹木被沖入溝谷地帶，對當地居民構成威脅，對整個區域生態環境的影響非常大

重建規模

防治 12 處不穩定斜坡、泥石流產生災害，提高穩定性，增加安全儲備

目標受惠對象

區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客

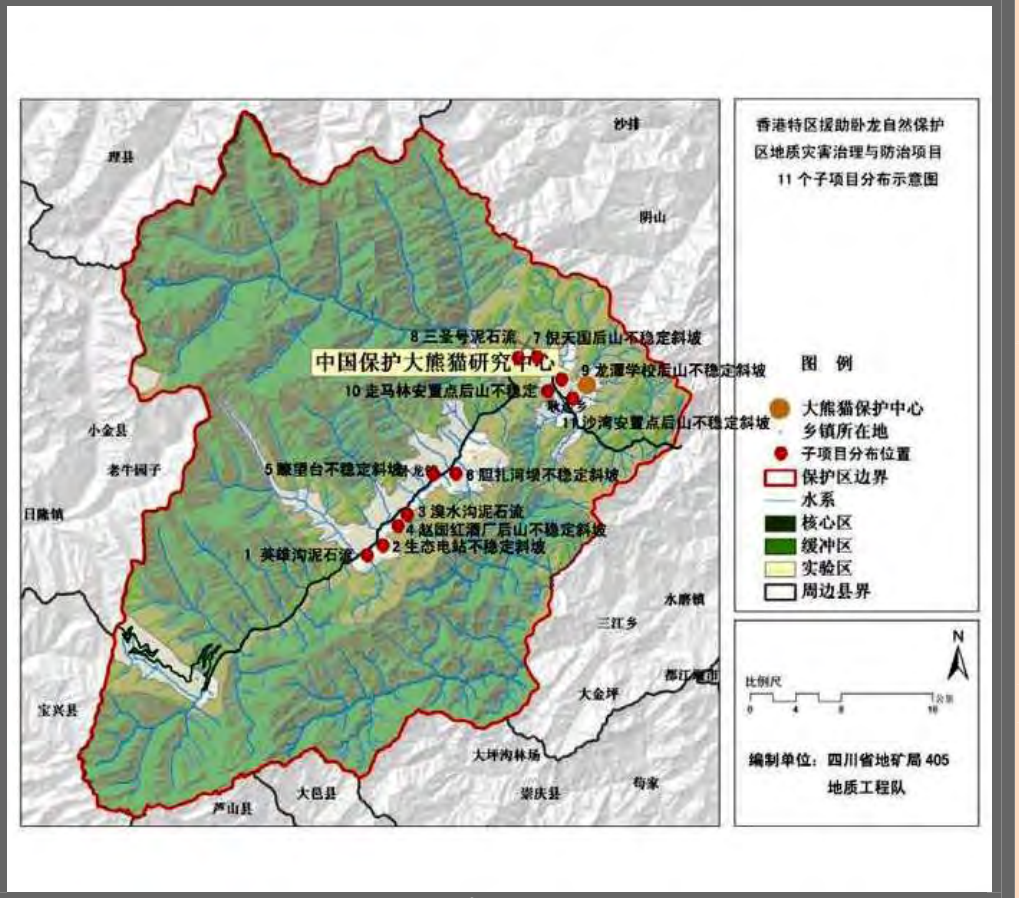

位置圖



趙國紅酒廠後山 不稳定斜坡



龍潭學校後山 不穩定斜坡

預計竣工
2012 年 1 月

最新進度
設計中

鄉土文化遺產災後重建

序號： 40

地點： 臥龍自然保護區臥龍鎮

估算： 2,679 萬元人民幣
(香港承擔 2,230 萬元人民幣)

受災情況


多處重要的廟宇、特色民居、街巷遭受嚴重的破壞

重建規模

- 保護和恢復當地有價值的鄉土遺產，重現茶馬古道驛站風情
- 恢復並改善老街居民的生活環境，主要包括：
  - 25 棟二層民居
  - 18 棟三層民居
  - 衙門及重建老街兩端的兩個小廟
  - 修復何家大地三聖廟、花紅樹喇嘛廟

目標受惠對象

- 區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客
- 延續當地鄉土文化脈絡。提高該地區的旅遊競爭力，給居民帶來就業契機，創造經濟效益

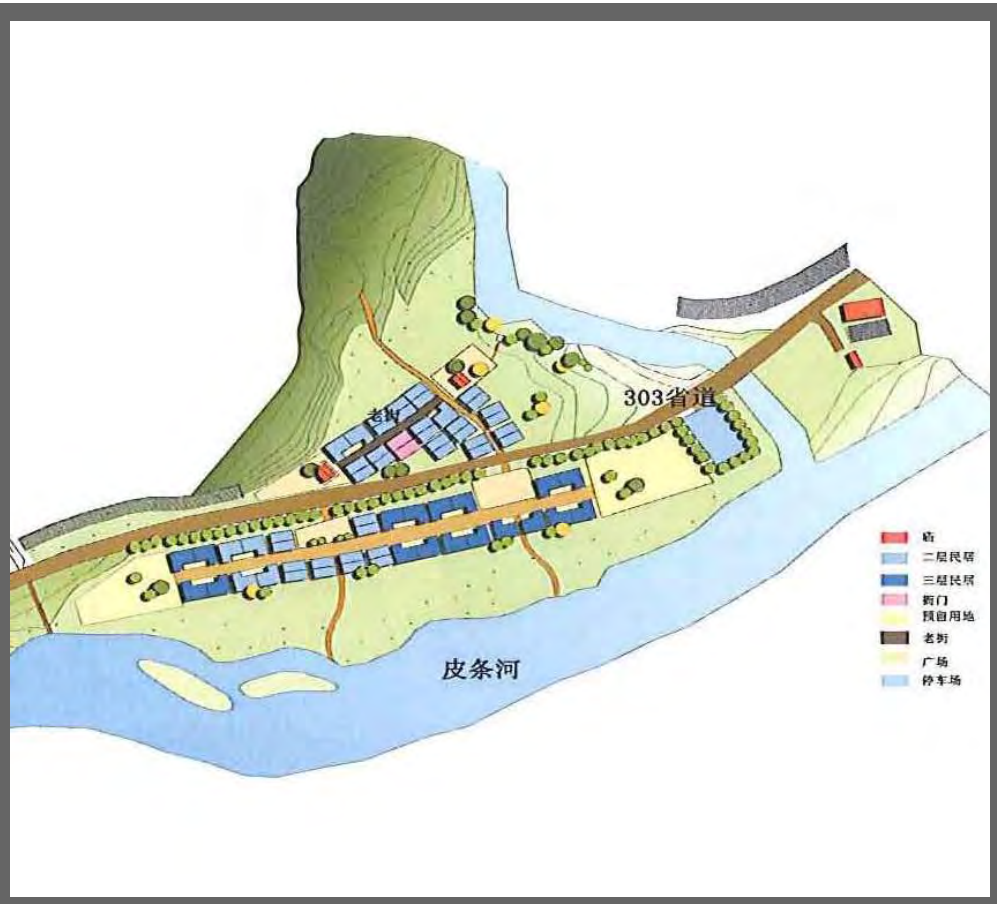

平面圖



效果圖



受災情況

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

設計中

標樁、標牌設施災後重建

序號： 41

地點： 臥龍自然保護區

估算： 205 萬元人民幣

受災情況


原有各類標樁、標牌設施受到嚴重損害

重建規模

- 區界性標樁：80 個
- 區界性標牌：10 個
- 道路指示性標牌：36 個
- 服務步行人員指示性標牌：80 個
- 限制性標牌：200 個
- 重要結點解說性標牌：20 個
- 動植物解說性標牌：500 個
- 公共設施性標牌：200 個

目標受惠對象

區內近 6,000 居民及管理局職工、與及每年約 40 萬人次遊客

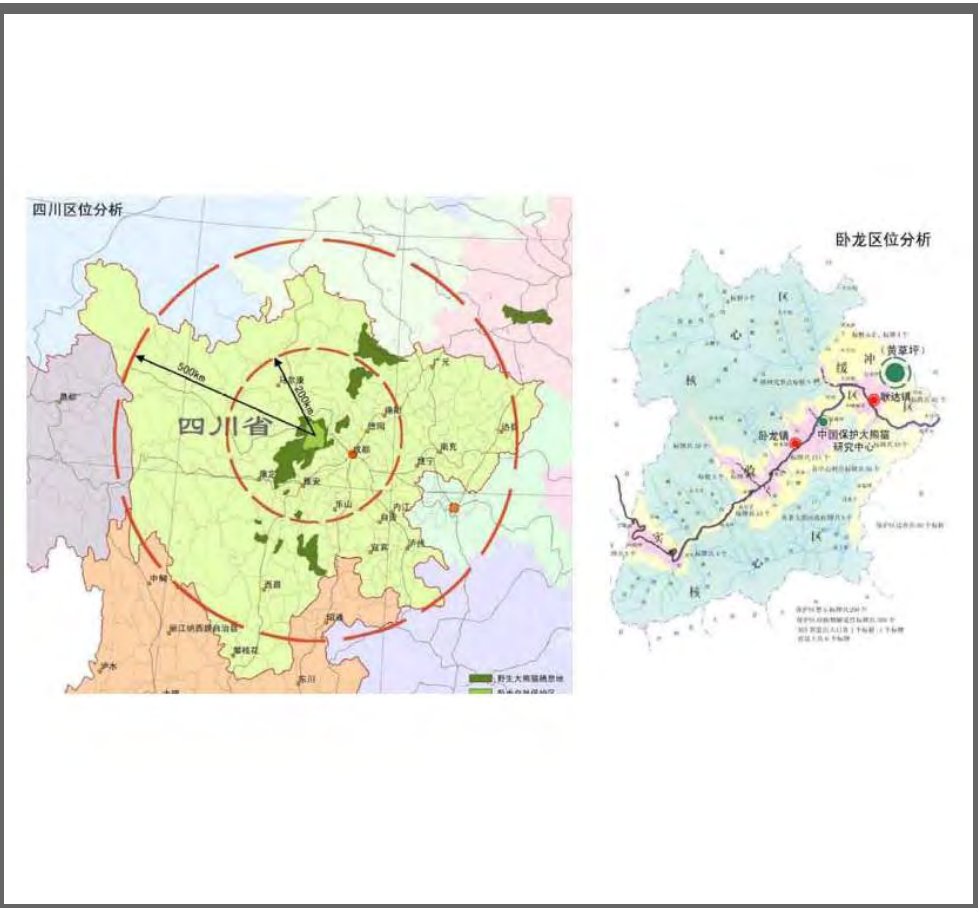

區位分析圖



區界性標樁 意向圖



區界性標牌 意向圖

預計竣工

2013 年 1 月

最新進度

設計中

"數字臥龍"系統工程

序號： 42

地點： 臥龍自然保護區

估算： 1 億 1,371 萬元人民幣

受災情況


科研基礎設施損毀嚴重，信息系統、儀器設備等全部被毀

重建規模

- 網路基礎環境
- 網路應用環境
- 保護與科研服務環境
- 政務與管理服務環境
- 公眾教育與宣傳環境
- 安全保障環境

目標受惠對象


- 中國保護大熊貓研究中心科研人員
- 國內外關注大熊貓及其棲息地、臥龍保護區整體生態環境和生物多樣性保護的人士

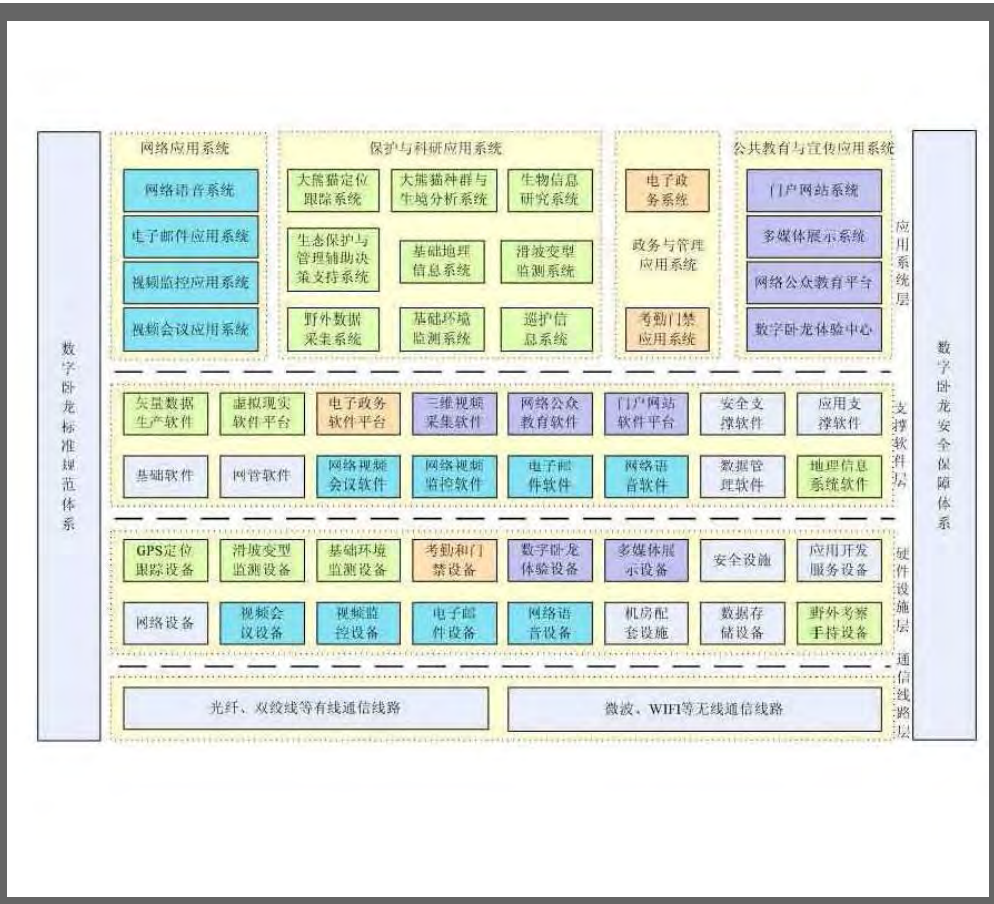

"數字臥龍"系統架構



有線網絡覆蓋圖

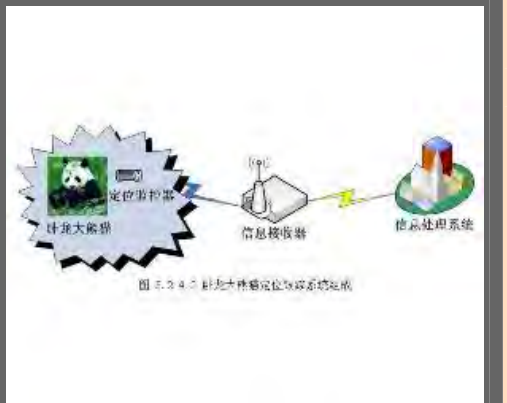

臥龍大熊貓定位跟蹤系統組成

預計竣工

2013 年 11 月

最新進度

設計中

水磨中學

序號： 3

地點： 阿壩州汶川縣水磨鎮

估算： 1 億 5,400 萬元人民幣
(香港承擔 5,562 萬元人民幣)

受災情況


- 1,800 m 校舍倒塌
- 5,800 m 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 合併原水磨中學初中部和高中部為一所完全中學
- 與佛山市合作援建，由佛山市負責整個工程設計和建造，港方負責出資援建二號教學樓、一號宿舍樓及運動場
- 教學樓及輔助用房：18,000 m^2
- 宿舍樓：11,000 m^2
- 學生食堂、洗浴室及禮堂：4,000 m^2
- 教工宿舍：4,000 m^2
- 附屬設施：1,000 m^2
- 運動場：24,800 m^2
- 教學班：52 個
- 學生人數：2,400

目標受惠對象

三江鄉、水磨鎮和漩口鎮等 30 餘個鄉村共約 20,000 人，適齡學生為每年約 1,200 人

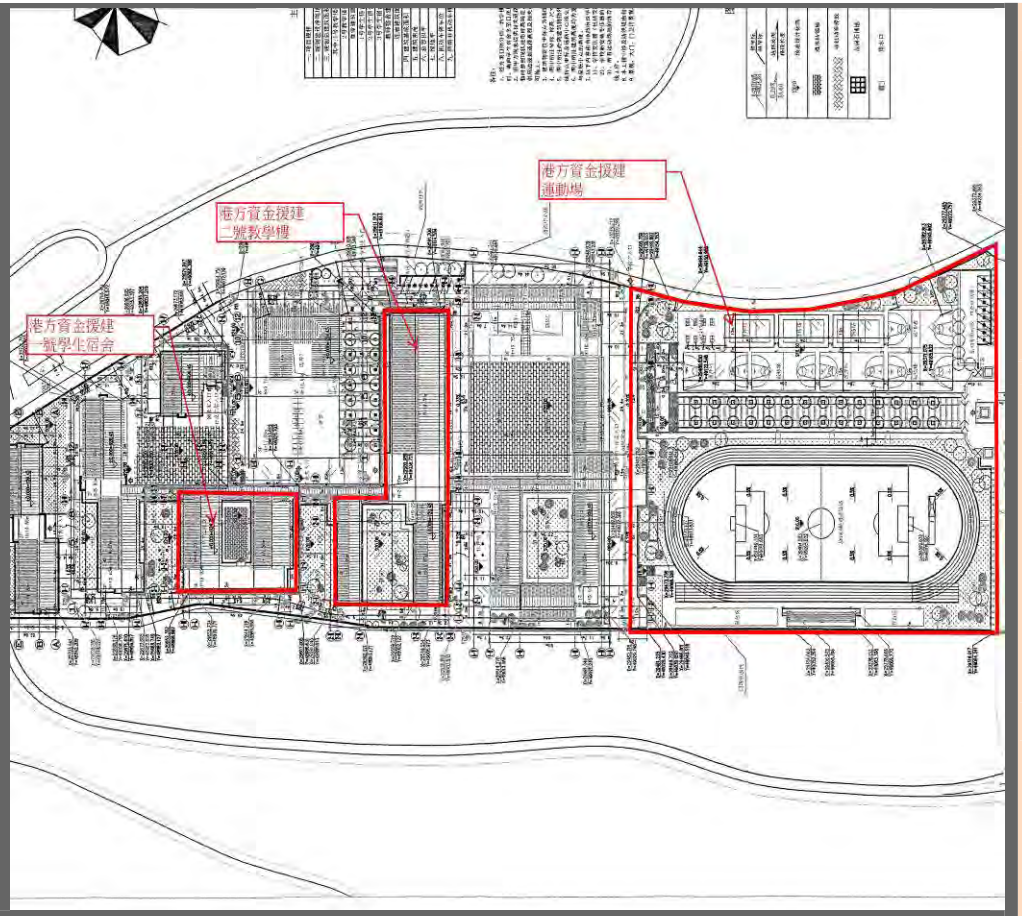

平面圖



鳥瞰圖



政務司司長在教學樓揭牌儀式致詞

竣工日期

2009 年 8 月

最新進度

已竣工



教學樓



學生宿舍



校園

蒼溪中學校

序號： 4

地點： 廣元市蒼溪縣陵江鎮

估算： 6,523 萬元人民幣

受災情況


- 7,200 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 另有 61,910m^2 校舍被列為 C 級危房，需維修加固

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：11,000 m^2
- 運動場：22,000 m^2
- 維修加固：61,910 m^2
- 設備及儀器配置：7,200 件
- 圖書：155,400 冊
- 教學班：106 個
- 學生人數：6,300
- 住宿人數：5,300

目標受惠對象

區內約 780,000 人，適齡學生每年約 9,000 人

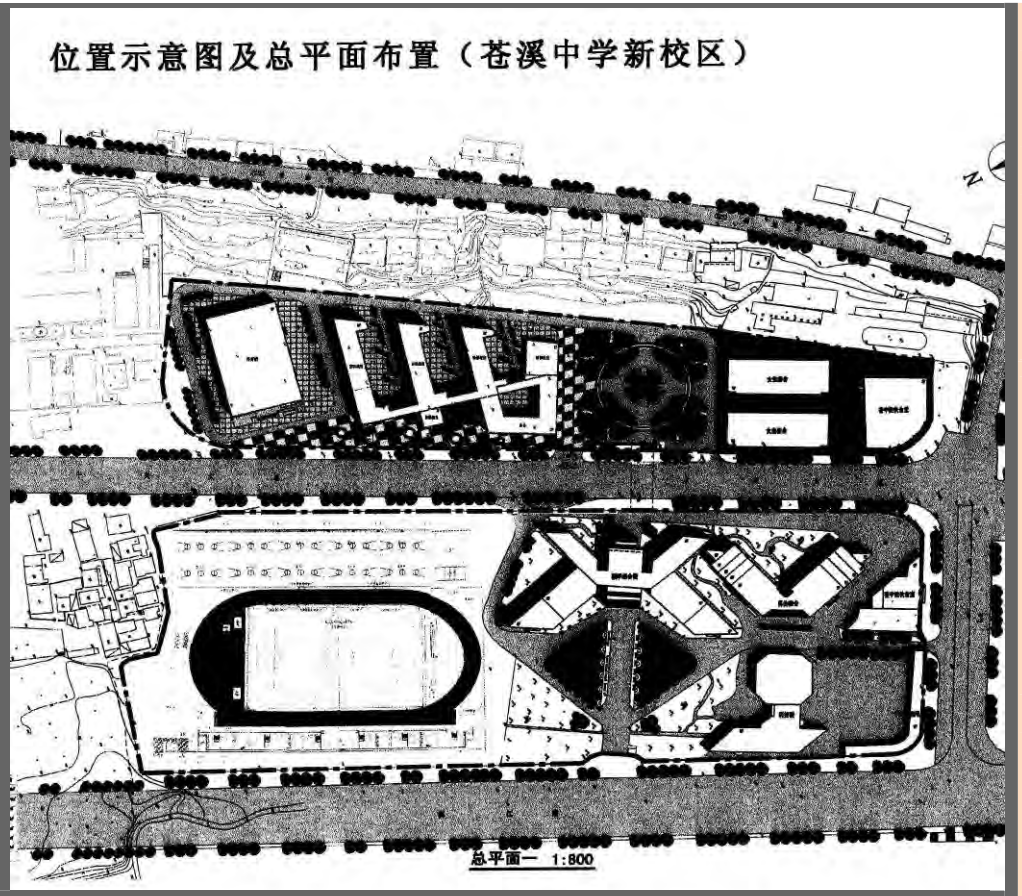

平面圖



鳥瞰圖



教學樓維修加固工程已完成

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中：一、二號樓已完成上蓋建築工程，三號樓正進行地基工程



2010 年 3 月



2010 年 1 月



2009 年 10 月

三台縣第一中學

序號： 5

地點： 綿陽市三台縣潼川南河路

估算： 7,737 萬元人民幣

受災情況


- 7,000 m^2 校舍(包括實驗室、宿舍、教室和禮堂)被列為 D 級危房。
- 另外 21,800 m^2 校舍受損

重建規模

- 原址重建
- 教學實驗綜合樓：6,600 m^2
- 學生宿舍：8,000 m^2
- 食堂：5,600 m^2
- 維修加固：21,760 m^2
- 設備及儀器配置：8,500 台（套）
- 圖書：120,000 冊
- 維修設備：100 台（套）
- 教學班：120 個
- 學生人數：6,000
- 住宿人數：5,600

目標受惠對象

區內 63 個鄉鎮，人口合共約 1,480,000 萬人，適齡學生為每年約 19,000 人

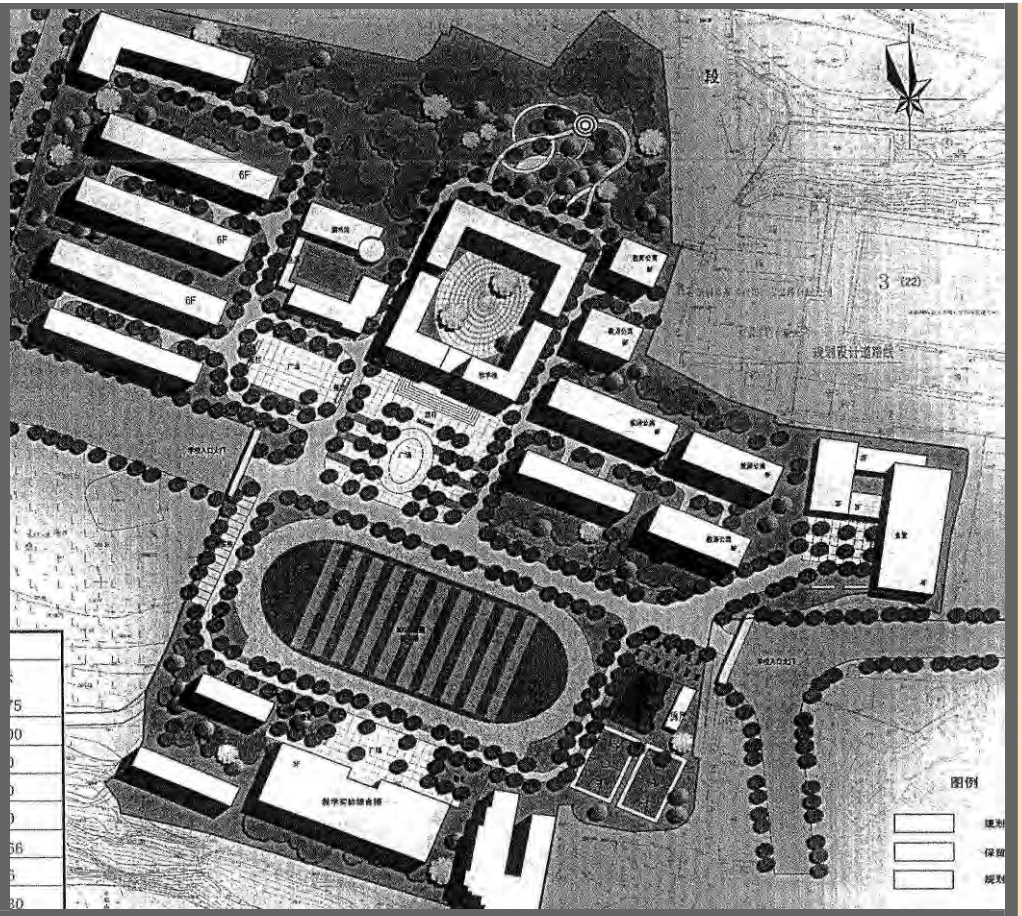

平面圖



鳥瞰圖



學生宿舍

預計竣工

2010 年 6 月

最新進度

施工中：教學實驗綜合樓及學生宿舍已完成上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 1 月



2009 年 11 月

德陽市第一小學

序號： 6

地點： 德陽市旌陽區昆山路

估算： 1,481 萬元人民幣

受災情況

- 4,000 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 另有 6,400 m^2 校舍遭到中度破壞，1,400 m^2 遭到輕度破壞

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：3,794 m^2
- 維修加固：9,524 m^2
- 設備及儀器配置：100 台/套/件
- 圖書：8,200 冊
- 其它配置：1,300
- 教學班：30 個
- 學生人數：1,400

目標受惠對象

區內約 90,000 人，適齡學生每年約 500 人



平面圖



效果圖



加固復修已完成

預計竣工

2010 年 8 月

最新進度

施工中：教學綜合樓已完成，運動場的維修加固預計 2010 年 5 月開展



2010 年 3 月



2010 年 1 月



2009 年 9 月

華山路小學

序號： 7

地點： 德陽市旌陽區華山路

估算： 1,604 萬元人民幣

受災情況

全部校舍 7,758 m^2 被鑒定為中度損毀，待維修加固後方能使用

重建規模

- 異址重建
- 教學綜合樓：3,967 m^2
- 維修加固：7,758 m^2
- 設備及儀器配置：95 台/套/件
- 圖書：11,900 冊
- 其它設備：900 套
- 教學班： 42 個
- 學生人數：2,000

目標受惠對象

區內約 70,000 人，適齡小學生每年約 350 人、初中生每年約 200 人



平面圖



效果圖



受災情況

預計竣工

2010 年 9 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 1 月



2009 年 9 月

東汽小學

序號： 43

地點： 德陽市天山南路

估算： 4,310 萬元人民幣

受災情況


全部校舍 6,700 m^2 被列為 D 級危房

重建規模

- 異址重建
- 教學樓：3,907 m^2
- 科技綜合樓：2,597 m^2
- 行政辦公用房：1,121 m^2
- 多功能教室：707 m^2
- 食堂及活動室：1,593 m^2
- 學前班教學樓：1,418 m^2
- 附屬用房：150 m^2
- 運動場：9,032 m^2
- 教學班： 36 個
- 學生人數：1,600：

目標受惠對象

德陽經濟技術開發區一帶的適齡學童和東汽廠職工子女

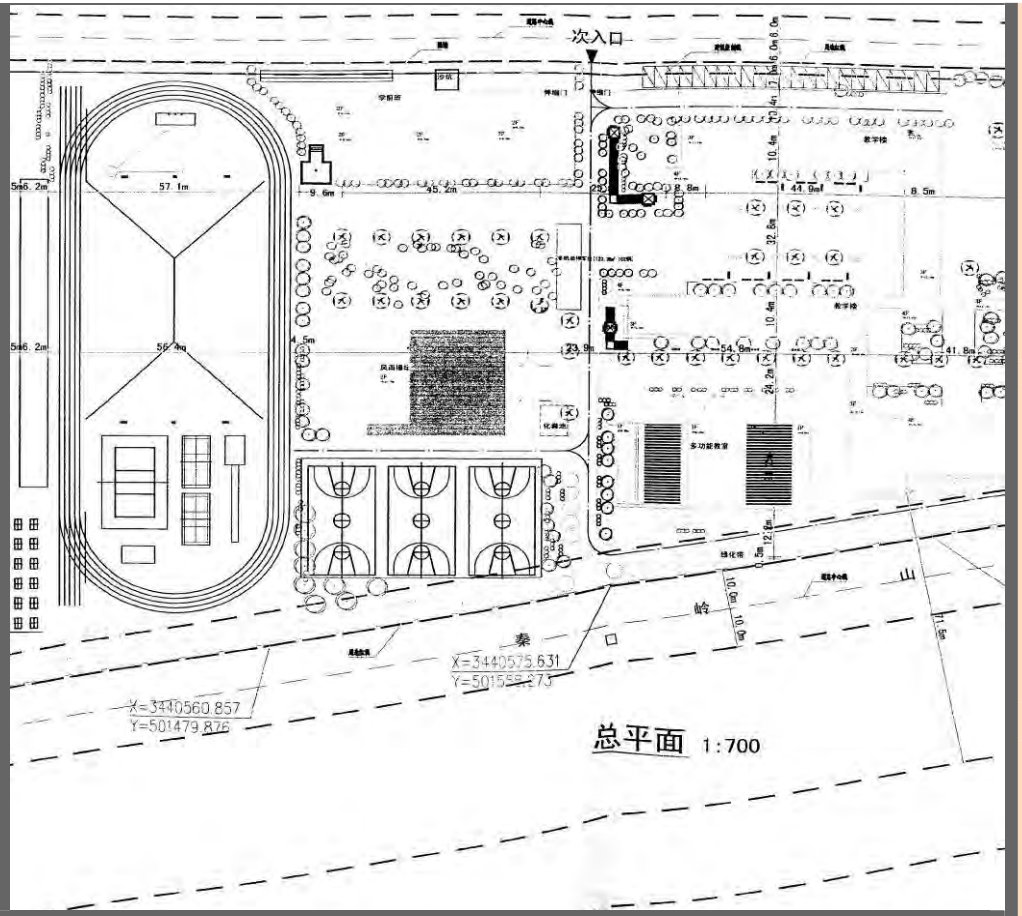

平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工

2010 年 9 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 1 月

魏城鎮中心小學

序號： 44

地點： 綿陽市游仙區魏城鎮

估算： 3,052 萬元人民幣

受災情況


- 4, 400 m^2 校舍倒塌
- 2, 200m^2 被列為危房：
- 5, 000 m^2 體育場地受損：

重建規模

- 異址重建
- 教學綜合樓：6,864 m^2
- 宿舍：4,646 m^2
- 食堂：629 m^2
- 運動場：5,000 m^2
- 教學實施設備：600 台/套/件
- 圖書：700 冊
- 教學班： 36 個
- 學生人數：1,500
- 住宿人數：1,100

目標受惠對象

區內 24 個行政村、2 個小區居委會及附近鄉鎮約 40,000 人，適齡學生約 2,000 人

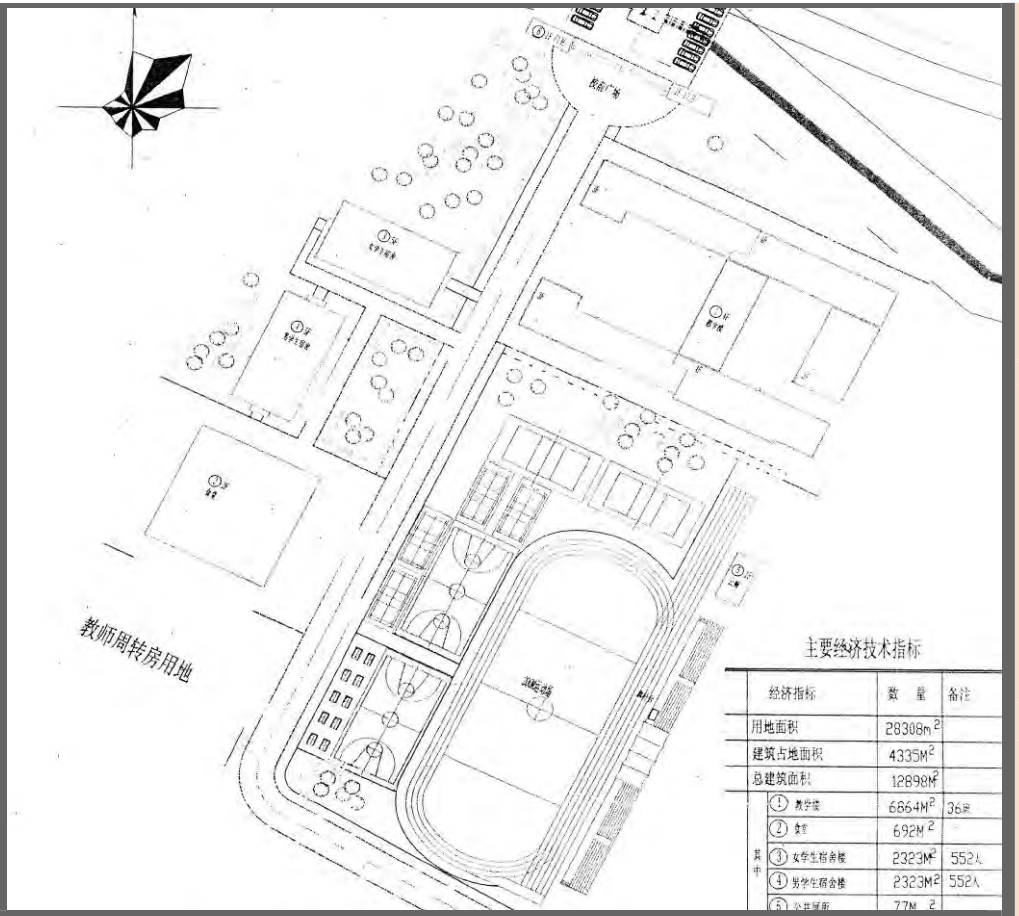

平面圖



受災情況



興建食堂位置

預計竣工

2010 年 9 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 1 月

雲溪初級中學

序號： 45
地點： 鹽亭縣雲溪鎮
估算： 3,982 萬元人民幣

受災情況
全部校舍 5,200 m^2 被列為 D 級危房

重建規模
- 異址重建
- 教學實驗樓：5,546 m^2
- 行政辦公樓、圖書館及科技樓：3,923 m^2
- 學生宿舍：6,604 m^2
- 食堂：1,925 m^2
- 運動場：5,800 m^2
- 教學班：40 個
- 學生人數：2,000
- 住宿人數：1,200

目標受惠對象
鎮內約600,000人，適齡初中生約8,000人


平面圖


鳥瞰圖


受災情況

預計竣工
2011 年 2 月

最新進度
施工中：正進行地基工程


2010 年 3 月


2010 年 3 月


2010 年 3 月

南隆鎮第一小學

序號： 46

地點： 南部縣南隆鎮

估算： 2,710 萬元人民幣

受災情況

- 3,700 m^2 教學樓被列為 D 級危房
- 另約 3, 000 m^2 校舍原被鑑定爲 C 級危房，在多次餘震後出現裂縫，經覆檢確定需拆除

重建規模

- 原址重建
- 綜合教學樓：9,315 m^2
- 運動場：7,601 m^2
- 設備及儀器配置：3,800 台/套/件
- 圖書：75,000 冊
- 教學班：66 個
- 學生人數：4,200

目標受惠對象

鎮內 8 個居委會約 100,000 人，適齡學生每年約 1,000 人



平面圖



鳥瞰圖



拆掉破損校舍

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：剛完成招標，2010 年 5 月底開展地基工程

寶飛鎮初級中學

序號： 47

地點： 眉山市仁壽縣寶飛鎮

估算： 954 萬元人民幣

受災情況


2,600 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 異址重建
- 教學樓：3,018 m^2
- 綜合樓：1,293 m^2
- 食堂：991 m^2
- 教學班： 24 個
- 學生人數：1,000
- 住宿人數：350

目標受惠對象

區內約 40,000 人，適齡學生每年約 420 人

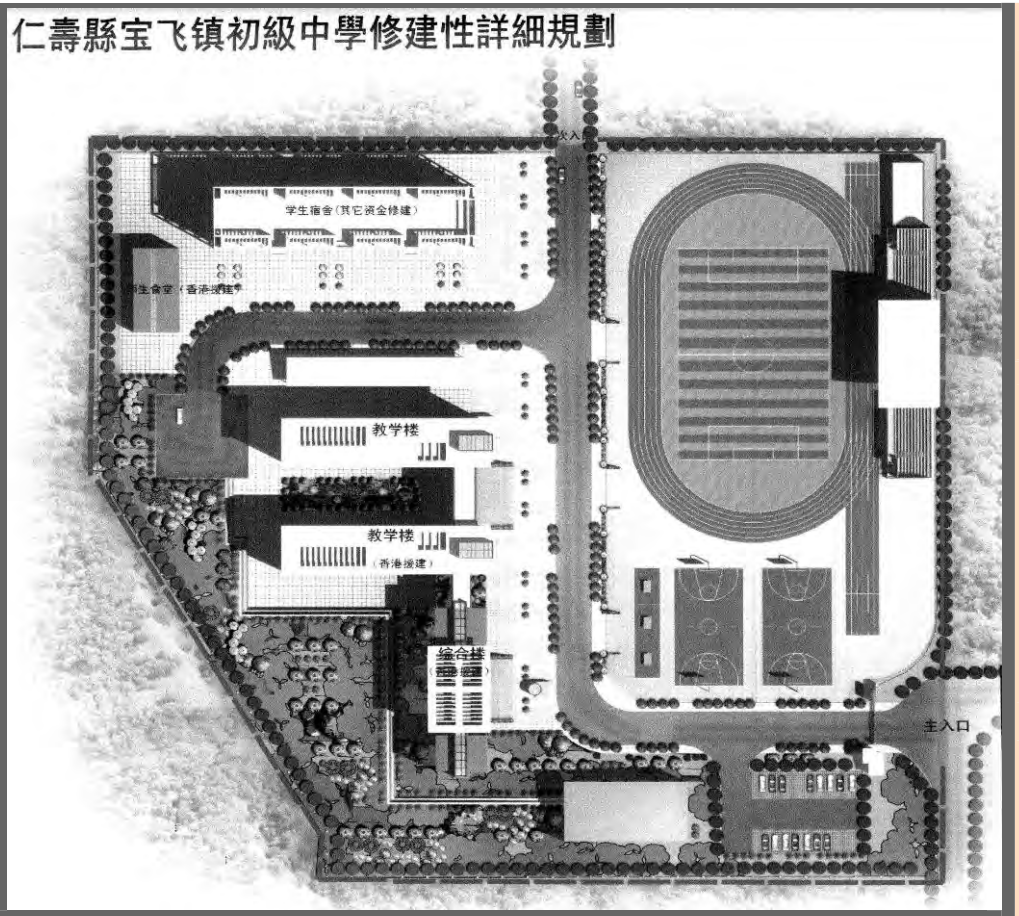

平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工

2010 年 7 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2010 年 2 月

青龍鎮初級中學

序號： 48

地點： 眉山市彭山縣青龍鎮

估算： 1,460 萬元人民幣

受災情況


青龍鎮初級中學及青龍鎮職業中學共 9,802 m^2 嚴重損毀，其中 6,228 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 異址重建，合併青龍鎮初級中學與青龍鎮職業中學爲一所初中
- 教學樓：4,496 m^2
- 宿舍樓：2,000 m^2
- 教師周轉房：949 m^2
- 食堂：484 m^2
- 設備及儀器配置：1,400 台/套/件
- 圖書：22,600 冊
- 運動場：12,000 m^2
- 教學班： 21 個
- 學生人數：1,000

目標受惠對象

區內約 45,000 人，適齡學生每年約 400 人

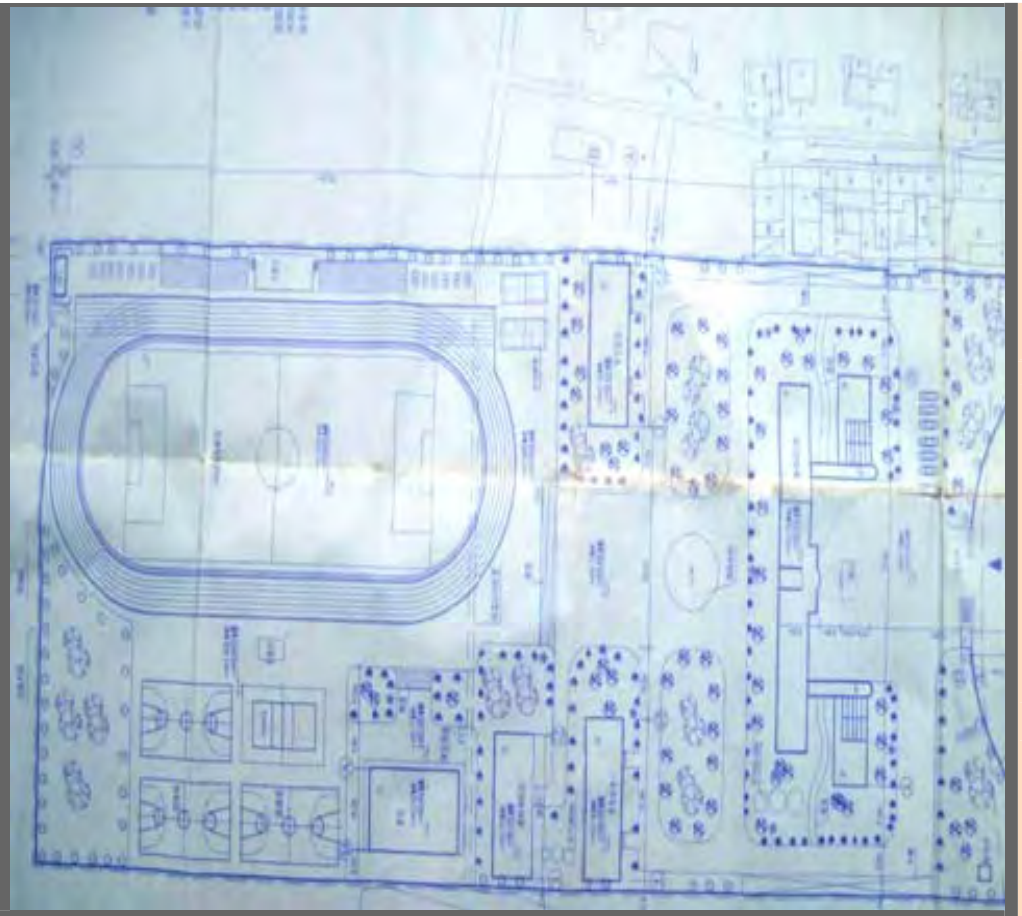

平面圖



鳥瞰圖



教學樓已平頂

預計竣工

2010 年 8 月

最新進度

施工中：教學樓已完成上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 2 月



2009 年 12 月

書院初級中學

序號： 49

地點： 眉山市仁壽縣文林鎮

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況


2,500 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建，將仁壽縣成人中等專業學校與書院初中合併
- 教學辦公綜合樓：4,839 m^2
- 宿舍樓：1,941 m^2
- 教學班：52 個
- 學生人數：2,600

目標受惠對象

區內約 80,000 人，適齡學生每年約 1,200 人

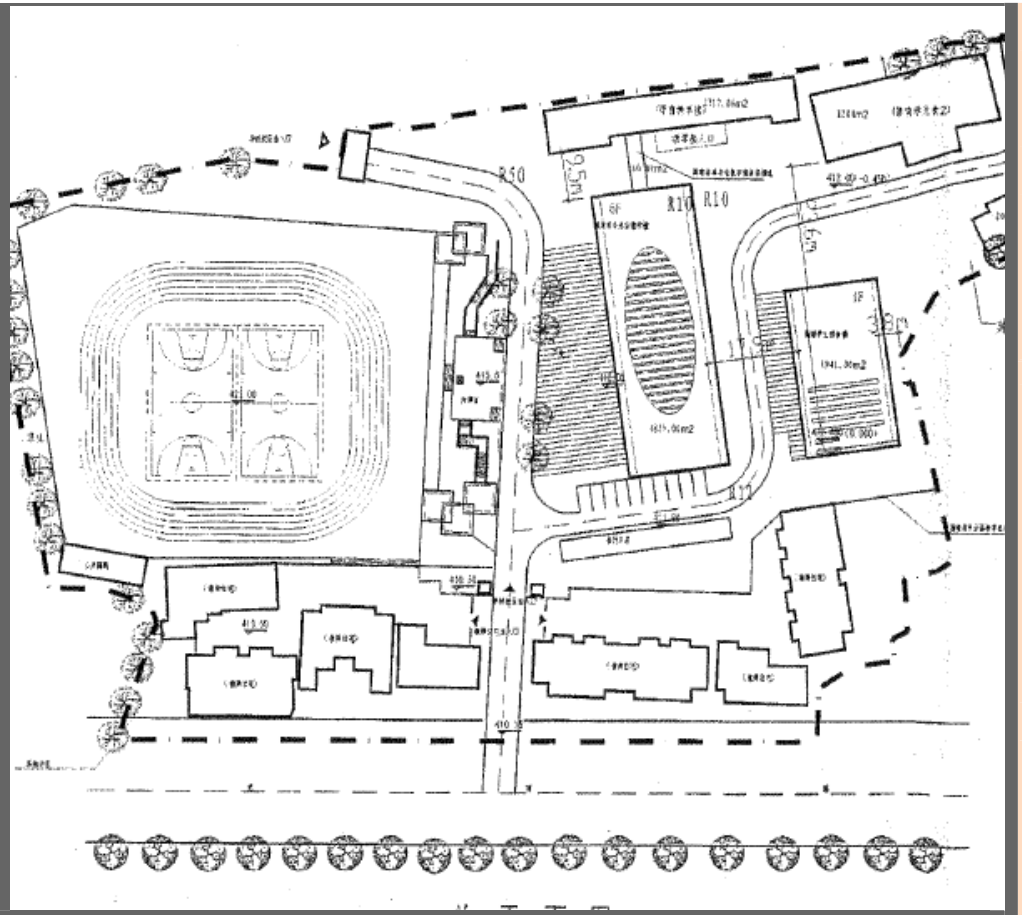

平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2010 年 11 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2009 年 12 月

興賢小學

序號： 50
地點： 雅安市雨城區縣
估算： 1,745 萬元人民幣

受災情況


3,630 m^2 校舍嚴重損毀

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：6,277 m^2
- 綜合樓：2,148 m^2
- 運動場：9,000 m^2
- 儀器設備：900 台/套
- 圖書：25,000 套
- 教學班：36 個
- 學生人數：1,600

目標受惠對象

區內約 50,000 人，適齡學生每年約 1,900 人

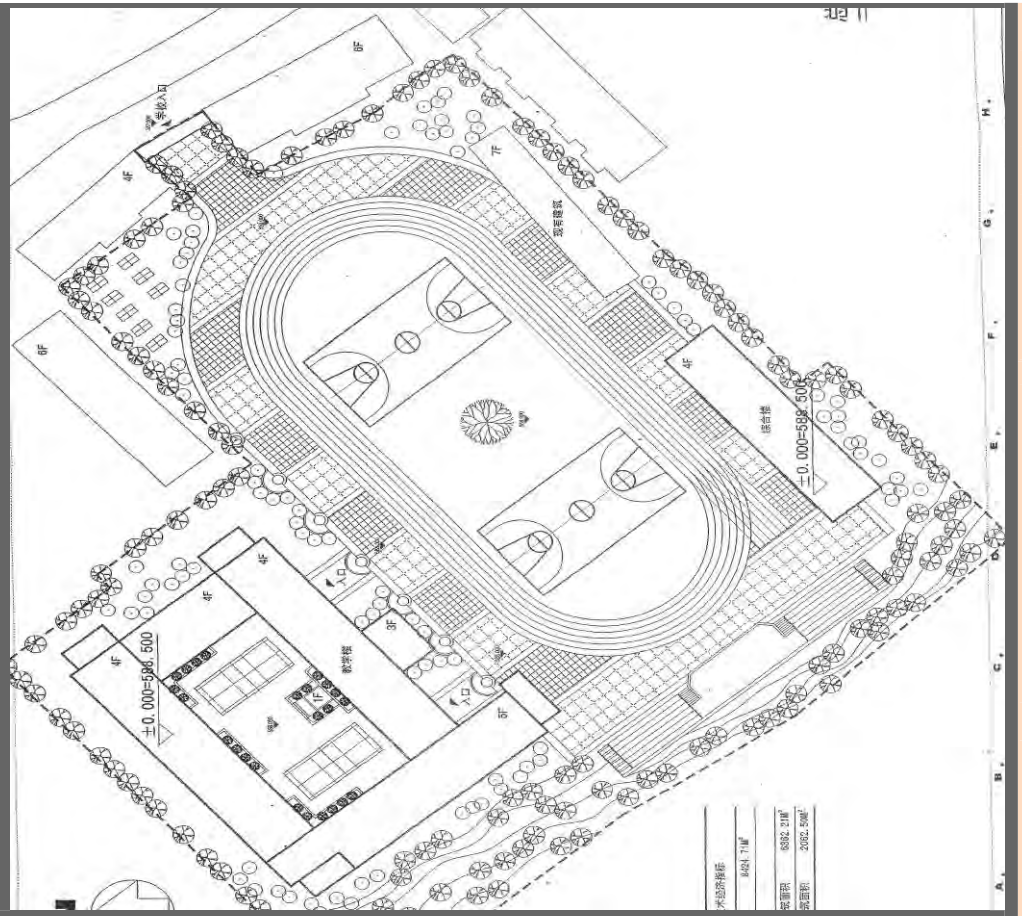

平面圖



鳥瞰圖



原校址

預計竣工

2011 年 1 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2009 年 12 月

隴東中學

序號： 51

地點： 雅安市寶興縣隴東街

估算： 624 萬元人民幣

受災情況


2,000 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：2,129 m^2
- 運動場：2,800 m^2
- 教學班：8 個
- 學生人數：400
- 住宿人數：200

目標受惠對象

區內兩個鄉鎮，共 15 個村，約 8,000 人

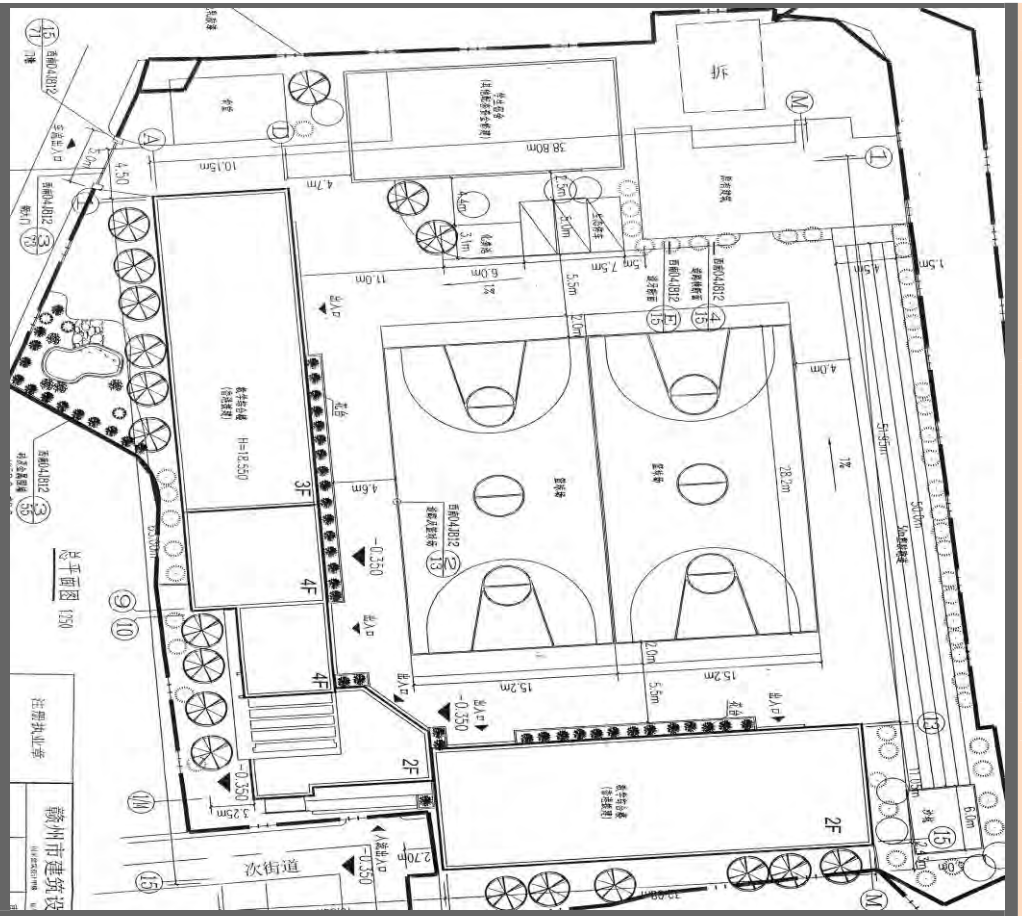

平面圖



舊校舍



舊校舍

預計竣工

2011 年 3 月

最新進度

設計中：預計 2010 年 8 月動工

蜂桶寨小學

序號： 52

地點： 雅安市寶興縣蜂桶寨鄉

估算： 1,500 萬元人民幣

受災情況


蜂桶寨鄉民治小學和鹽井中心校兩校，成為危房面積約 1,700 m^2

重建規模

- 異址重建，合併蜂桶寨鄉民治小學和鹽井中心校
- 教學樓：1,900 m^2
- 實驗樓：1,800 m^2
- 學生宿舍： 2,500 m^2
- 食堂：450 m^2
- 運動場：4,800 m^2
- 教學班：15 個
- 學生人數：600
- 住宿人數：600

目標受惠對象

區內鄉鎮約 5,100 人，適齡學生每年約 500 人

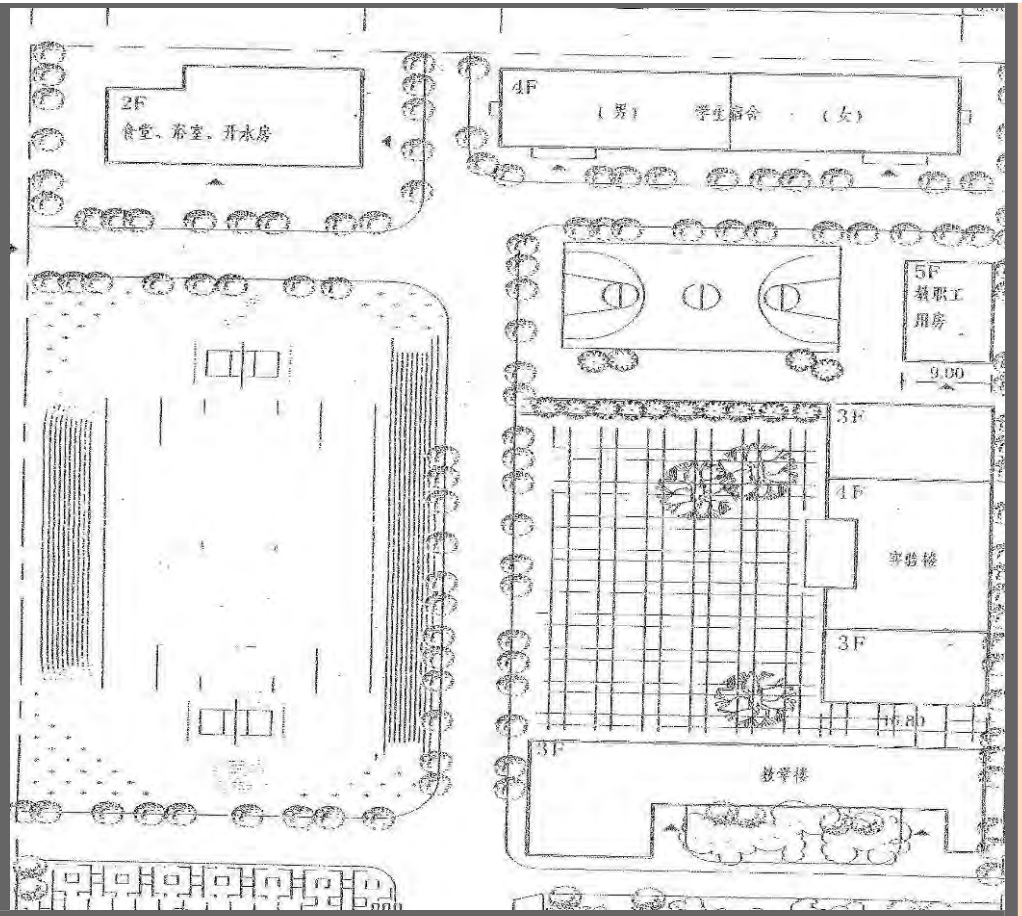

平面圖



選址



鹽井中心校原址

預計竣工

2011 年 4 月

最新進度

設計中：預計 2010 年 8 月動工

五龍中心校

序號： 53

地點： 雅安市寶興縣五龍鄉

估算： 585 萬元人民幣

受災情況


- 1,500 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 1,300 m^2 校舍需維修加固

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：1,853 m^2
- 運動場：4,500 m^2
- 教學班：15 個
- 學生人數：600
- 住宿人數：250

目標受惠對象

雅安市寶興縣五龍鄉全鄉的適齡學童，規劃學生人數 600 人

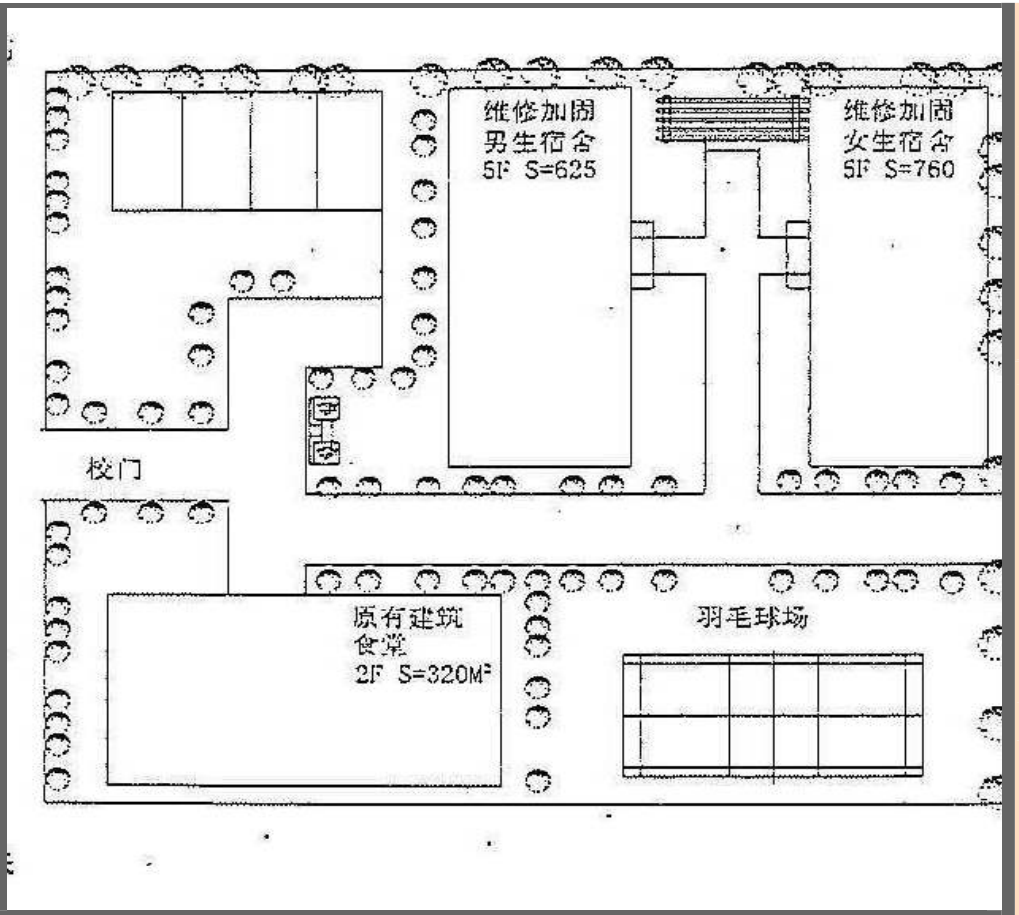

平面圖



舊校舍



舊校舍

預計竣工

2011 年 3 月

最新進度

設計中：預計 2010 年 8 月動工

金山鎮第一小學

序號： 54

地點： 德陽市羅江縣金山場鎮

估算： 2,733 萬元人民幣

受災情況


- 1,927 m^2 校舍倒塌
- 3,297 m^2 校舍被列為危房

重建規模

- 原址重建
- 教學辦公綜合樓：5,662 m^2
- 學生宿舍：2,304 m^2
- 食堂：879 m^2
- 運動場：7,884 m^2
- 教學設備：12,300 台/套。
- 圖書：35,000 冊
- 教學班：26
- 學生人數：1,200
- 住宿人數：600

目標受惠對象

區內的 12 個行政村、一個居委會，人口約 32,000 人，其中的適齡學生

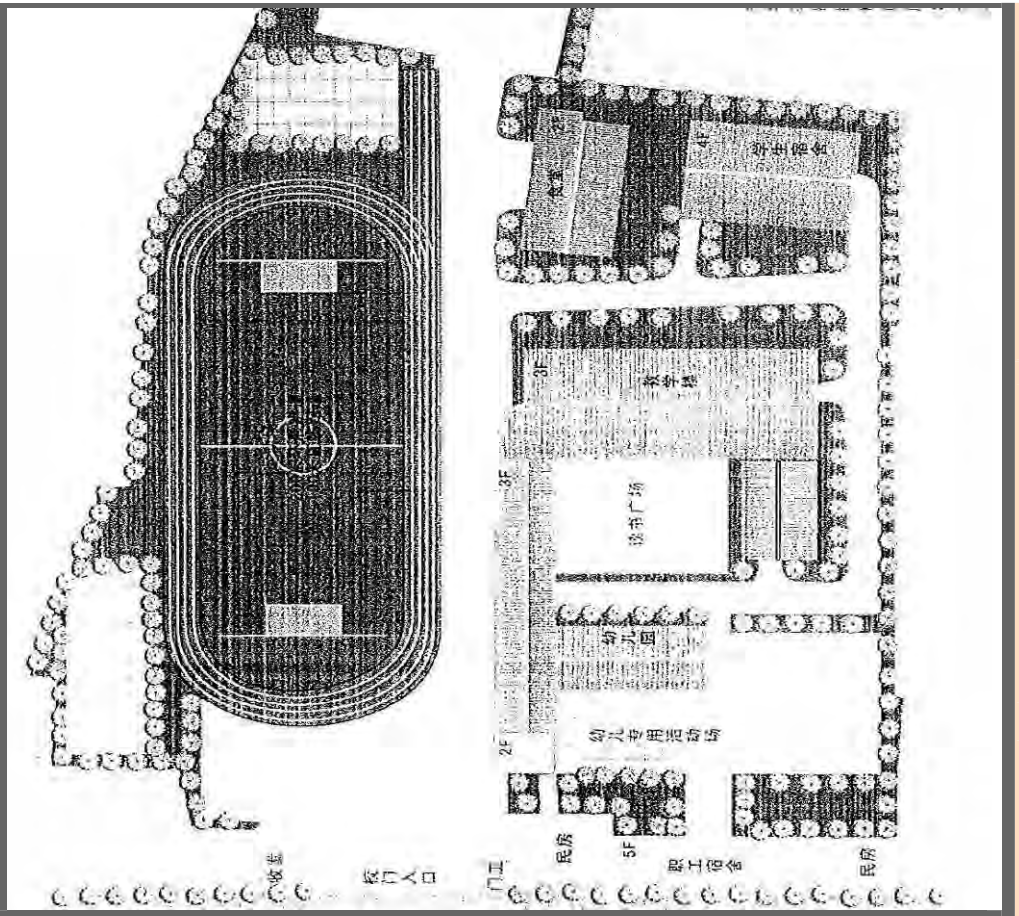

平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工

2010 年 11 月

最新進度

施工中：地基工程接近完成，正準備進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

略坪鎮小學

序號： 55

地點： 德陽市羅江縣略坪鎮

估算： 1,638 萬元人民幣

受災情況


- 200 m^2 校舍倒塌
- 3,968 m^2 校舍被列為危房

重建規模

- 原址重建，並將原來兩個分校區合併回本部
- 教學辦公綜合樓：4,620 m^2
- 學生宿舍：1,500 m^2
- 食堂：579 m^2
- 運動場：4,600 m^2
- 教學設備：9,200 台/套。
- 圖書：11,000 冊
- 教學班：20 個
- 學生人數：900
- 住宿人數：400

目標受惠對象

區內約 30,000 人，適齡學生每年約 200 人

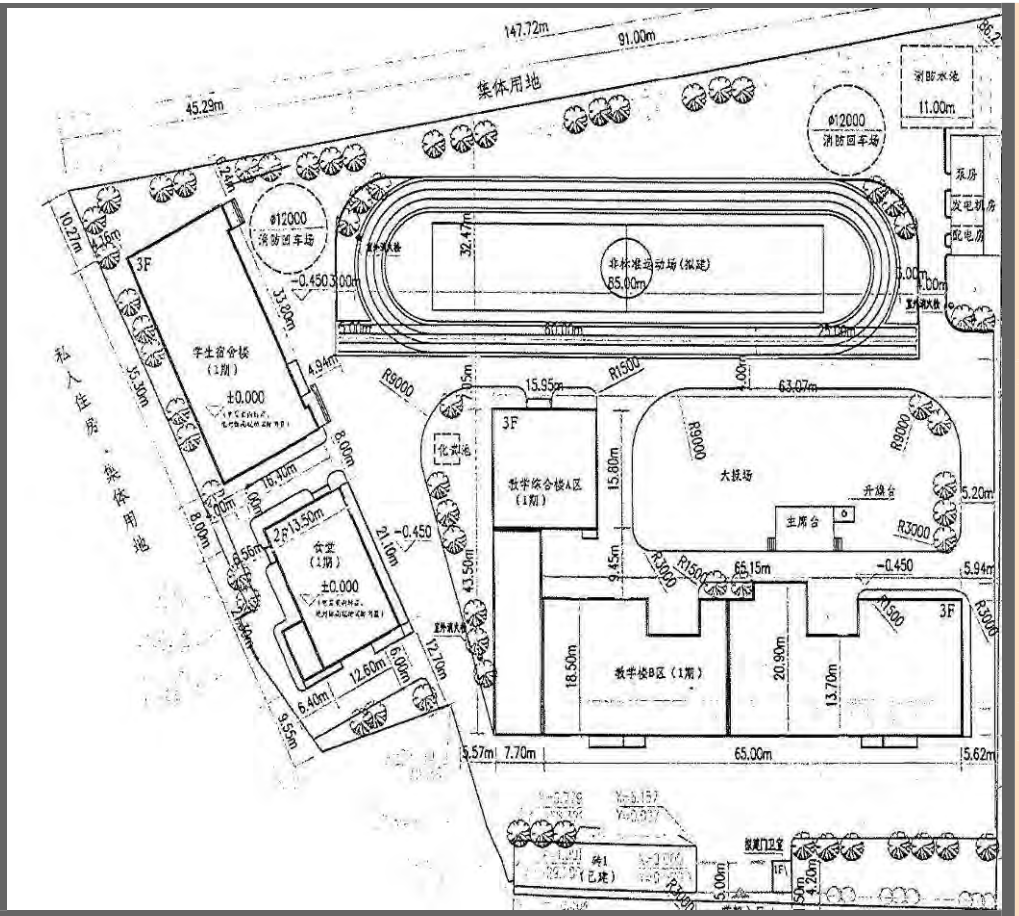

平面圖



受災情況



受災情況

預計竣工

2010 年 8 月

最新進度

施工中：地基工程已完成，正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2009 年 12 月


合江鎮中心校

序號： 56
地點： 雅安市雨城區合江鎮
估算： 568 萬元人民幣

受災情況
900 m^2 校舍被列為危房

重建規模
- 原址重建
- 教學綜合樓：680 m^2
- 學生宿舍：1,461 m^2
- 學生食堂：308 m^2
- 運動場：3,000 m^2
- 教學班：15 個
- 學生人數：600
- 住宿人數：200

目標受惠對象
區內 10 個行政村約 10,000 人，適齡學生每年約 600 人

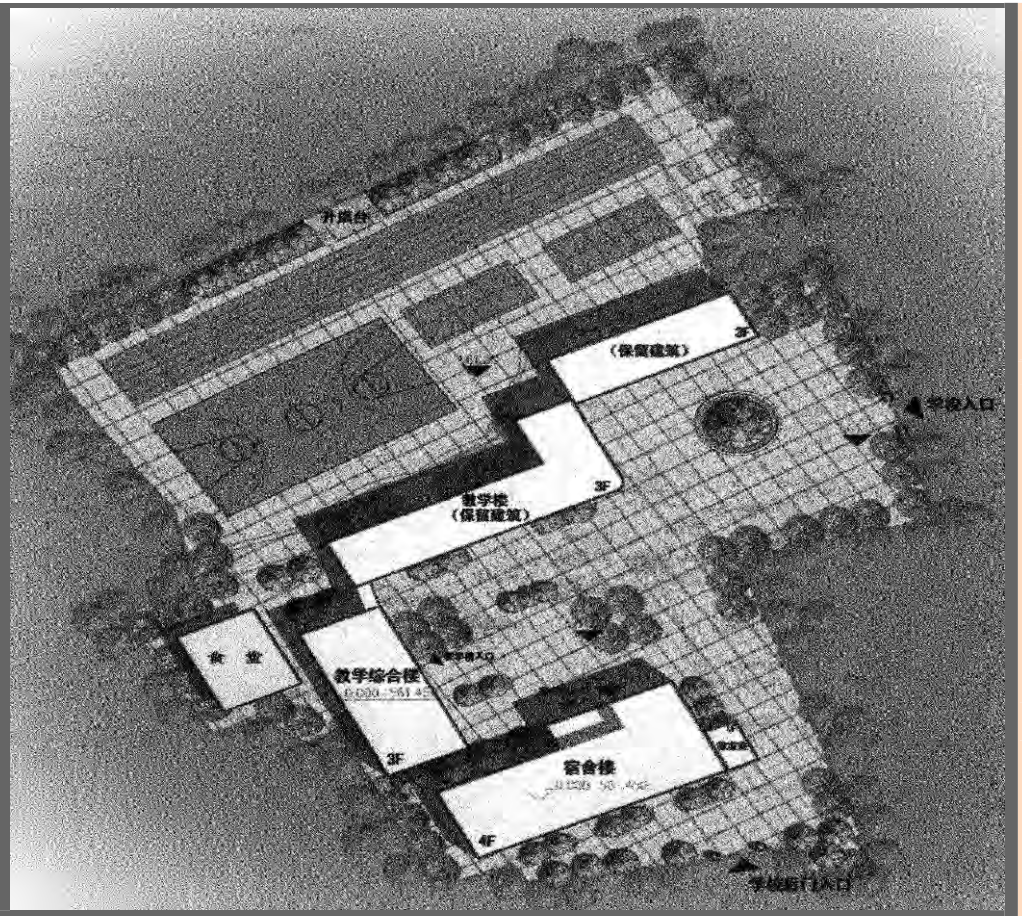


平面圖


鳥瞰圖


受災情況

預計竣工
2010 年 8 月

最新進度
施工中：正進行上蓋工程

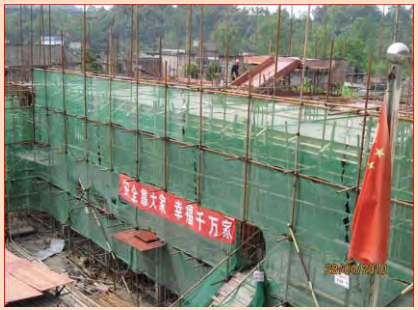
2010 年 4 月


2010 年 3 月


2009 年 12 月

隆興中心校

序號： 57

地點： 雅安市蘆山縣龍門鄉

估算： 864 萬元人民幣

受災情況


1,400 m^2 校舍被列為危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：2,600 m^2
- 學生宿舍：750 m^2
- 食堂：350 m^2
- 運動場：2,000 m^2
- 設備及教學儀器：7,100 台/套/件
- 圖書：11,000 冊
- 教學班：18 個
- 學生人數：800
- 住宿人數：300

目標受惠對象

區內 1 個鄉鎮 43,000 人，適齡學生每年約 3,000 人

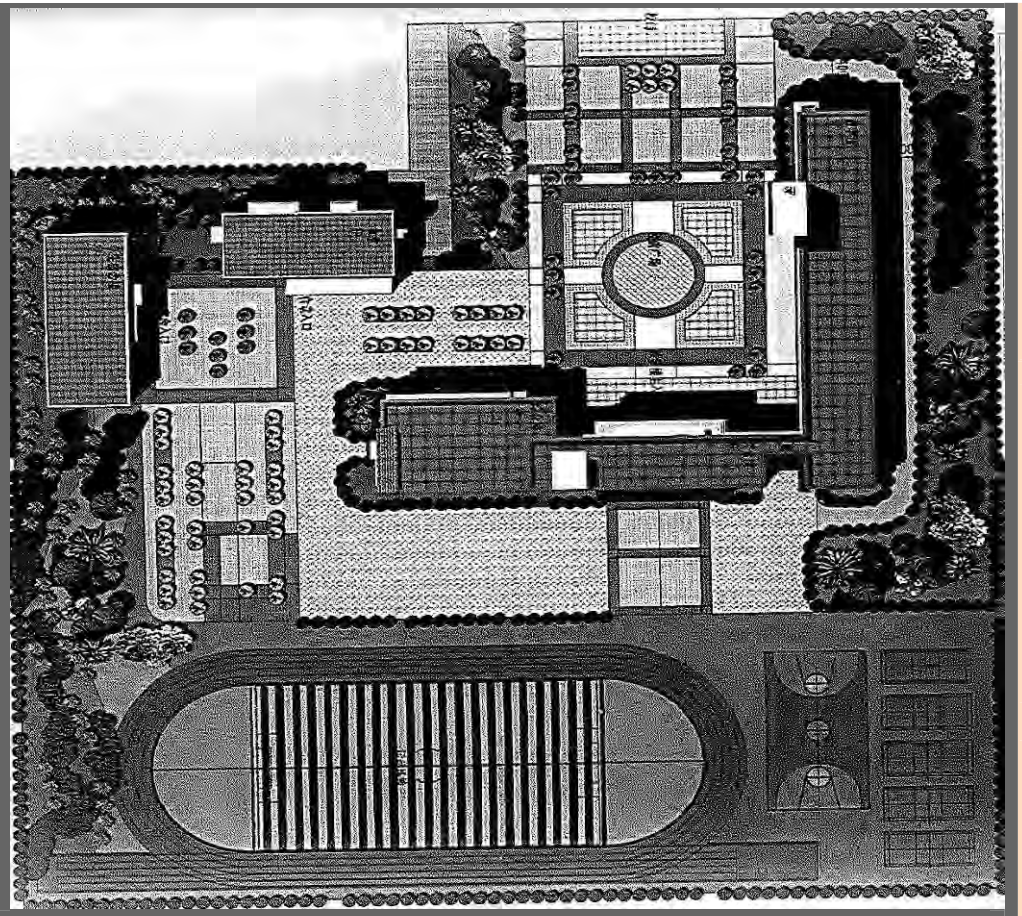

平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2009 年 12 月

文昌鎮初級中學

序號： 58

地點： 綿陽市梓潼縣文昌鎮

估算： 4,654 萬元人民幣

受災情況


- 文昌中學 1,000 m^2 校舍倒塌、2,400m^2 校舍被列為危房
- 興文中學 9,000m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建，合併文昌中學、興文中學及馬鳴鄉中
- 教學綜合樓：3,300 m^2
- 教學樓：800 m^2
- 學生宿舍：10,074 m^2
- 食堂：3,600 m^2
- 運動場：21,000 m^2
- 維修加固：6,500 m^2
- 設備及儀器：1,300 台/套/件
- 圖書：11,300 冊。
- 教學班：66 個
- 學生人數：3,200
- 住宿人數：2,900

目標受惠對象

區內 103,000 人，適齡學生 3,200 人

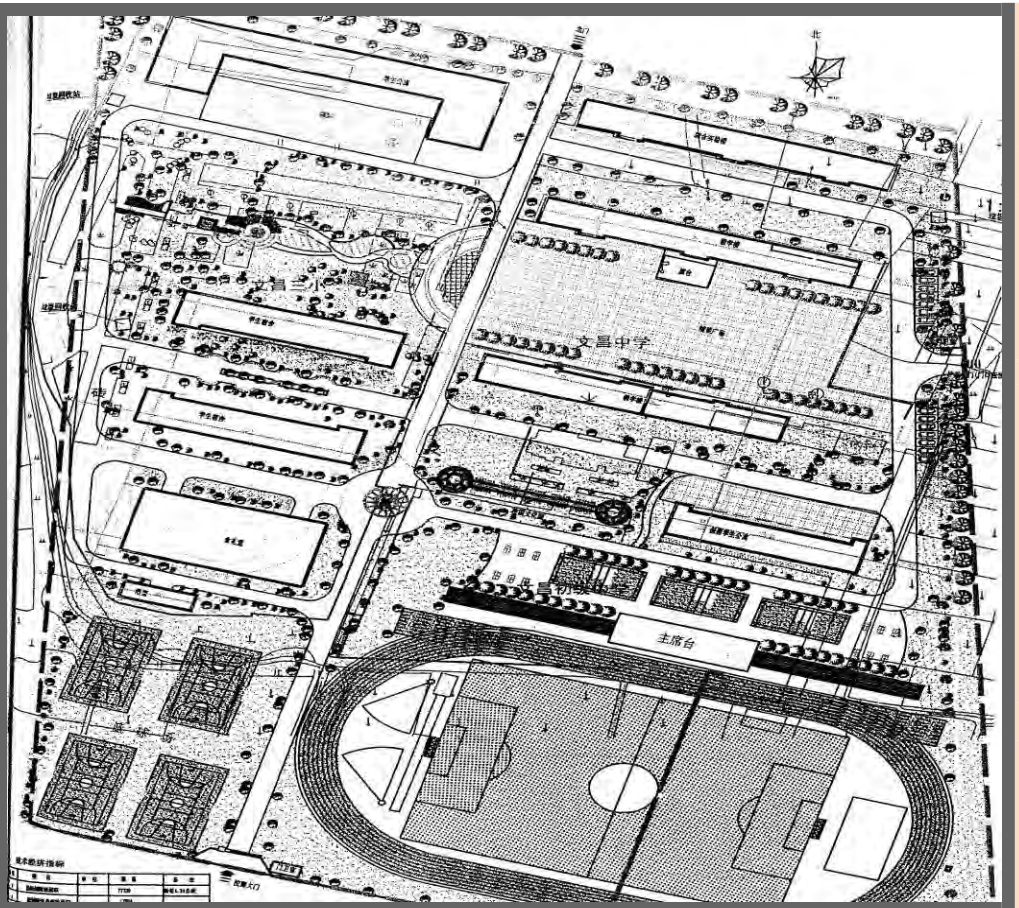

平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2010 年 8 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 4 月

夾江中學

序號： 59

地點： 樂山市夾江縣焉城鎮

估算： 2,038 萬元人民幣

受災情況


- 4,900 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 5,400 m^2 校舍需維修加固

重建規模

- 原址重建
- 綜合樓：6,300 m^2
- 學生宿舍：1,000 m^2
- 運動場：20,000 m^2
- 維修加固：2,400 m^2
- 教學班：60 個
- 學生人數：3,000
- 住宿人數：1,800

目標受惠對象

區內 350,000 人，適齡學生 4,300 人

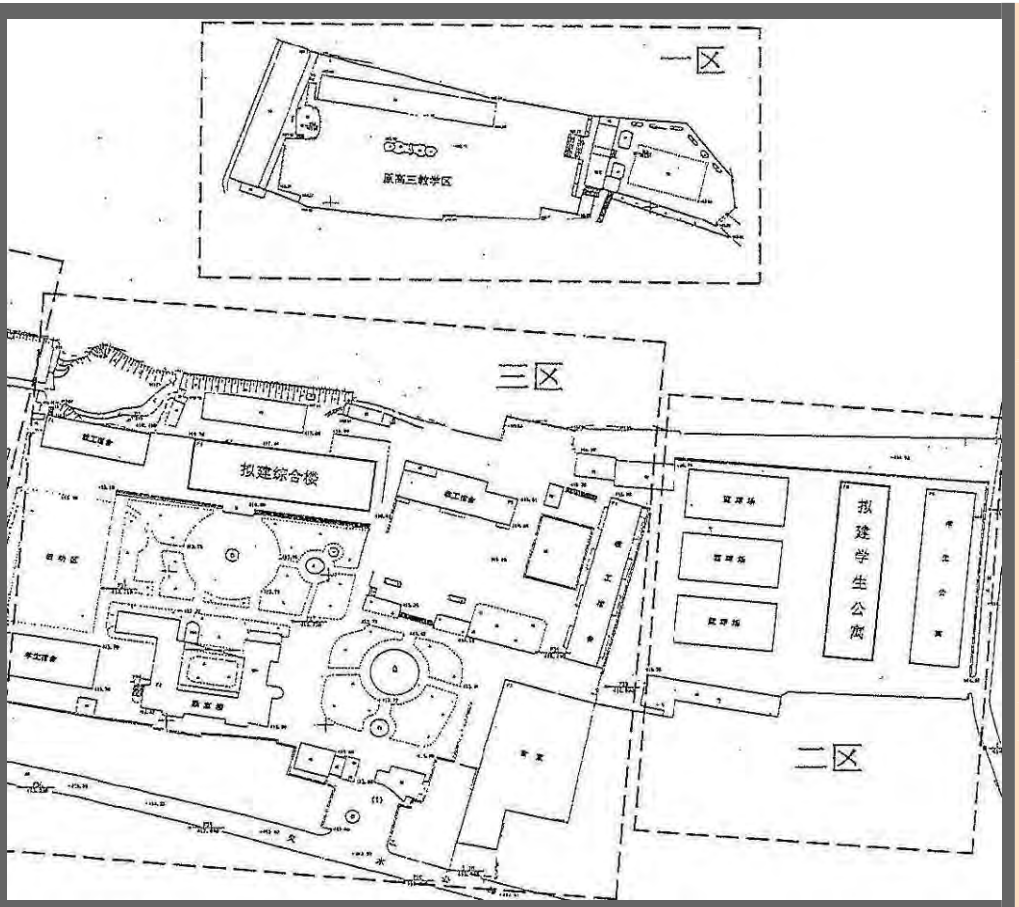

平面圖



鳥瞰圖



選址

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 3 月

仁義初級中學

序號： 60
地點： 雅安市天全縣
估算： 665 萬元人民幣

受災情況

- 1,220 m^2 校舍被列為危房
- 1,850 m^2 校舍需維修加固

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：1,729 m^2
- 宿舍：800 m^2
- 運動場：2,500 m^2
- 教學班：12 個
- 學生人數：600

目標受惠對象

區內 19,000 人，適齡學生 600 人



平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工
2011 年 3 月

最新進度
設計中

天全縣初級中學

序號： 61
地點： 雅安市天全縣
估算： 3,086 萬元人民幣

受災情況
校舍 13,031 m^2 嚴重受損，部份被列為 D 級危房

重建規模
- 原址重建
- 教學樓：5,884 m^2
- 學生宿舍：4,941 m^2
- 行政辦公樓：2,200 m^2
- 食堂：2,500 m^2
- 運動場：4,000 m^2
- 教學儀器：4,000 台/套
- 圖書：38,000 冊
- 教學班：64 個
- 學生人數：3,200


目標受惠對象
區內 56,000 人，適齡學生 3,500 人



平面圖



鳥瞰圖

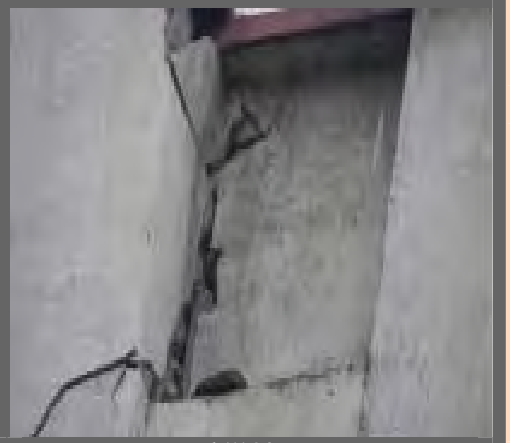

受災情況

預計竣工
2011 年 6 月

最新進度
設計中

樂英初級中學

序號： 62
地點： 雅安市天全縣
估算： 886 萬元人民幣

受災情況
3,000 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模
- 原址重建
- 教學樓：2,500 m^2
- 學生宿舍：800 m^2
- 行政辦公樓：800 m^2
- 食堂：600 m^2
- 運動場：2,000 m^2
- 教學班：15 個
- 學生人數：700

目標受惠對象
區內 14,000 人，適齡學生 800 人



平面圖


鳥瞰圖


選址

預計竣工
2011 年 6 月

最新進度
設計中

滎經中學

序號： 63

地點： 雅安市滎經縣嚴道鎮

估算： 4,375 萬元人民幣

受災情況


1,300m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 異址重建
- 教學樓：8,577 m^2
- 綜合樓：2,529 m^2
- 實驗樓：4,960 m^2
- 學術報告廳：1,388 m^2
- 輔助用房：1,571 m^2
- 風雨操場：2,275 m^2
- 運動場：10,000 m^2
- 設備：3,600 台/套。
- 教學班：60 個
- 學生人數：3,300

目標受惠對象

區內 136,,000 人，適齡學生 1,500 人

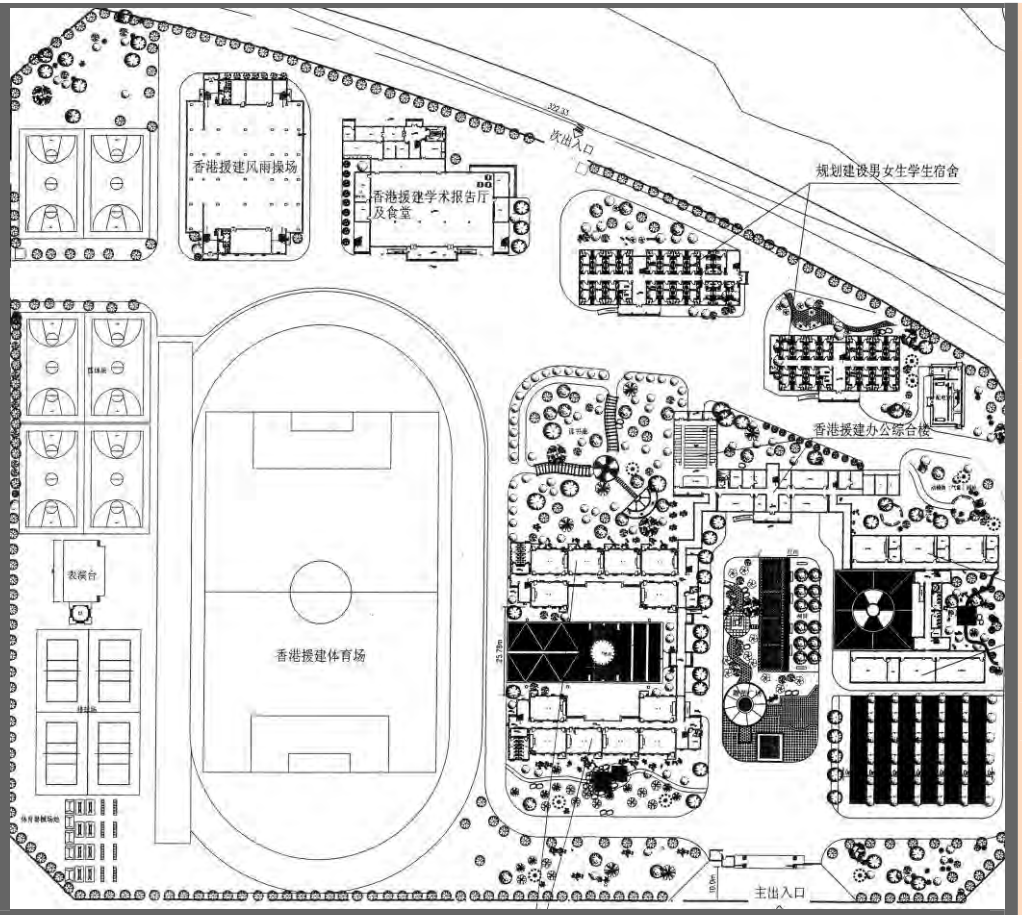

平面圖



受災情況



受災情況

預計竣工

2011 年 8 月

最新進度

設計中

泗坪中學

序號： 64

地點： 雅安市榮經縣

估算： 786 萬元人民幣

受災情況


- 2,200 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 1,300 m^2 校舍被列為 C 級危房
- 200 m^2 校舍需維修加固

重建規模


- 原址重建
- 教學樓：4,550 m^2
- 維修加固：171 m^2
- 教學班：18 個
- 學生人數：900

目標受惠對象

區內 34,,000 人，適齡學生 300 人

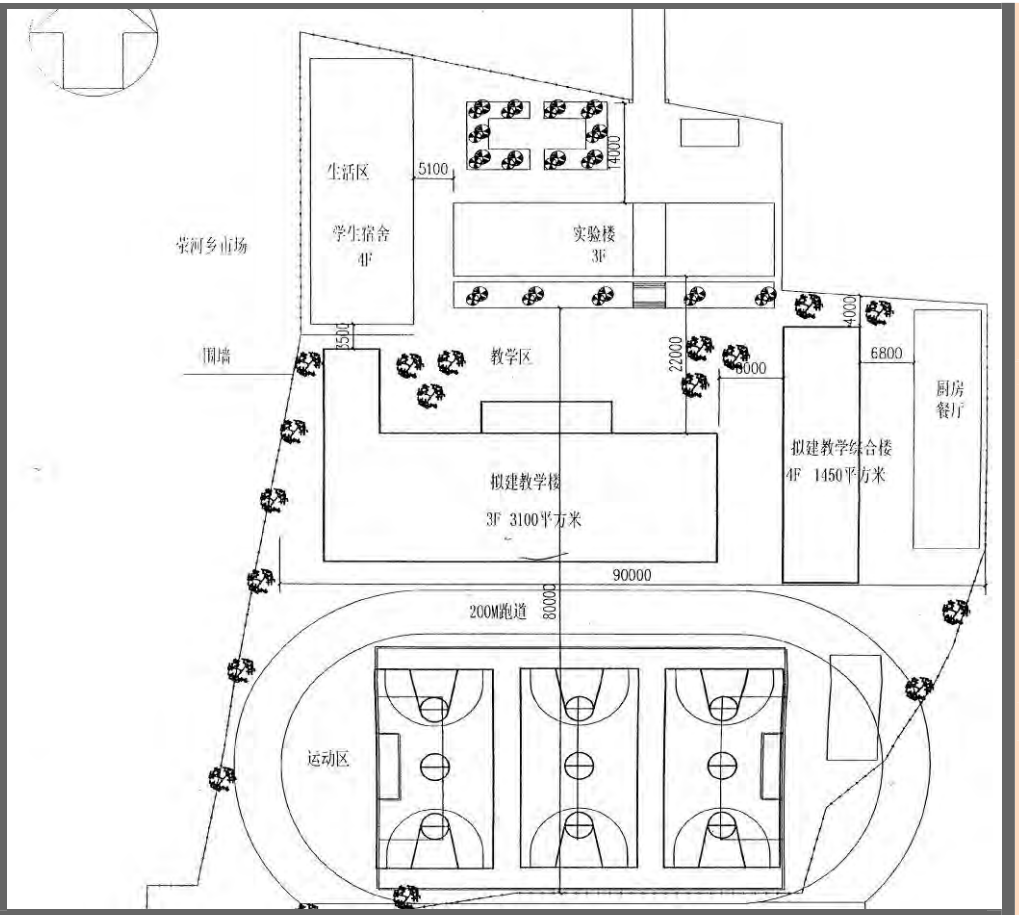

平面圖

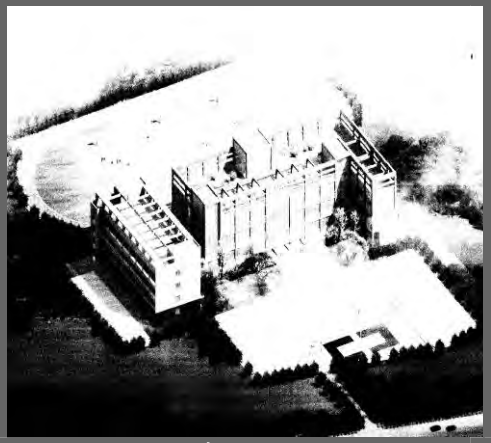

鳥瞰圖



受災情況

預計竣工

2011 年 8 月

最新進度

設計中

嚴橋三九學校

序號： 65

地點： 雅安市雨城區嚴橋鎮

估算： 921 萬元人民幣

受災情況

812 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：2,371 m^2
- 學生宿舍：1,617 m^2
- 運動場：7,277 m^2
- 設備：700 台/套/件。
- 圖書：7,200 冊
- 教學班：24 個
- 學生人數：1,100

目標受惠對象

區內 10,,000 人，適齡學生 1,100 人



平面圖



學生宿舍效果圖



教學樓效果圖

預計竣工

2010 年 9 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2009 年 12 月

涪江路小學

序號： 66

地點： 南充市順慶區

估算： 1,531 萬元人民幣

受災情況


6,000 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：5,200 m^2
- 辦公綜合樓：2,040 m^2
- 運動場：3,200 m^2
- 設備及儀器：11 套
- 圖書：24,000 冊
- 教學班：40 個
- 學生人數：1,800

目標受惠對象

區內三個社區 70,,000 人，其中的適齡學生

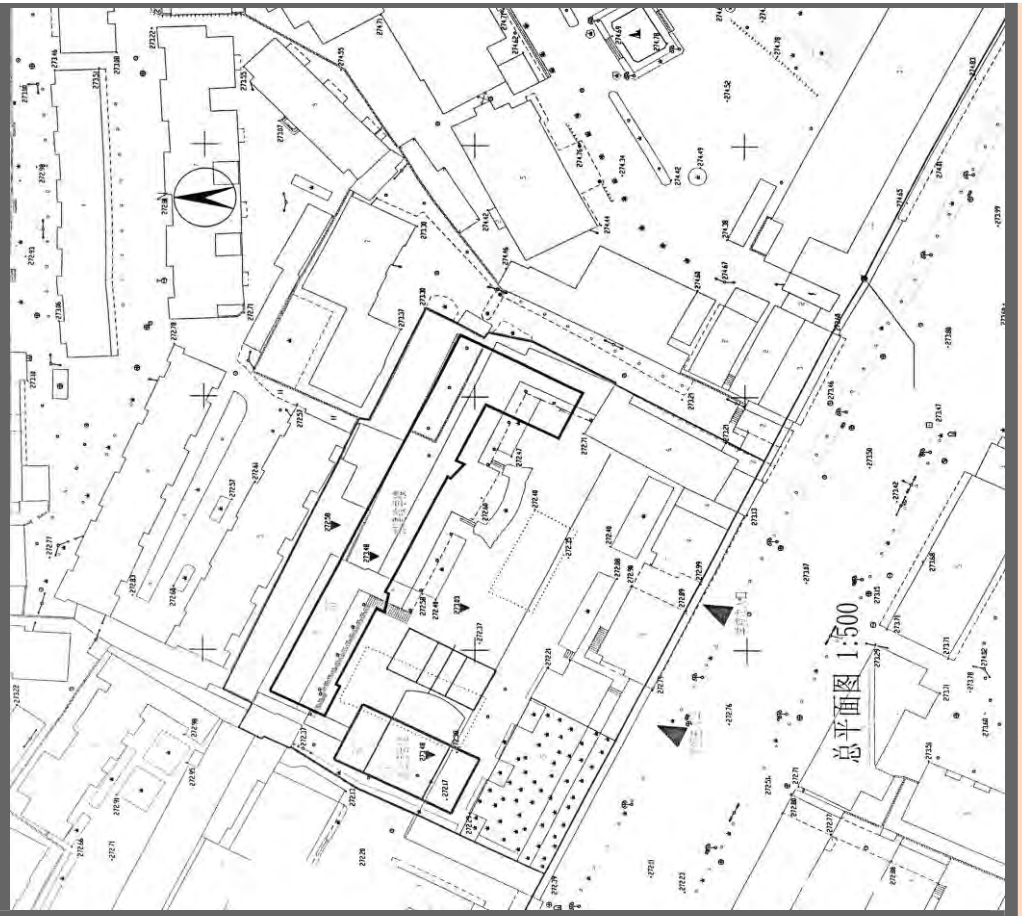

平面圖



效果圖



政務司司長出席開學禮

預計竣工

2010 年 5 月

最新進度

施工中：教學樓已竣工，辦公綜合樓正進行上蓋工程



2010 年 2 月



2010 年 1 月



2009 年 11 月

城北中學

序號： 67

地點： 雅安市石棉縣新棉鎮

估算： 1,074 萬元人民幣

受災情況


- 城北中學及迎政中學共 3,200 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 1,800 m^2 校舍被列為 C 級危房

重建規模

- 原址重建，合併城北中學及迎政中學
- 教學綜合樓：1,788 m^2
- 學生宿舍：2,670 m^2
- 運動場：5,665 m^2
- 教學設備：1,000 台/套/件
- 圖書：4,000 冊
- 教學班：33 個
- 學生人數：1,700

目標受惠對象

區內 30,,800 人，適齡學生 1,700 人

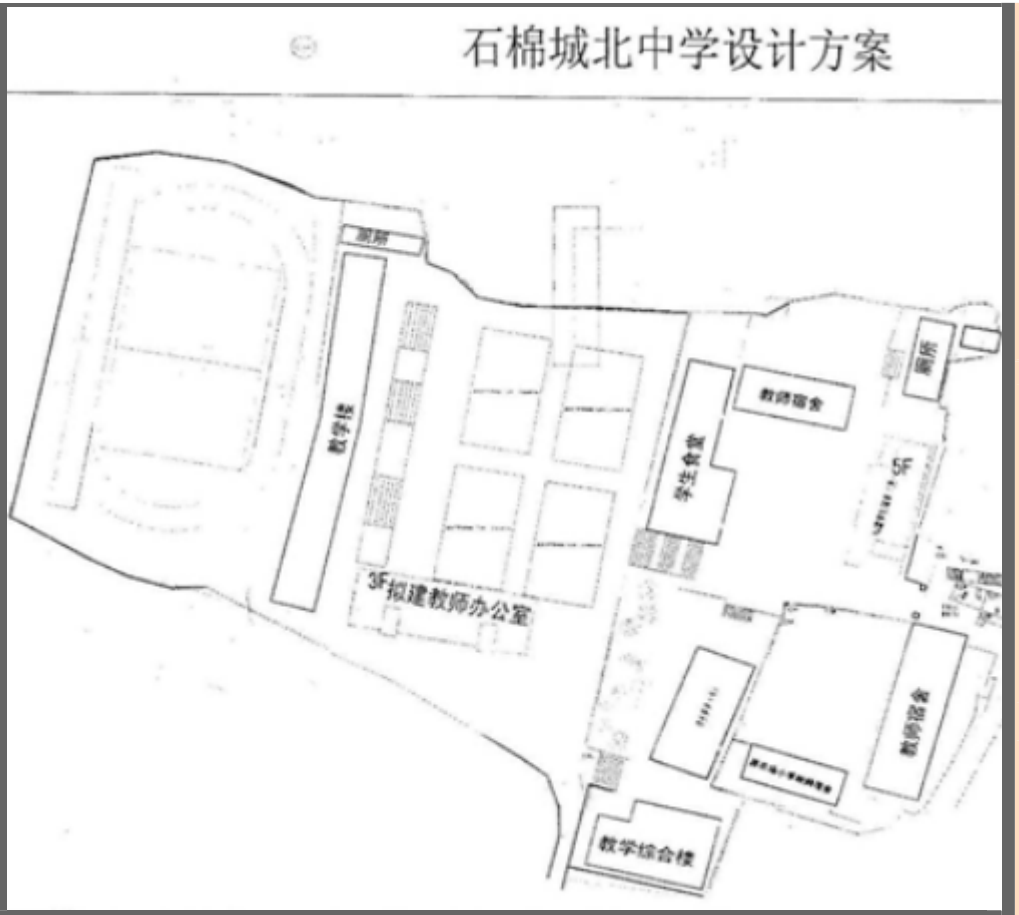

平面圖



受災情況



選址

預計竣工

2010 年 9 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2009 年 12 月

小河壩中學

序號： 68
地點： 雅安市石棉縣
估算： 1,044 萬元人民幣

受災情況


1,600 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：2,260 m^2
- 教師宿舍：1,048 m^2
- 學生食堂：1.365 m^2
- 運動場：5,000 m^2
- 教學設備：80 台/套/批
- 圖書：3,000 冊
- 教學班： 個
- 學生人數：
- 住宿人數：

目標受惠對象

區內 25,,000 人，適齡學生 800 人

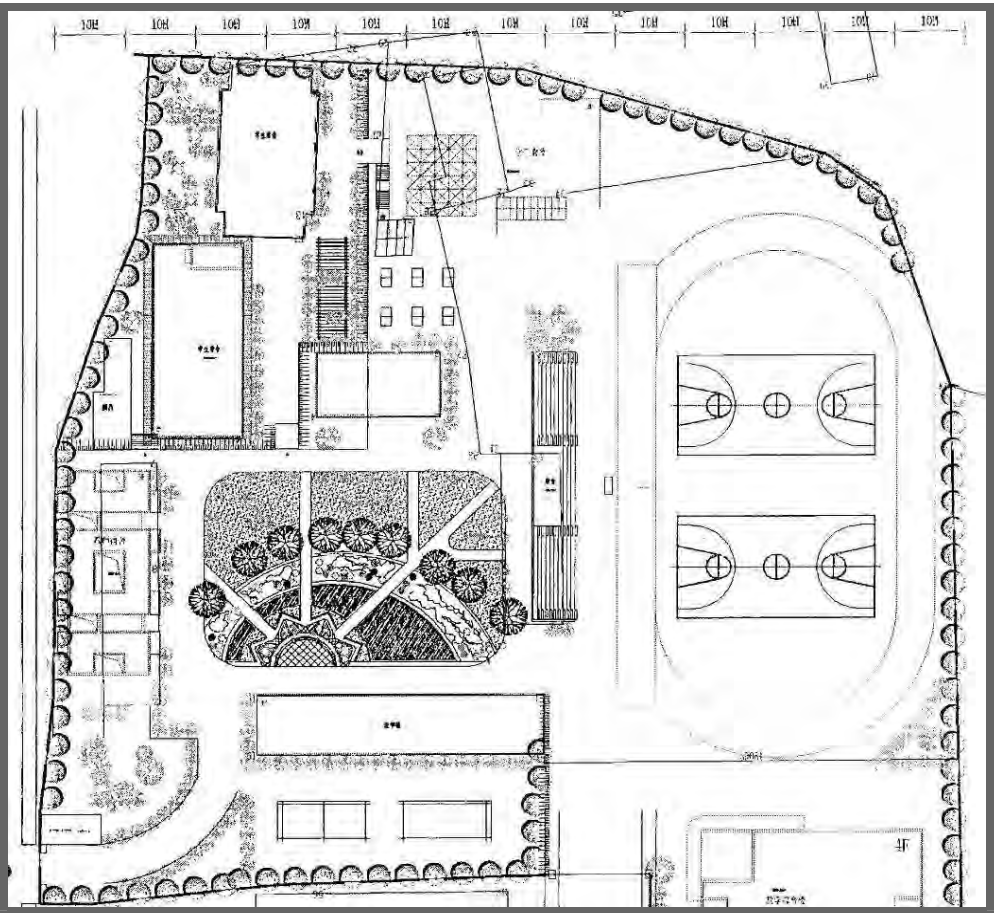

平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工
2010 年 9 月

最新進度
施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2009 年 12 月

永興鎮初級中學

序號： 69

地點： 雅安市名山縣永興鎮

估算： 1,294 萬元人民幣

受災情況


900 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：2,351 m^2
- 學生宿舍：2,190 m^2
- 學生食堂：850 m^2
- 教學設備：5,600 台/套/件。
- 圖書：8,400 冊
- 運動場：3,224 m^2
- 教學班：14 個
- 學生人數：700

目標受惠對象

區內永興鎮、紅岩鄉和雅安香花鄉 31,,000 人，適齡學生 250 人

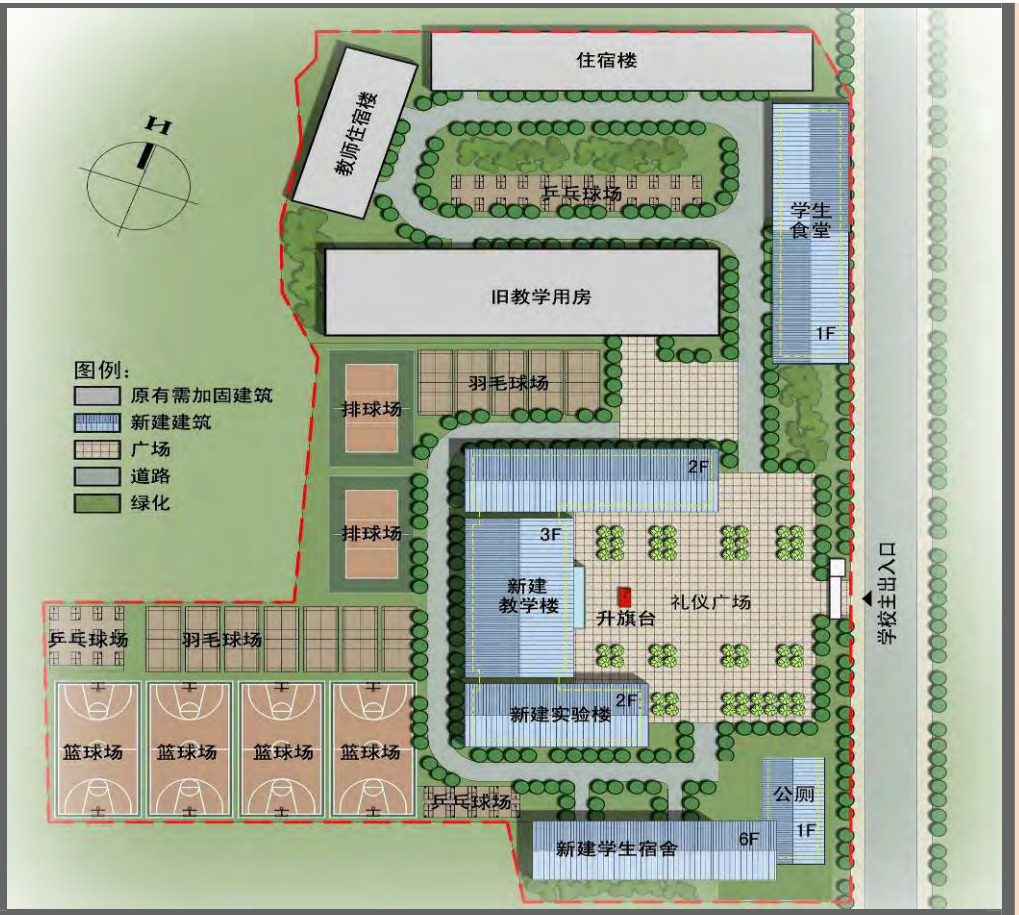

平面圖



選址



受災情況

預計竣工

2011 年 6 月

最新進度

設計中

巴中中學

序號： 70

地點： 巴中市巴州區

估算： 3,110 萬元人民幣

受災情況


- 7,764 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 12,088 m^2 校舍被列為 C 級危房

重建規模


- 原址重建
- 教學樓：5,167 m^2
- 辦公樓：3,361 m^2
- 活動中心/食堂：1,002 m^2
- 宿舍：1,770 m^2
- 運動場：33,090 m^2
- 維修花園 1,600 m^2、圍牆 200m
- 圖書：5,000 冊
- 設備及儀器：2,300 台/套/件
- 教學班：180 個
- 學生人數：9,000
- 住宿人數：4,700

目標受惠對象


區內 1,300,,000 人，適齡學生 200,000 人

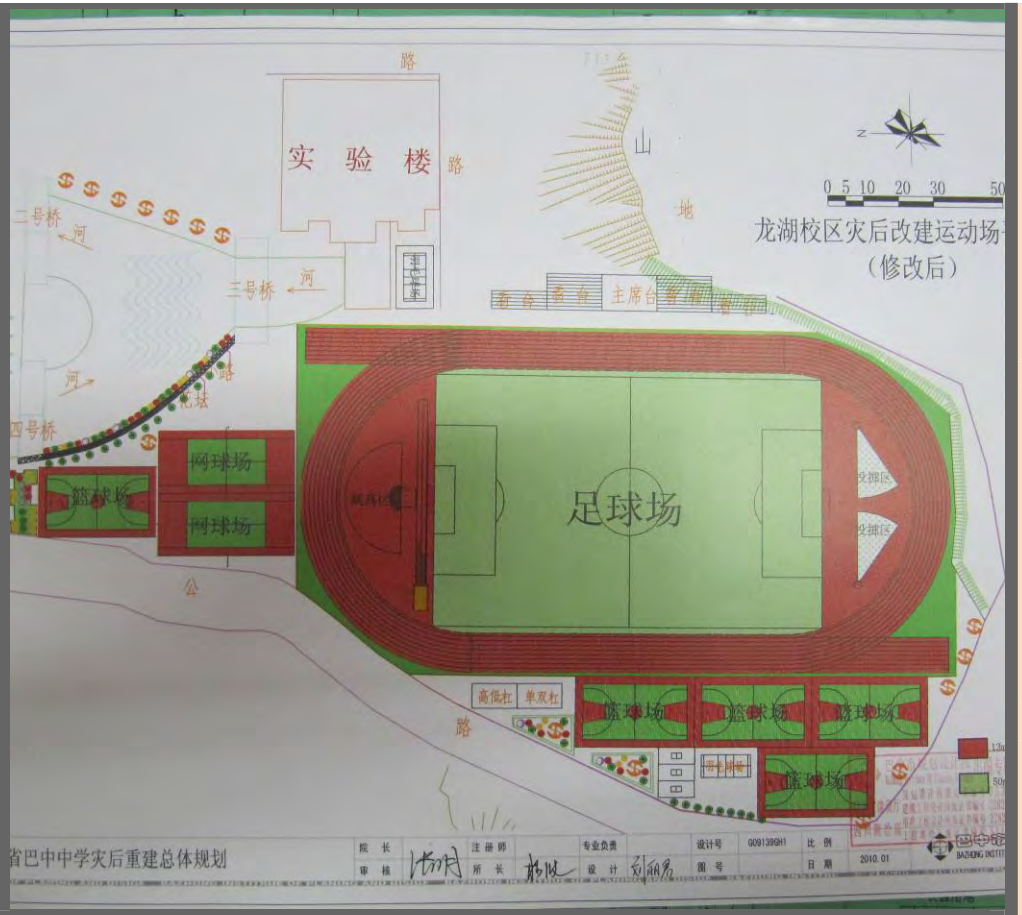

平面圖

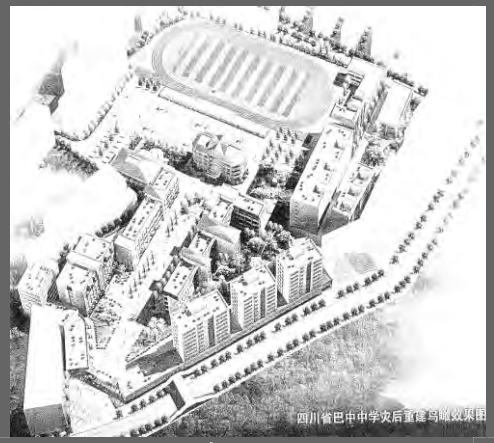

鳥瞰圖

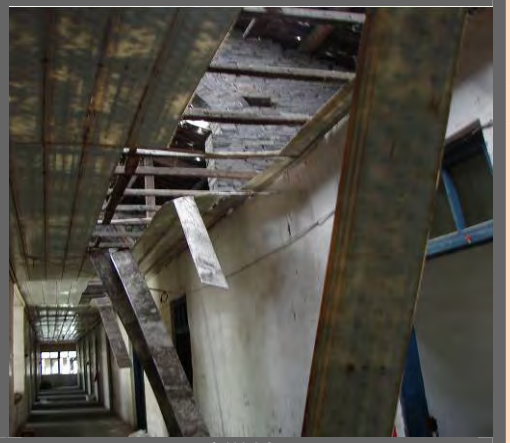

受災情況

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 4 月

巴州區第一小學

序號： 71

地點： 巴中市巴州區

估算： 2,239 萬元人民幣

受災情況

2,300 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：5,764 m^2
- 輔助教室：3,490 m^2
- 運動場：4,173 m^2
- 設備及儀器配置：3,200 台/套/件
- 圖書：30,000 冊
- 教學班：76 個
- 學生人數：4,300

目標受惠對象

區內 60,000 人，適齡學生 8,000 人



平面圖



效果圖



受災情況

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 1 月

玉井鄉中心小學校

序號： 72

地點： 巴中市巴州區

估算： 1,468 萬元人民幣

受災情況


6,000 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：2,261 m^2
- 綜合樓：1,409 m^2
- 宿舍：1,840 m^2
- 食堂：1,066 m^2
- 運動場：3,000 m^2
- 教學班：44 個
- 學生人數：2,000
- 住宿人數：600

目標受惠對象

區內 20,000 人，適齡學生 1,700 人

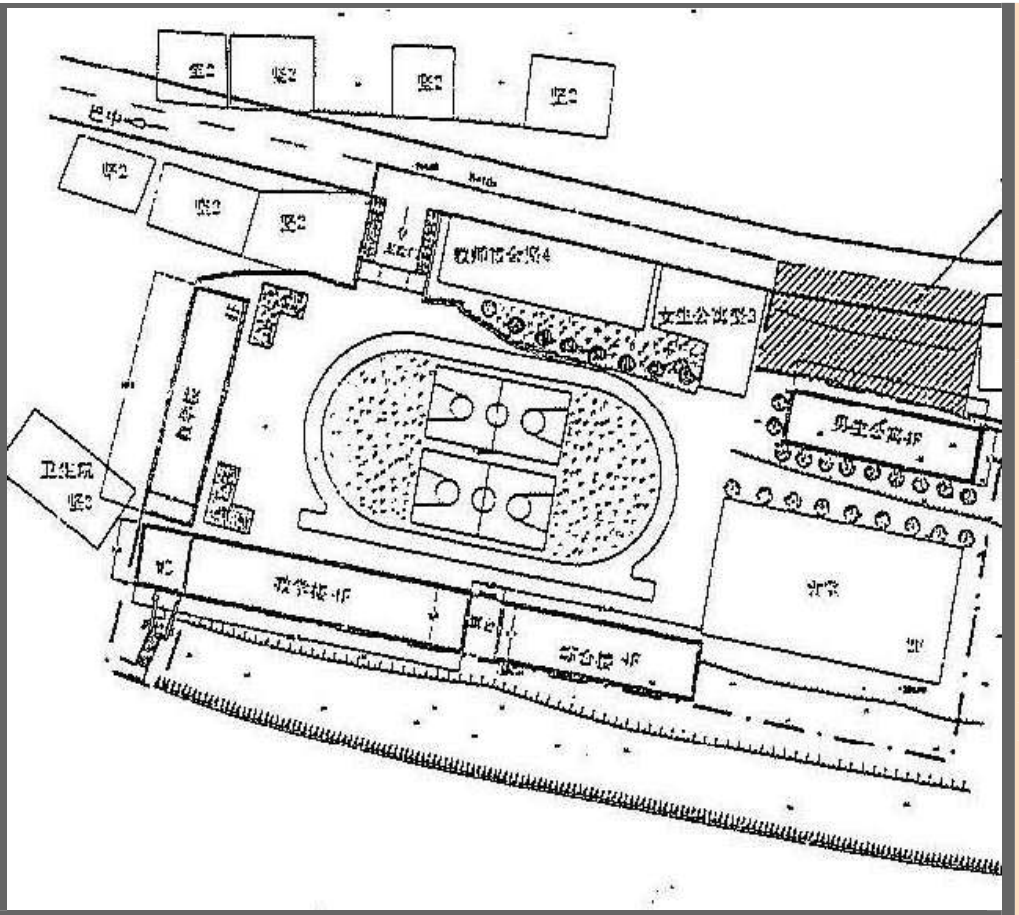

平面圖



鳥瞰圖



選址

預計竣工

2011 年 1 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

邱家小學

序號： 73

地點： 巴中市平昌縣邱家鎮

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況


- 1,100 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 936 m^2 校舍需維修加固

重建規模


- 原址重建
- 教學樓：1,845 m^2
- 綜合樓：1,128 m^2
- 辦公樓：1,124 m^2
- 學生宿舍：932 m^2
- 運動場：2,616 m^2
- 維修加固：936 m^2
- 電腦：80 台
- 課桌椅：1,200 套
- 圖書：20,000 冊
- 教學班：40 個
- 學生人數：1,800

目標受惠對象

區內 20,000 人，適齡學生 2,700 人

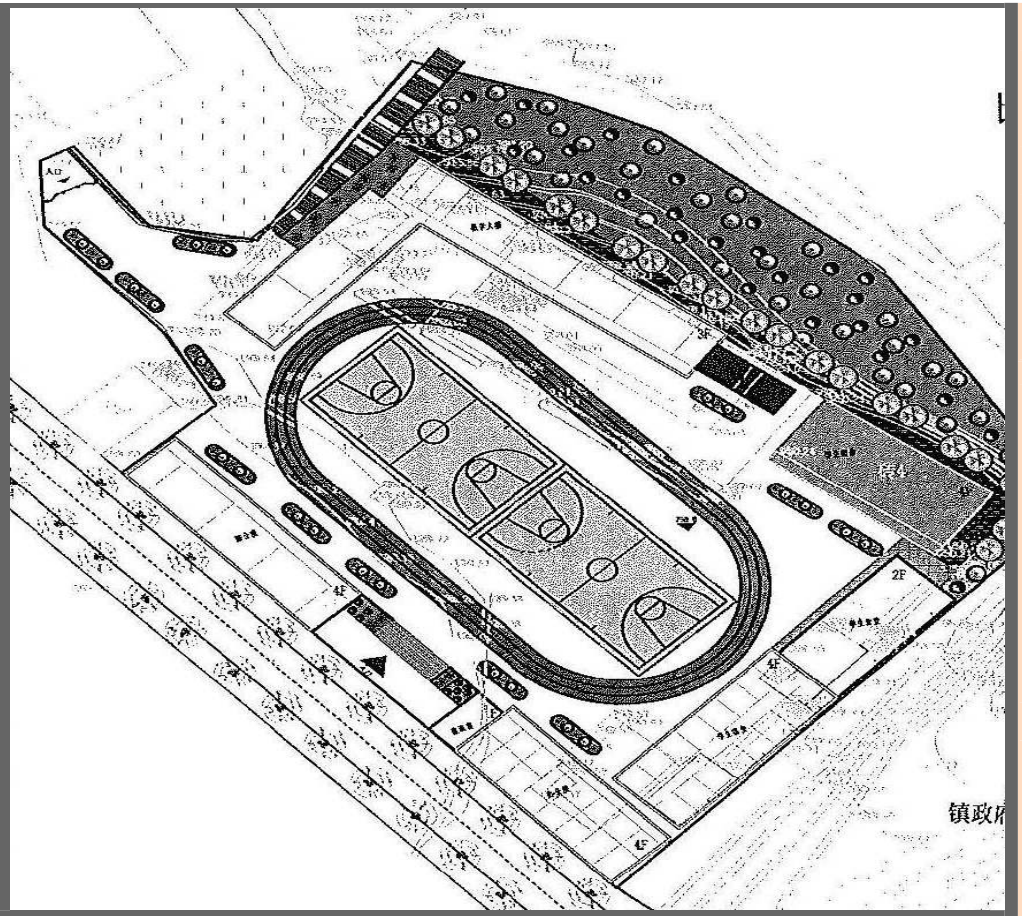

平面圖

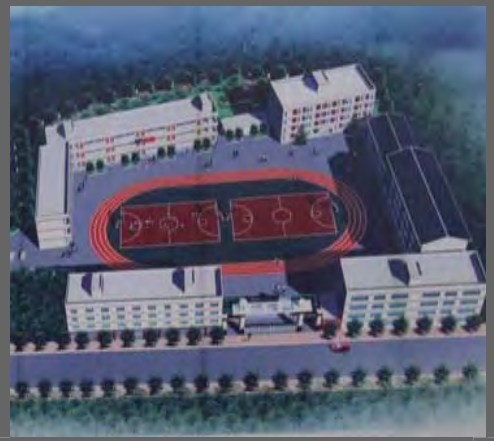

鳥瞰圖



原校舍

預計竣工

2010 年 11 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

平昌縣第二中學

序號： 74

地點： 巴中市平昌縣江口鎮

估算： 1,885 萬元人民幣

受災情況


13,145 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：7,588 m^2
- 學生食堂：2,100 m^2
- 教學班：133 個
- 學生人數：6,600
- 住宿人數：2,000

目標受惠對象

區內 1,030,000 人，適齡學生 2,500 人

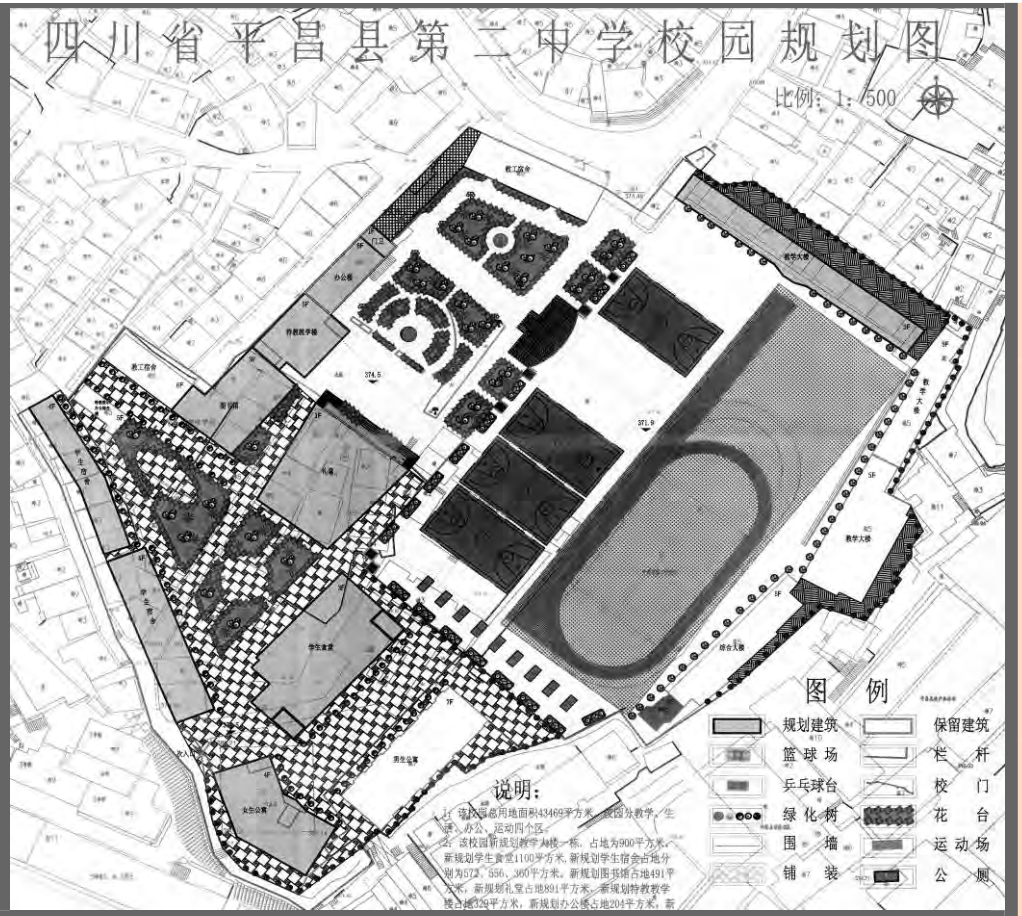

平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

平昌中學

序號： 75

地點： 巴中市平昌縣江口鎮

估算： 1,898 萬元人民幣

受災情況


8,708 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：6,550 m^2
- 女生宿舍：3,200 m^2
- 教學班：148 個
- 學生人數：7,400

目標受惠對象

區內 1,019,000 人，適齡學生 8,800 人

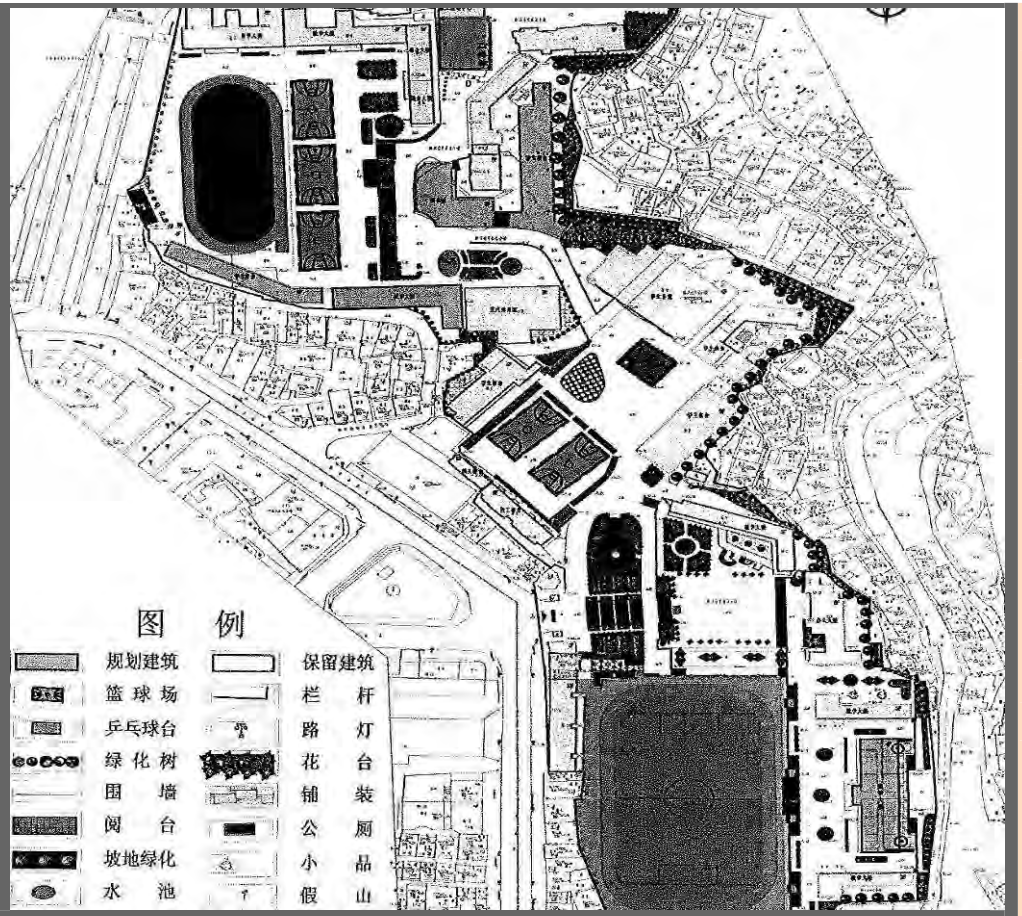

平面圖



效果圖



效果圖

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中：正進行地基及上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

平昌縣實驗小學

序號： 76

地點： 巴中市平昌縣江口鎮

估算： 1,500 萬元人民幣

受災情況

3,600 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學綜合樓：8,330 m^2
- 教學班：76 個
- 學生人數：3,400

目標受惠對象

區內 80,000 人，適齡學生 4,500 人



平面圖



效果圖



原教學樓

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 4 月

麻石鎮中心小學

序號： 77

地點： 巴中市通江縣麻石鎮

估算： 1,713 萬元人民幣

受災情況


- 2,300 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 600 m^2 校舍需維修加固

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：5,136 m^2
- 學生宿舍及食堂：3,484 m^2
- 運動場：4,000 m^2
- 維修加固：600 m^2
- 教學班：30 個
- 學生人數：1,500
- 住宿人數：1,000

目標受惠對象

區內 28,000 人，適齡學生 2,000 人

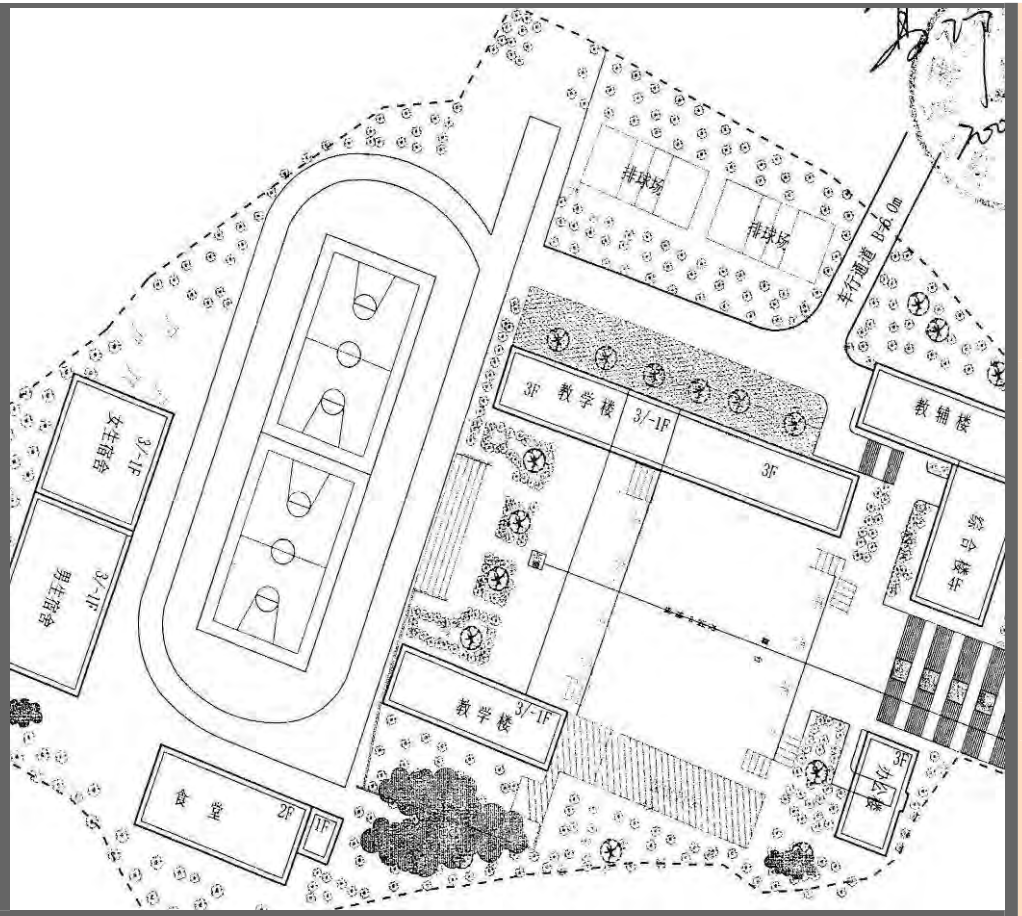

平面圖



鳥瞰圖



舊校舍

預計竣工

2011 年 4 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

通江縣第二中學

序號： 78

地點： 巴中市通江縣諾江鎮

估算： 3,798 萬元人民幣

受災情況


4,800 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 異址重建
- 教學樓：3,060 m^2
- 實驗綜合樓：3,050 m^2
- 圖書樓：3,890 m^2
- 學生宿舍：8,000 m^2
- 運動場：13,600 m^2
- 設備及教學儀：8,000 台/套/架
- 圖書：80,000 冊。
- 教學班：116 個
- 學生人數：5,800
- 住宿人數：4,300

目標受惠對象

區內 740,000 人，其中的適齡學生

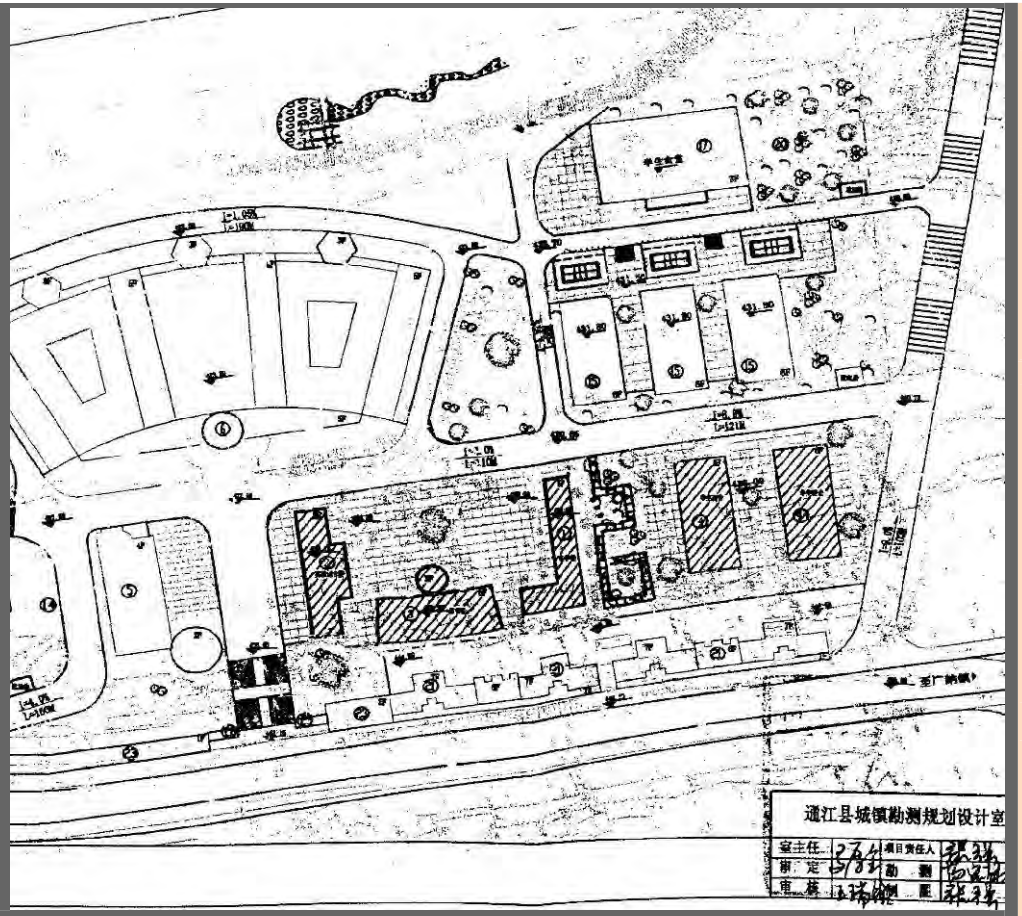

平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

馬鞍中學

序號： 79

地點： 南充市儀隴縣馬鞍鎮

估算： 950 萬元人民幣

受災情況

4,200 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模


- 原址重建
- 教學樓：2,500 m^2
- 學生宿舍：1,500 m^2
- 運動場：16,000 m^2
- 教學儀器及配套設備：1,600 台/套/件
- 教學班：112 個
- 學生人數：6,000

目標受惠對象

區內 300,000 人，其中的適齡學生



平面圖

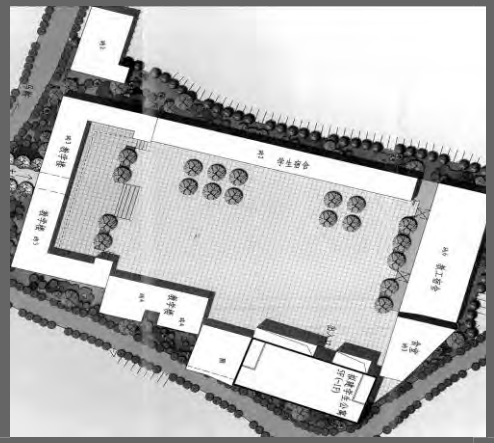

平面圖



受災情況

預計竣工

2010 年 7 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2009 年 12 月



2009 年 11 月


新政初級中學

序號： 80
地點： 南充市儀隴縣新政鎮
估算： 960 萬元人民幣

受災情況
5,000 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模
- 原址重建
- 綜合樓：1,000 m^2
- 學生宿舍：4,000 m^2
- 教學班：46 個
- 學生人數：2,500

目標受惠對象
區內 80,000 人，適齡學生 3,000 至 4,000 人

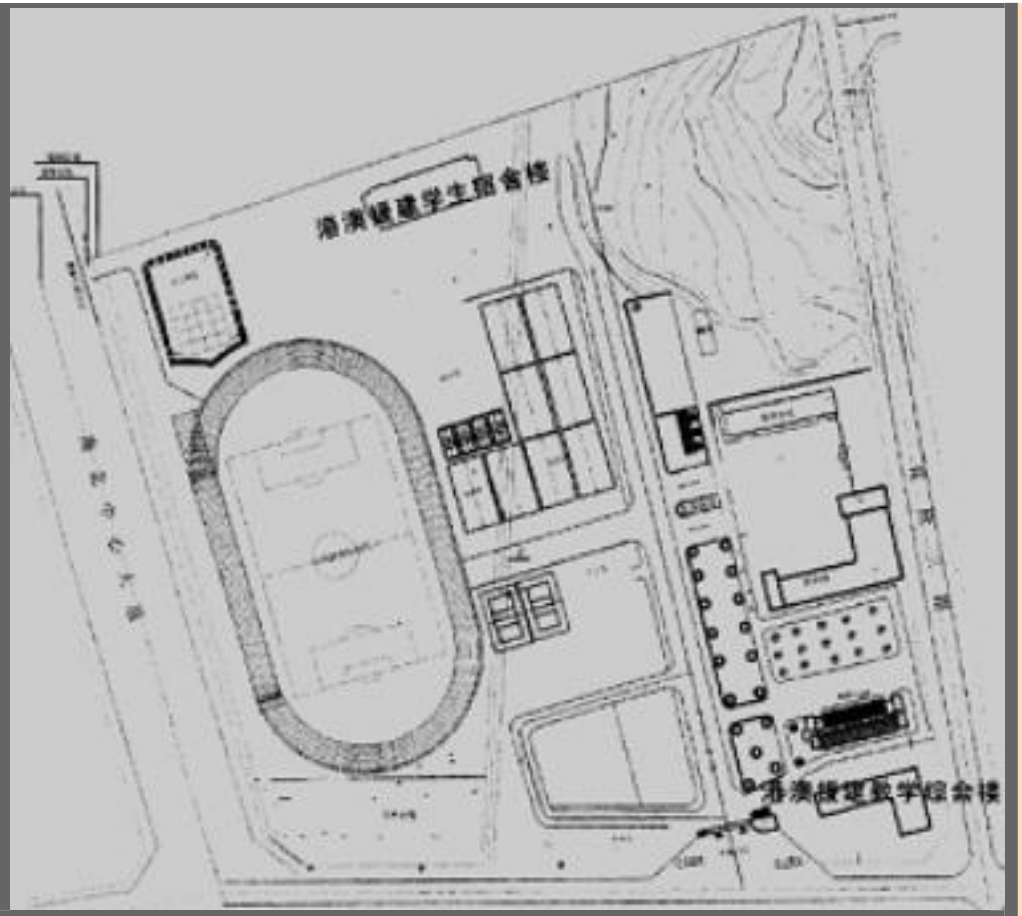

平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工
2010 年 8 月

最新進度
施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 2 月



2009 年 12 月

西罡學校

序號： 81

地點： 達州市通川區西河路

估算： 813 萬元人民幣

受災情況


- 3,100 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 1,300 m^2 運動場被列為 C 級危房
- 500 m^2 實驗樓被列為 B 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：5,126 m^2
- 維修加固：3,650 m^2
- 設備及儀器：2,100 台/套/件
- 圖書：20,000 冊
- 教學班：40 個
- 學生人數：2,400

目標受惠對象

區內 80,000 人，適齡學生 3,000 人

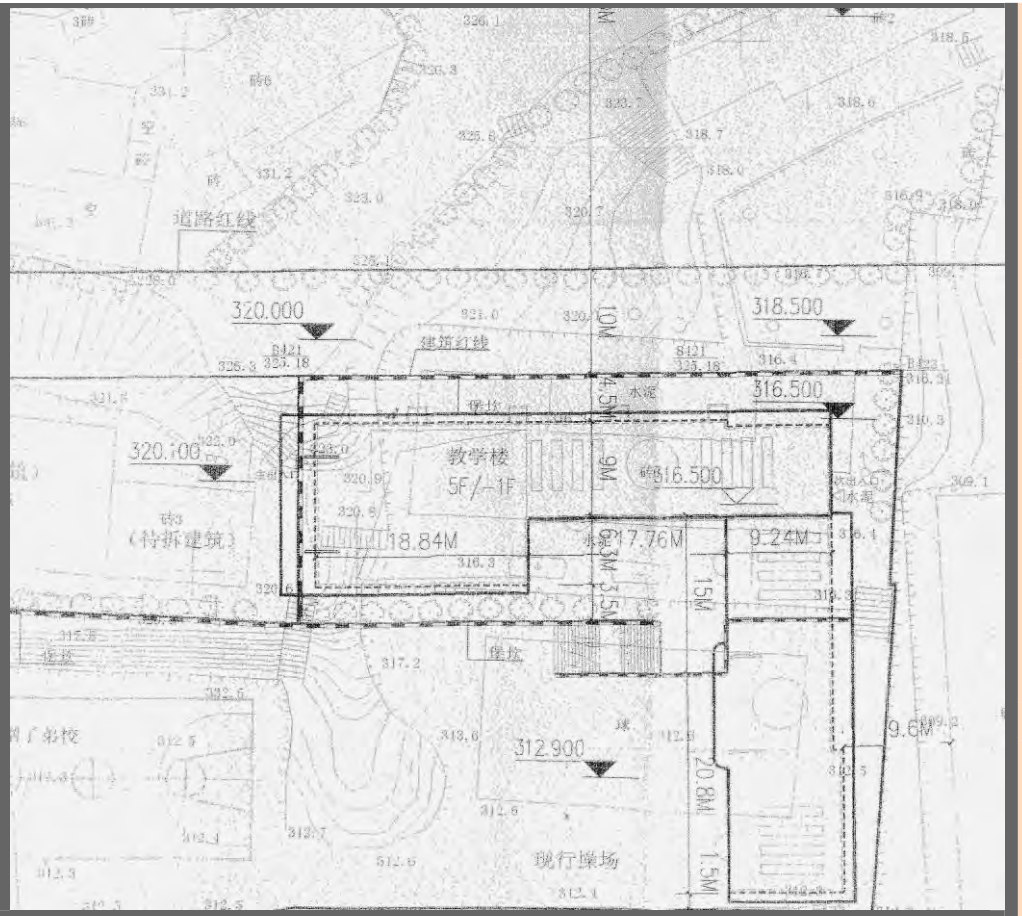

平面圖



效果圖



受災情況

預計竣工

2010 年 5 月

最新進度

教學樓已竣工，維修加固工程接近完成



2010 年 4 月



2009 年 10 月



2009 年 6 月

北外中心校

序號： 82

地點： 達州市通川區北外鎮

估算： 1,050 萬元人民幣

受災情況


2,500 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：3,770 m^2
- 宿舍樓：730 m^2
- 運動場：2,069 m^2
- 設備及儀器配置：800 台/套/件
- 圖書：10,000 冊。
- 教學班：24 個
- 學生人數：1,100
- 住宿人數：

目標受惠對象

區內 25,000 人，適齡學生 2,000 人

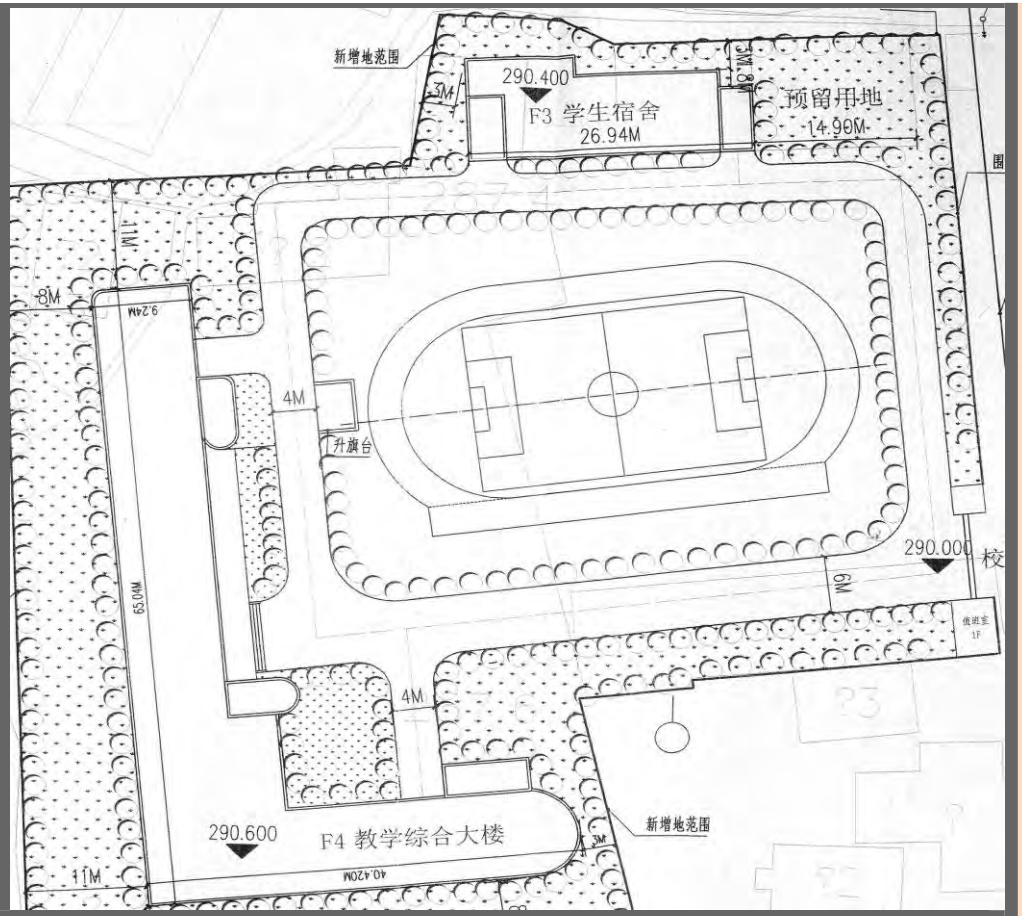

平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 4 月

渠縣中學

序號： 83

地點： 達州市渠縣渠江鎮

估算： 1,620 萬元人民幣

受災情況


5,347 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：8,906 m^2
- 教學班：114 個
- 學生人數：6,200

目標受惠對象

區內 60 個鄉鎮、500 個行政村 1,4200, ,000 人，適齡學生 180,000 人

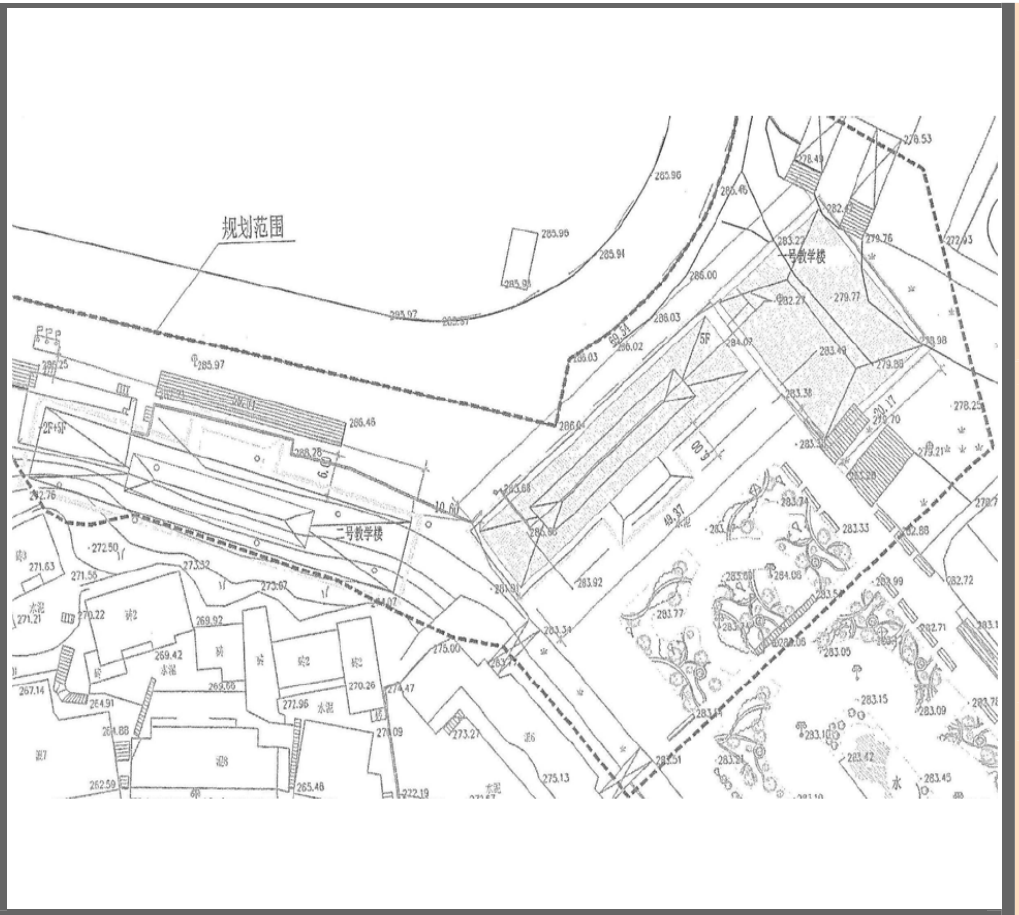

平面圖



效果圖



效果圖

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 1 月

石棉縣幼兒園

序號： 85

地點： 雅安市石棉縣新棉鎮

估算： 1,116 萬元人民幣

受災情況


1,800 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模


- 原址重建
- 校舍：5,800 m^2
- 室外遊戲場：1,500 m^2
- 設備：700 台/套
- 教學班：27 個
- 學生人數：800

目標受惠對象


區內 41,000 人，適齡學生 1,500 人

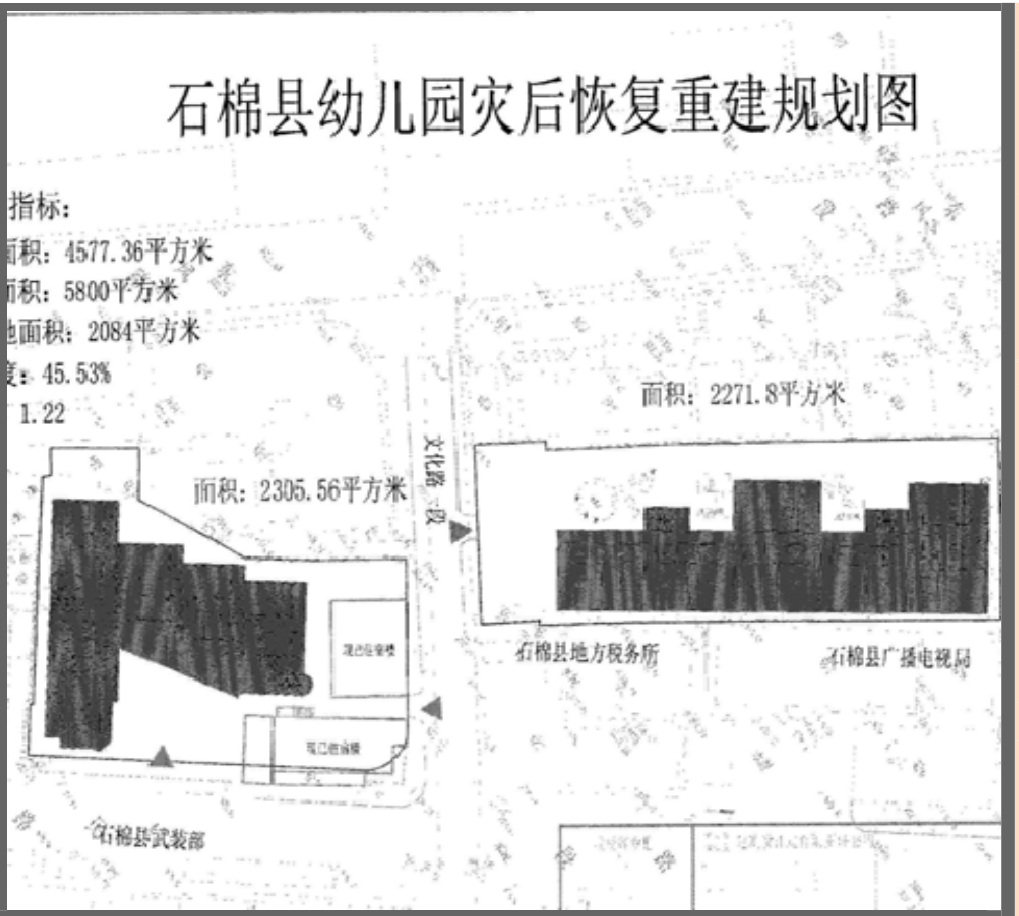

平面圖

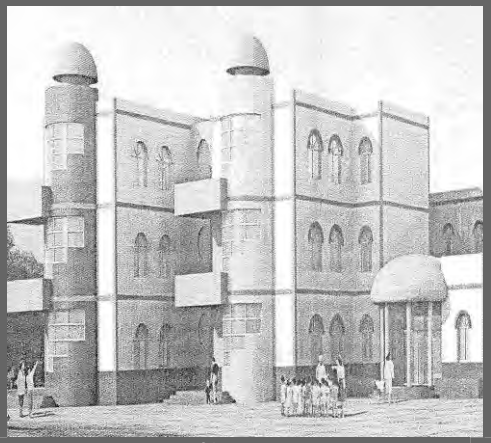

效果圖

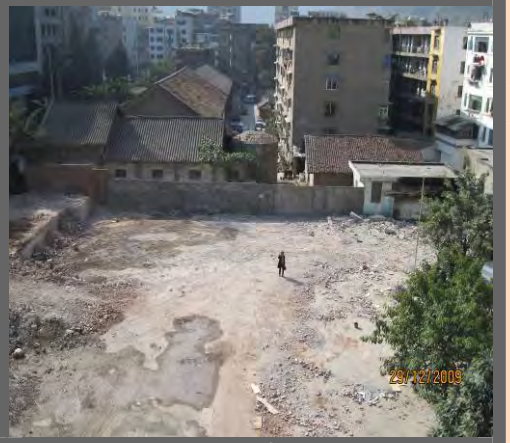


選址

預計竣工

2010 年 9 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程

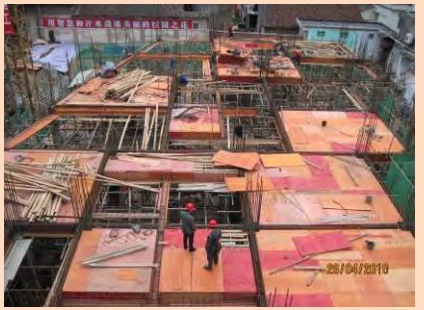

2010 年 4 月



2010 年 4 月



2009 年 12 月

恩陽中學

序號： 86

地點： 巴中市巴州區恩陽鎮

估算： 4,712 萬元人民幣

受災情況

- 900 m^2 校舍倒塌
- 1,729 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 1,500 m^2 校舍被列為 C 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：10,018 m^2
- 學生宿舍：6,720 m^2
- 師生食堂：3,610 m^2
- 德育展覽室：509 m^2
- 運動場：17,140 m^2
- 設備、桌椅及儀器：8,700 台/套/件
- 圖書：50,000 冊。
- 教學班：100 個
- 學生人數：5,000
- 住宿人數：2,700

目標受惠對象


區內 600,000 人，其中的適齡學生



平面圖



鳥瞰圖

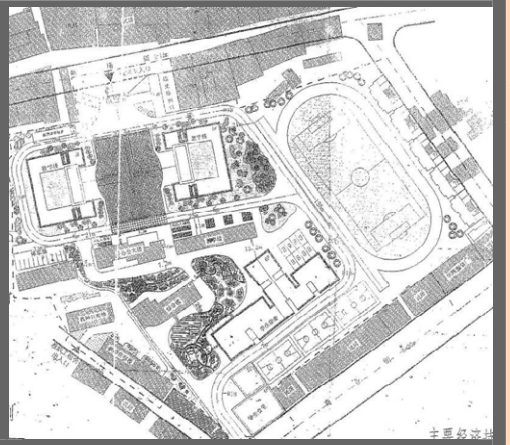

平面圖

預計竣工

2011 年 3 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2010 年 1 月

巴州區第四中學

序號： 87

地點： 巴中市巴州區

估算： 4,845 萬元人民幣

受災情況

3,276 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學實驗樓：6,669 m^2
- 辦公用樓：5,035 m^2
- 學生食堂綜合樓：3,856 m^2
- 學生宿舍：10,036 m^2
- 運動場：14,454 m^2
- 設備及教學儀器：23,200 套/件
- 圖書：40,000 冊。
- 教學班：72 個
- 學生人數：3,600

目標受惠對象


區內 73,000 人，適齡學生 5,000 人



平面圖



鳥瞰圖

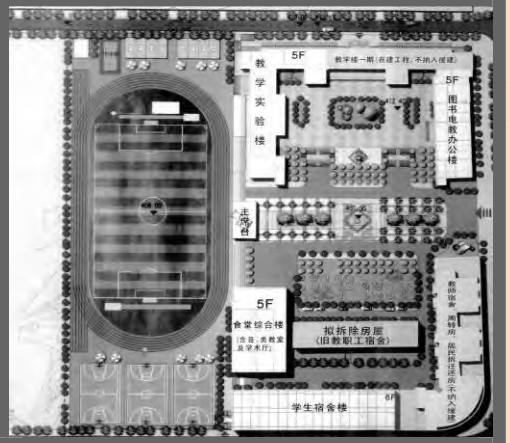

平面圖

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 4 月

朝陽中學

序號： 88

地點： 巴中市南江縣

估算： 3,180 萬元人民幣

受災情況


- 11,000 m^2 校舍受損
- 700m^2 校舍被列為 D 級危房
- 1,045m^2 校舍被列為 C 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：4,000 m^2
- 實驗樓：3,400 m^2
- 學生宿舍：4,000 m^2
- 學生食堂：2,000 m^2
- 運動場：8,000 m^2
- 設備及儀器：8,100 台/套/件
- 圖書：30,000 冊
- 教學班：30 個
- 學生人數：1,500
- 住宿人數：1,500

目標受惠對象

區內 48 個鄉鎮，適齡學生 1,800 人

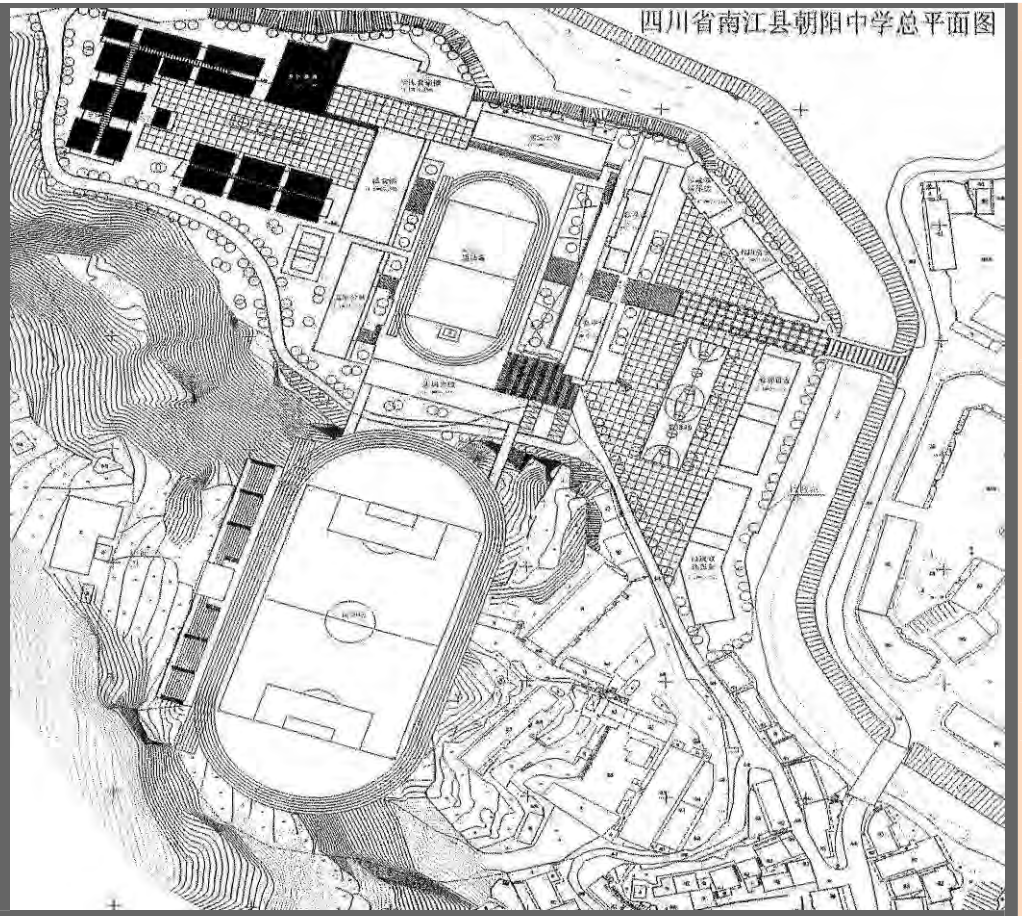

平面圖



鳥瞰圖





立面圖

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 3 月

南部中學

序號： 89

地點： 南充市南部縣南隆鎮

估算： 4,900 萬元人民幣

受災情況

- 6,600 m^2 校舍被列為危房
- 學生宿舍、教學樓等被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：6,000 m^2
- 學生宿舍樓：12,000 m^2
- 綜合辦公樓：2,000 m^2
- 學生食堂：2,250 m^2
- 運動場：15,000 m^2
- 設備及儀器：11,200 台/套/件
- 圖書：40,000 冊
- 教學班：19 個
- 學生人數：9,800
- 住宿人數：5,200

目標受惠對象

區內 1,500,000 人，其中的適齡學生



平面圖



效果圖



效果圖

預計竣工

2011 年 5 月

最新進度

招標中

綿陽中學

序號： 90

地點： 綿陽市劍門路西段

估算： 7,436 萬元人民幣

受災情況


- 42,185 m^2 校舍被列為 D 級危房
- 48,900 m^2 校舍被列為 C 級危房

重建規模

- 原址重建
- 學生宿舍樓：12,950 m^2
- 食堂：6,500 m^2
- 圖書館：8,500 m^2
- 籃球場：7,500 m^2
- 運動場：35,000 m^2
- 教學班：170 個
- 學生人數：11,000
- 住宿人數：10,000

目標受惠對象

全省的適齡學生

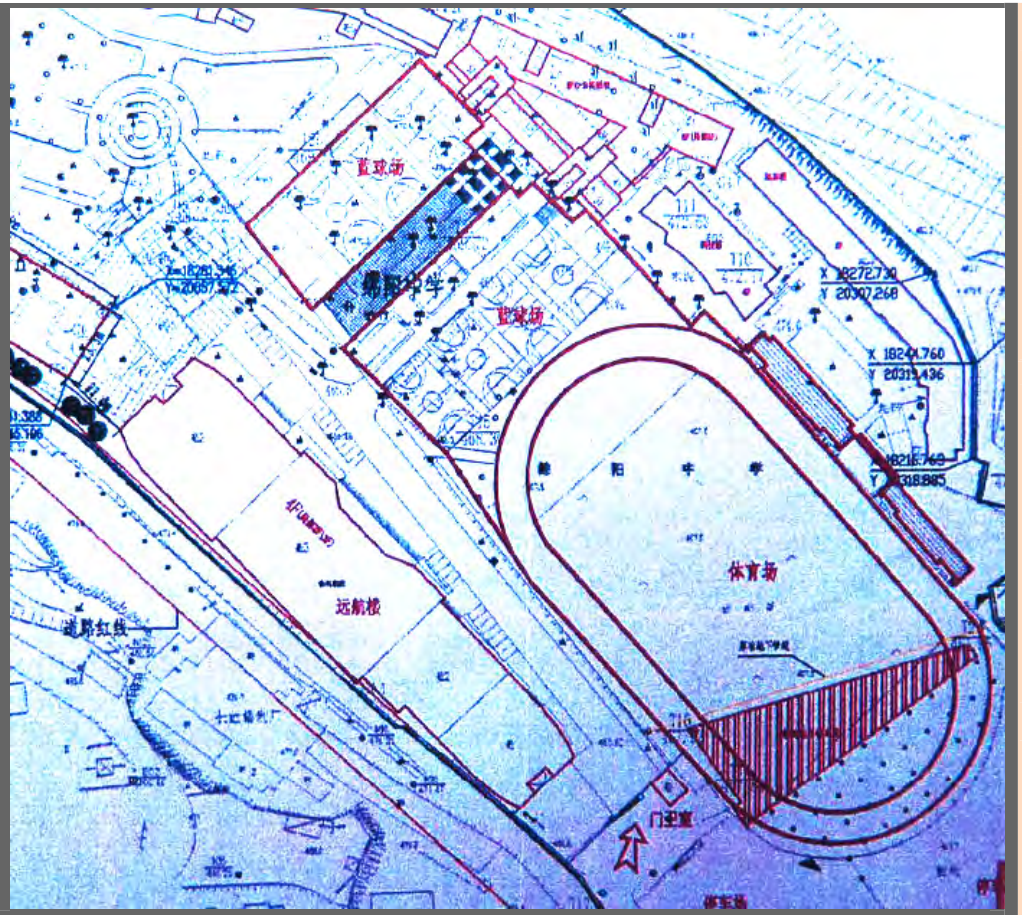

平面圖



效果圖



效果圖

預計竣工

2010 年 9 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 1 月

儀隴中學

序號： 91

地點： 南充市儀隴縣金城鎮/新政鎮

估算： 3,600 萬元人民幣

受災情況

- 13,195 m^2 校舍倒塌
- 4,218m^2 校舍被列為 D 級危房
- 12,900m^2 校舍需維修加固

重建規模


- 原址重建
- 教學樓：5,000 m^2
- 學生宿舍：5,000 m^2
- 學生食堂：3,500 m^2
- 維修加固：12,900 m^2
- 教學設備儀器：900 台/套
- 圖書：50,000 冊
- 教學班：235 個
- 學生人數：12,500

目標受惠對象

區內 520,000 人，其中的適齡學生



平面圖

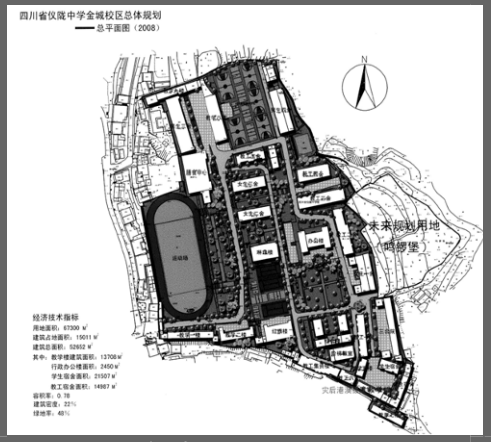

金城校區平面圖



選址

預計竣工

2010 年 8 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 2 月



2010 年 2 月



2009 年 12 月

小河職業中學

序號： 92

地點： 巴中市南江縣東榆鎮街

估算： 4,600 萬元人民幣

受災情況


2,600 m^2 教學樓及 1,300 m^2 女生宿舍被列為 C 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：8,091 m^2
- 學生宿舍：7,469 m^2
- 實驗樓：7,740 m^2
- 教學班：120 個
- 學生人數：4,500
- 住宿人數：4,300

目標受惠對象

區內 48 個鄉鎮約 655,000 人，適齡學生每年約 4,000 人

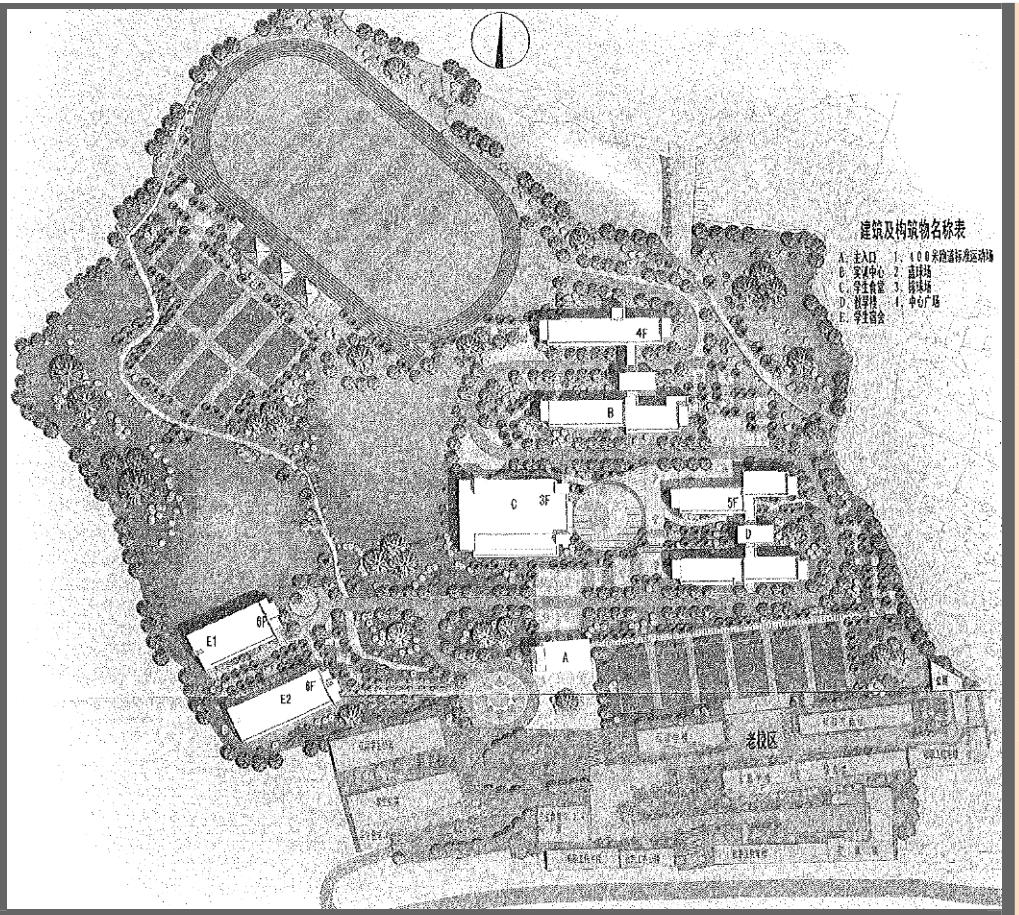

平面圖



鳥瞰圖



鳥瞰圖

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：正進行地基工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 1 月

蘆山縣初級中學

序號： 93
地點： 雅安市蘆山縣蘆陽鎮
估算： 3,137 萬元人民幣

受災情況
5,000 m^2 校舍被列為 D 級危房


重建規模
- 原址重建
- 教學綜合樓：8,000 m^2
- 學生宿舍：4,000 m^2
- 學生食堂：1,800 m^2
- 運動場：8,451 m^2
- 維修加固：200 m^2
- 儀器設備：1,000 套
- 圖書資料：60,000 冊
- 維修儀器設備 1 套
- 教學班：42 個
- 學生人數：2,100
- 住宿人數：1,500

目標受惠對象
區內 9 個鎮 123,000 人口，適齡學生每年約 6,500 人



平面圖


鳥瞰圖

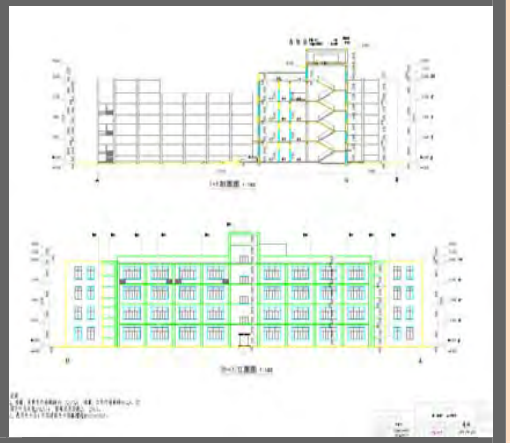
立面圖

預計竣工
2011 年 1 月

最新進度
施工中：正進行上蓋工程


2010 年 4 月


2010 年 4 月


2010 年 2 月

白塔中學

序號： 94

地點： 南充市高坪區高坪鎮

估算： 3,496 萬元人民幣

受災情況

8,800 m^2 校舍被列為 D 級危房

重建規模

- 原址重建
- 教學樓：11,200 m^2
- 學生宿舍：7,000 m^2
- 設備及儀器配置：1,500 台/件
- 教學班：122 個
- 學生人數：6,100
- 住宿人數：3,200

目標受惠對象


區內 454 個鄉鎮 7,200,000 人，其中的適齡學生



平面圖



立面圖

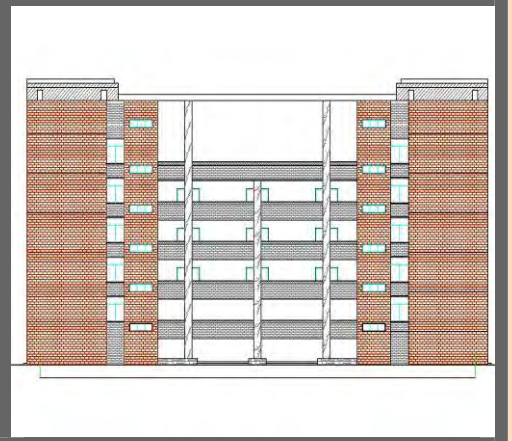

立面圖

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

設計中

朝天區社會福利綜合服務中心

序號： 8

地點： 廣元市朝天鎮

估算： 2,998 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”，區內社會福利院、殘疾人康復中心及社區衛生服務中心受嚴重破壞。同時，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 社會福利院：2,000 m^2
- 殘疾人康復中心：3,300 m^2
- 社區衛生服務中心：3,436 m^2

目標受惠對象

區內孤寡老人及兒童約 2,760 人，殘疾人士約 16,800 人及居民約 207,8000 人



「殘疾人康復中心」平面圖



「社會福利院」效果圖



「殘疾人康復中心」效果圖

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 2 月



2009 年 10 月

元壩區社會福利綜合服務中心

序號： 9

地點： 廣元市元壩鎮

估算： 2,989 萬元人民幣

受災情況


5.12“汶川特大地震”，區內社會福利設施受嚴重破壞。同時，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 社會福利院：
  建築面積 4,000 m^2
- 殘疾人康復中心：3,300 m^2
- 食堂：600 m^2
- 運動場：1,600 m^2

目標受惠對象


區內五保人士約 1,100 人及殘疾人士約 16,000 人

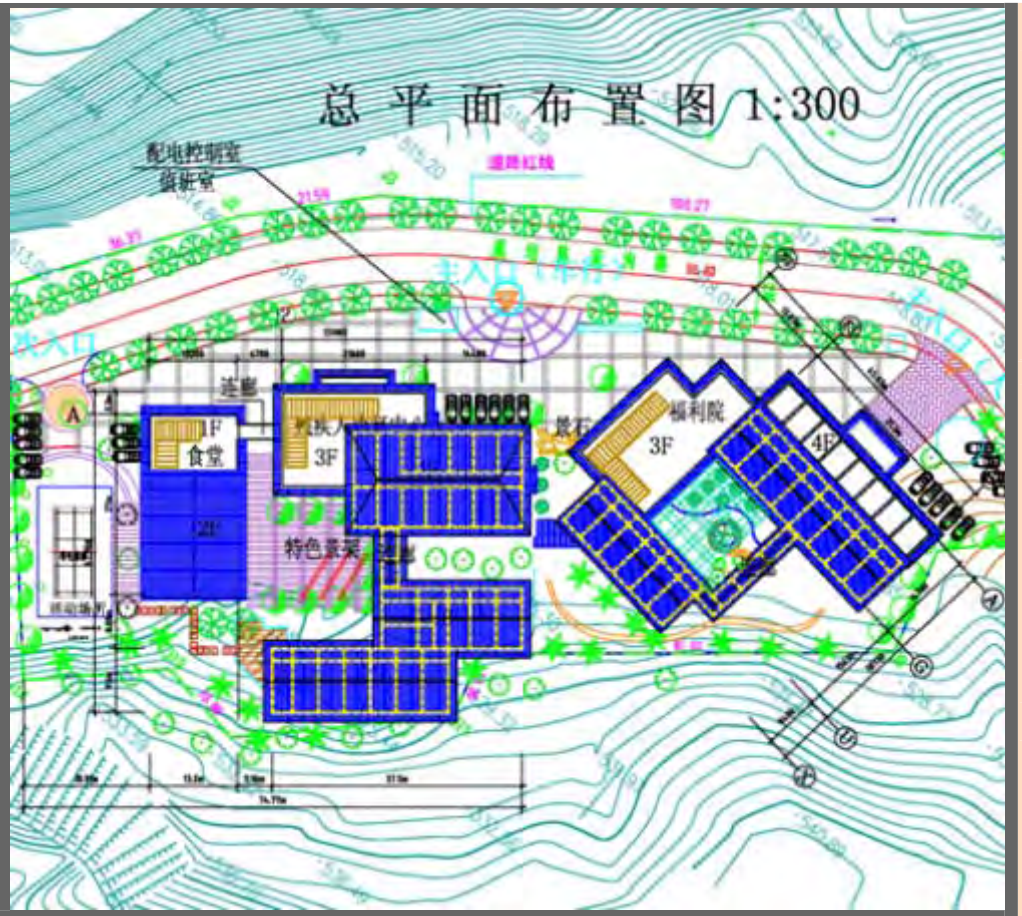

平面圖



鳥瞰圖

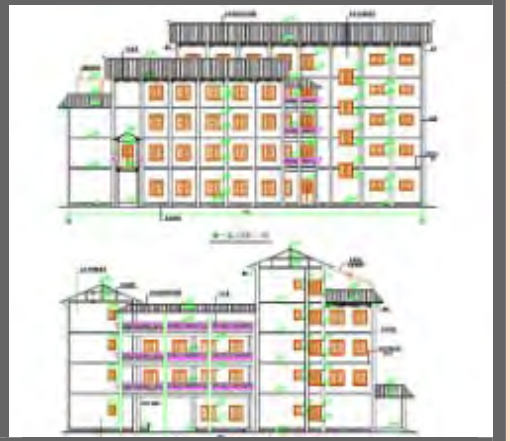

「社會福利院」立面圖

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 3 月

游仙區社會福利綜合服務中心

序號： 10
地點： 綿陽市石馬鎮及游仙鎮
估算： 2,554 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”，區內社會福利設施受嚴重破壞。同時，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 社會福利救助中心：4,000 m^2
- 殘疾人康復中心：1,500 m^2
- 社區衛生服務中心：3,546 m^2

目標受惠對象

區內孤寡老人及兒童約 810 人，三無人士約 180 人，殘疾人士約 3 萬人及居民約 23.5 萬人



「社會福利救助中心」平面圖



「社會福利救助中心」鳥瞰圖



「殘疾人康復中心」鳥瞰圖

預計竣工

2011 年 7 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 5 月



2010 年 5 月



2010 年 5 月

德陽市社會福利綜合服務中心

序號： 11

地點： 德陽市旌陽區馬鞍村

估算： 4,720 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”，區內社會福利院業務用房受嚴重破壞，受損面積 1,600 m^2

重建規模

- 老人公寓：6,300 m^2
- 孤殘兒童公寓及康復中心：2,800 m^2
- 生活設施：800 m^2
- 文娛活動中心：1,000 m^2
- 辦公樓：900 m^2
- 附屬設施：200 m^2

目標受惠對象

區內孤老人士約 750 人，孤殘兒童約 1,024 人及殘疾人士約 1,700 人



總平面圖



「老人公寓」立面圖



選址

預計竣工

2011 年 11 月

最新進度

招標中

旺蒼縣社會福利綜合服務中心

序號： 95
地點： 廣元市旺蒼縣
估算： 2,974 萬元人民幣

受災情況


5.12“汶川特大地震”，區內社會福利機構房屋受嚴重破壞；殘疾人康復指導站及陳家嶺社區衛生服務中心的房屋損毀及有部分成爲危房。同時，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 社會福利救助中心：3,786 m^2
- 殘疾人康復中心： 3,300 m^2
- 社區衛生服務中心：2,400 m^2

目標受惠對象

當地三無人士約 220 人，縣內有康復需求的殘疾人士約 21,100 萬人及陳家嶺社區及周邊區域約 12,000 人

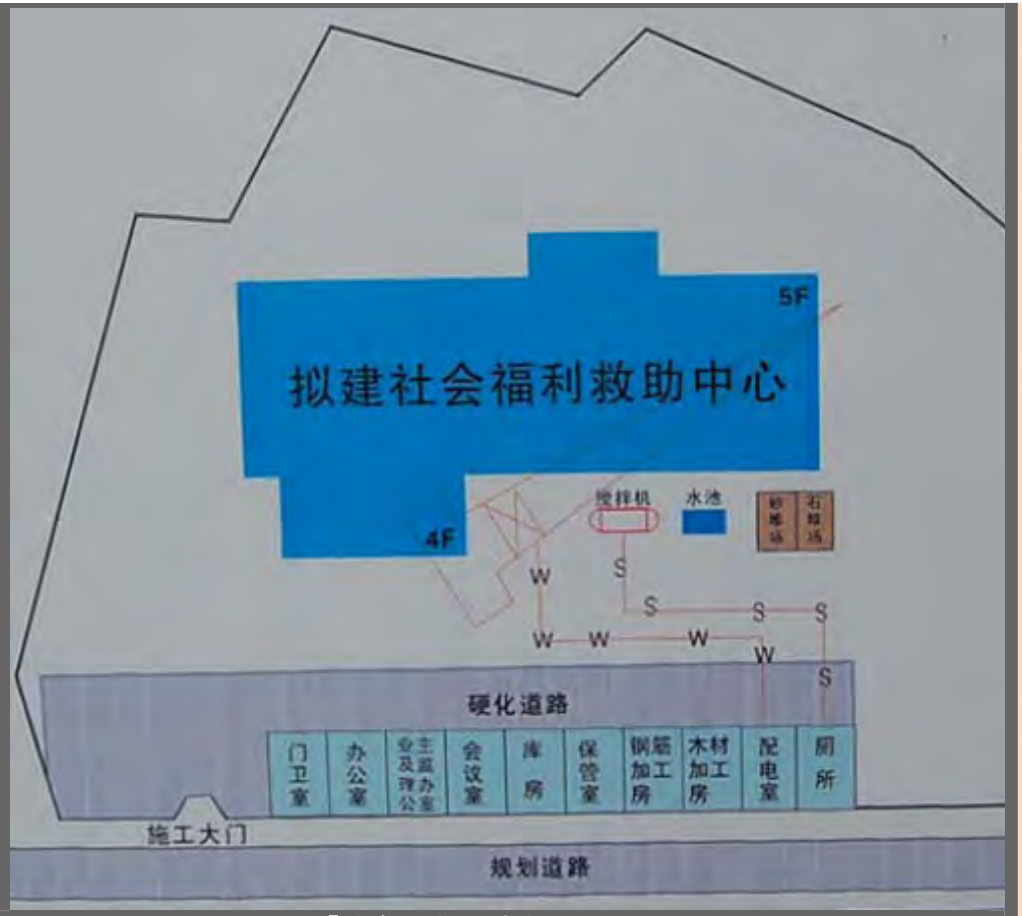

「社會福利救助中心」平面圖



「社會福利救助中心」效果圖



「社會福利救助中心」選址

預計竣工
2011 年 6 月

最新進度
施工中：正進行場地平整工程

蒼溪縣社會福利綜合服務中心

序號： 96

地點： 廣元市蒼溪縣陵江鎮

估算： 2,424 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”，區內社會福利設施受嚴重破壞，受損面積 4,570 m^2。同時，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 社會福利院：4,000 m^2
- 殘疾人康復中心：3,300 m^2

目標受惠對象

當地孤寡老人及兒童及孤殘人士約 800 人及縣內有康復需求的殘疾人士約 35,600 人



平面圖



鳥瞰圖



選址

預計竣工

2011 年 7 月

最新進度

設計中

羅江縣社會福利綜合服務中心

序號： 97
地點： 德陽市羅江縣
估算： 1,732 萬元人民幣

受災情況


5.12“汶川特大地震”，區內社會福利院受嚴重破壞，受損面積 2,054 m^2；殘疾人康復中心受嚴重破壞，受損面積 409 m^2。同時，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 社會福利院： 3,846 m^2
- 殘疾人康復中心：2,000 m^2

目標受惠對象

當地孤寡老人及兒童、孤殘人士及五保人士約 118 人及縣內有康復需求的殘疾人士約 10,000 人

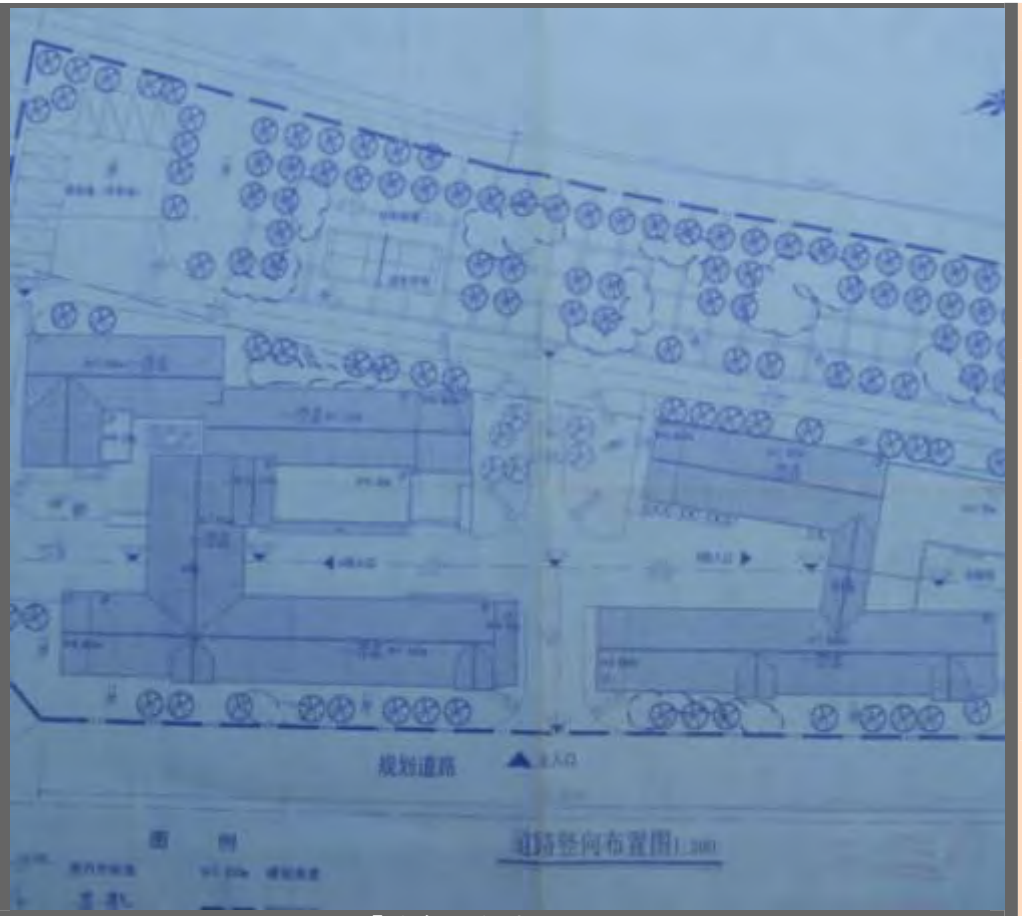

「社會福利院」平面圖



「社會福利院」選址



「社會福利院」選址

預計竣工

2011 年 4 月

最新進度

施工中：正進行場地平整工程

廣漢市社會福利綜合服務中心

序號： 98
地點： 德陽市廣漢市
估算： 2,400 萬元人民幣

受災情況


5.12“汶川特大地震”，區內 12 個鄉鎮的敬老院房屋受嚴重破壞；社會福利院受嚴重破壞，受損面積 3,000 m^2。同時，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 社會福利院：4,029 m^2
- 殘疾人康復中心：3,000 m^2

目標受惠對象

當地孤寡老人、兒童及孤殘人士約 1,750 人及縣內有康復需求的殘疾人士約 26,000 人

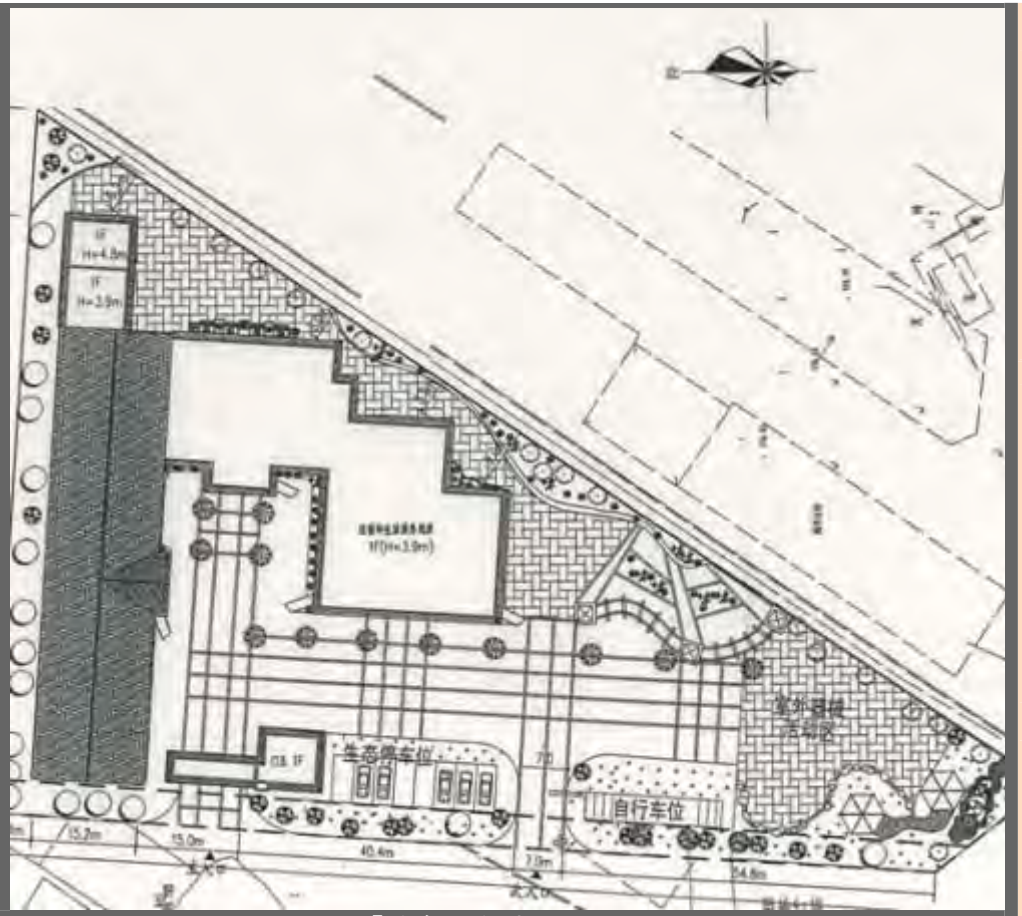

「社會福利院」平面圖



「社會福利院」鳥瞰圖



「殘疾人康復中心」平面圖

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 3 月

大邑縣悅來敬老院

序號： 99

地點： 成都市大邑縣悅來鎮

估算： 778 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”，區內 13 所鄉鎮敬老院受到不同程度損壞；農村敬老院和農村五保戶住房受嚴重破壞，受損房屋 500 餘間，受損面積 10,000m^2

重建規模

- 住宿樓：3,330 m^2
- 後勤服務建築樓：1,222 m^2
- 污水處理池：220 m^2

目標受惠對象

當地五保人士約 174 人



平面圖

預計竣工

2010 年 9 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月(下旬)



2010 年 3 月(上旬)

江油市殘疾人康復服務中心

序號： 100
地點： 綿陽市江油市太平鎮
估算： 1,500 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 綜合樓：3,813 m^2
- 附屬設施：187 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 38,600 人



平面圖



鳥瞰圖



選址

預計竣工

2011 年 5 月

最新進度

施工中：正進行場地平整工程

綿竹市殘疾人康復服務中心

序號： 101
地點： 德陽市綿竹市劍南鎮
估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模


- 康復區：2,100 m^2
- 管理區：750 m^2
- 用品用具供應站：150 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 22,700 人



平面圖

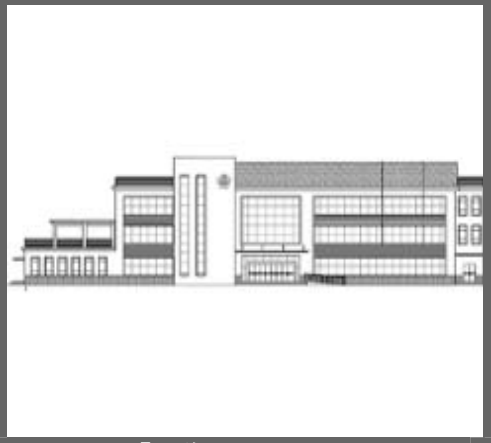

「康復區」立面圖



選址

預計竣工

2011 年 4 月

最新進度

施工中：正進行場地平整工程

南江縣殘疾人康復服務中心

序號： 124

地點： 巴中市南江縣南江鎮

估算： 1,107 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,000 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 29,600 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

大邑县残疾人康复服务中心

序號： 125

地點： 成都市大邑縣晉原鎮

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：2,990 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 20,800 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

崇州市殘疾人康復服務中心

序號： 126

地點： 成都市崇州市崇陽鎮

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,080 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 29,300 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

九寨溝縣殘疾人康復服務中心

序號： 127

地點： 阿壩州九寨溝縣永樂鎮

估算： 593 萬元人民幣

受災情況


5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：1,500 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 2,800 人

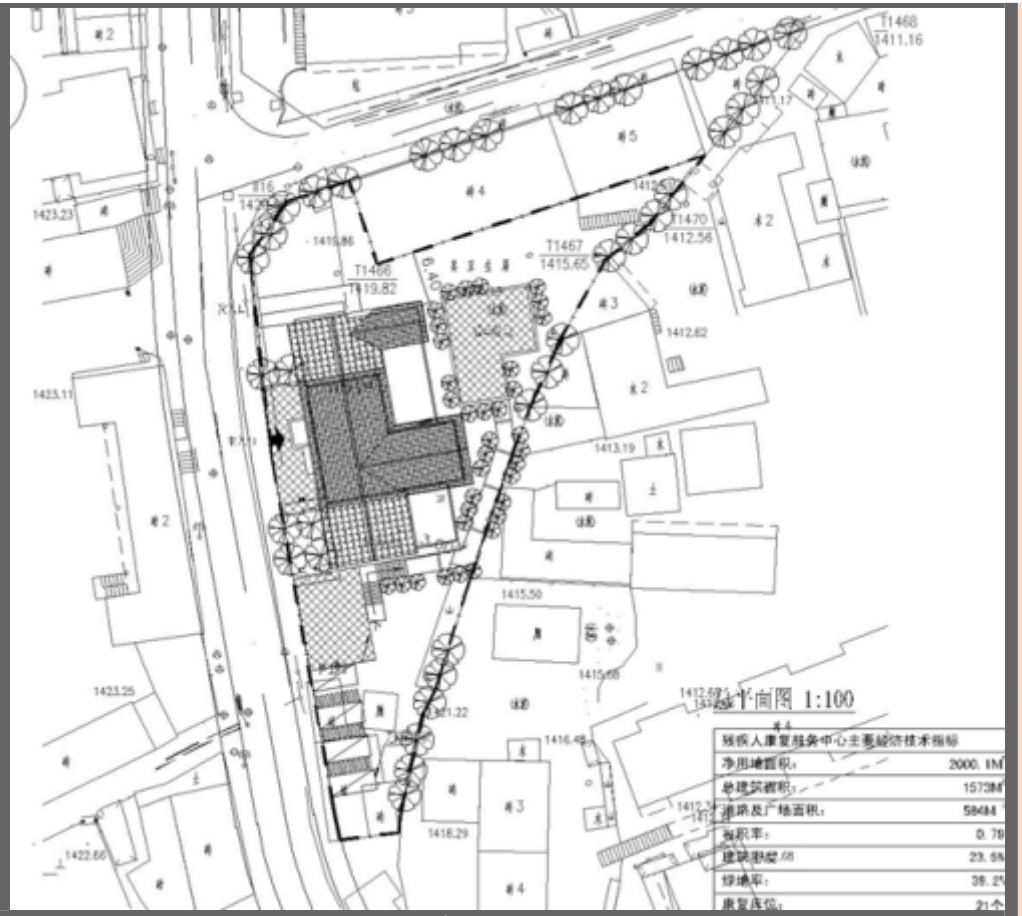

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2012 年 2 月

最新進度

正就設計進行招標

小金縣殘疾人康復服務中心

序號： 128
地點： 阿壩州小金縣喇嘛寺新區
估算： 593 萬元人民幣

受災情況


5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：1,500 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 3,500 人

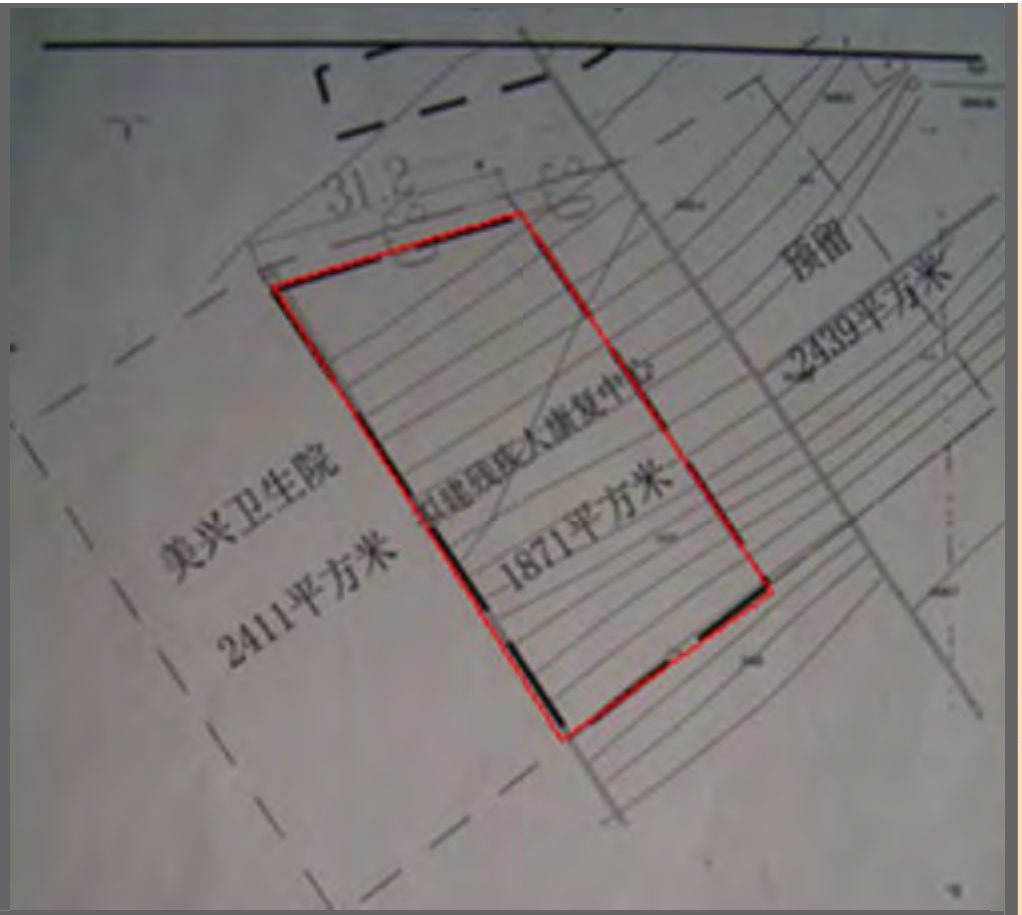

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2012 年 2 月

最新進度

正就設計進行招標

松潘縣殘疾人康復服務中心

序號： 129

地點： 阿壩州松潘縣北區金坑壩

估算： 593 萬元人民幣

受災情況


5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：1,580 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 3,200 人

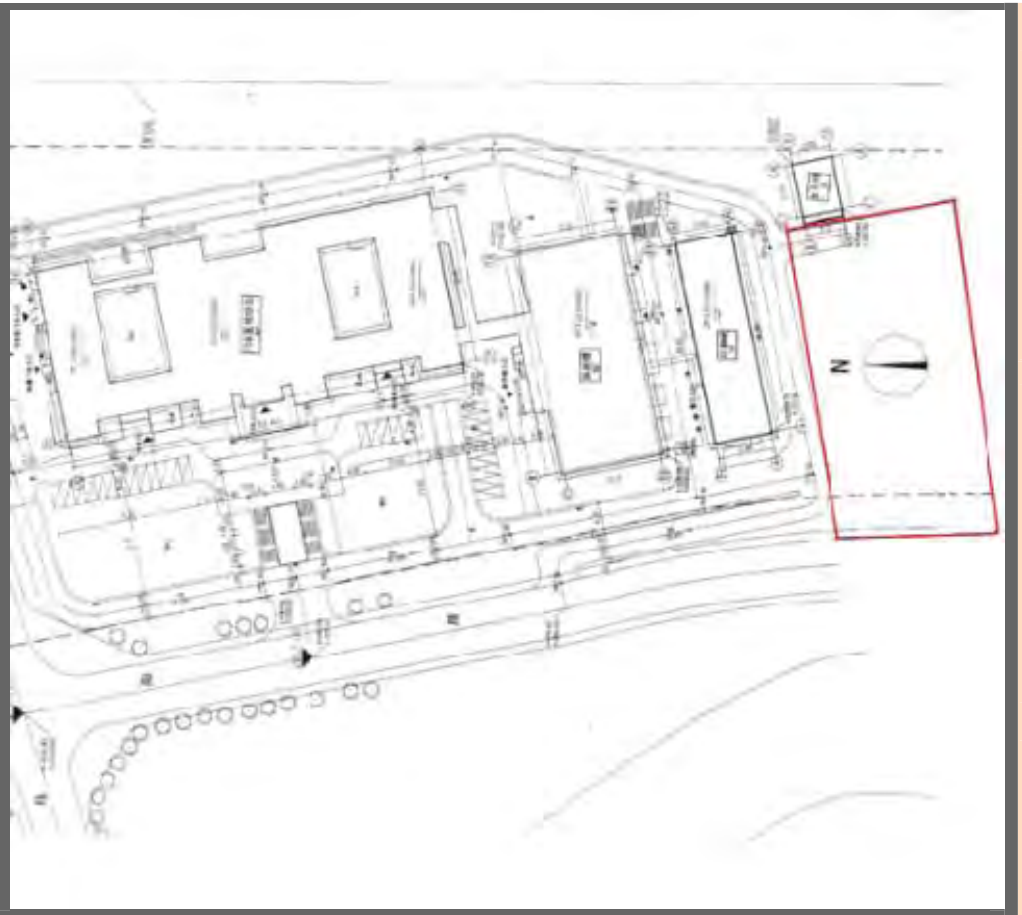

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2012 年 2 月

最新進度

正就設計進行招標

茂縣殘疾人康復服務中心

序號： 130

地點： 阿壩州茂縣鳳儀鎮

估算： 732 萬元人民幣

受災情況

5.12“汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：2,091 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 4,800 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2012 年 2 月

最新進度

正就設計進行招標

理縣殘疾人康復服務中心

序號： 131

地點： 阿壩州理縣雜穀腦鎮風包

估算： 593 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：1,500 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 2,000 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2012 年 2 月

最新進度

正就設計進行招標

黑水縣殘疾人康復服務中心

序號： 132

地點： 阿壩州黑水縣蘆花鎮

估算： 593 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：1,564 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 2,600 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2012 年 2 月

最新進度

正就設計進行招標

閬中市殘疾人康復服務中心

序號： 133

地點： 南充市閬中市

估算： 1,376 萬元人民幣

受災情況


5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：4,106 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 37,900 人

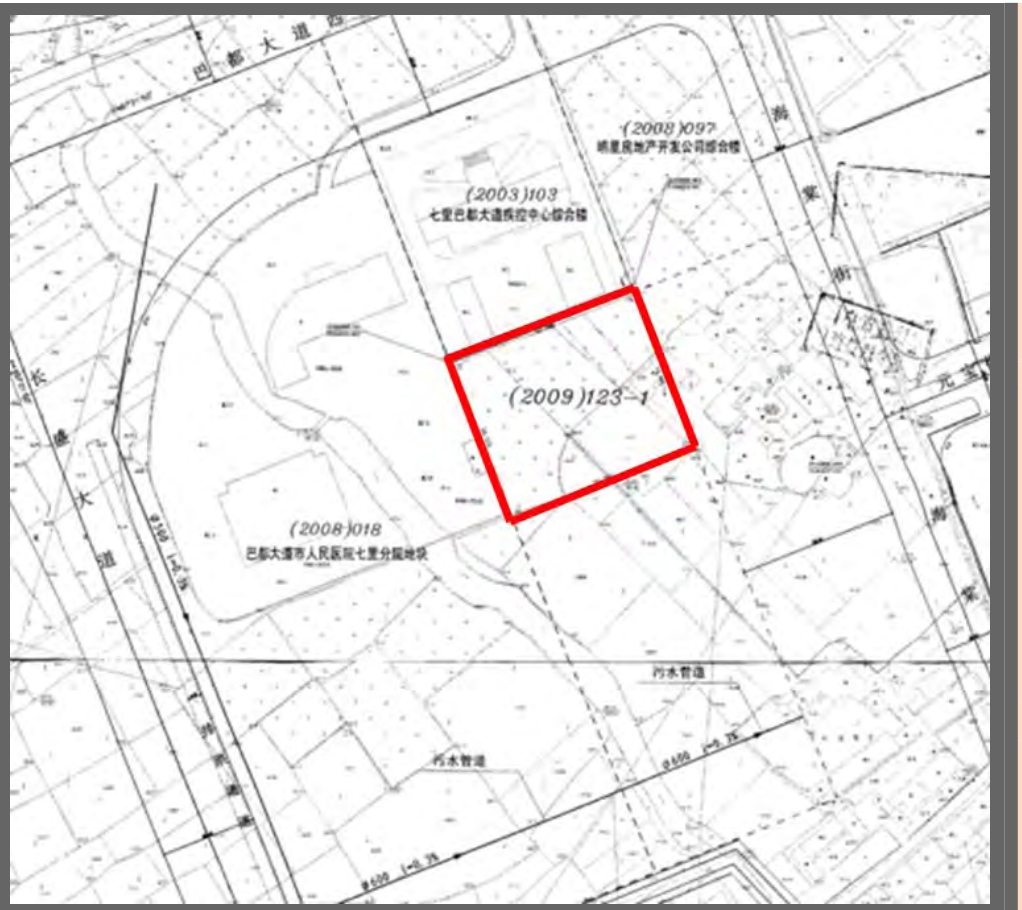

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

石棉縣殘疾人康復服務中心

序號： 134

地點： 雅安市石棉縣

估算： 732 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：2,000 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 5,600 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

漢源縣殘疾人康復服務中心

序號： 135

地點： 雅安市漢源縣九襄鎮

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況


5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,000 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 16,400 人

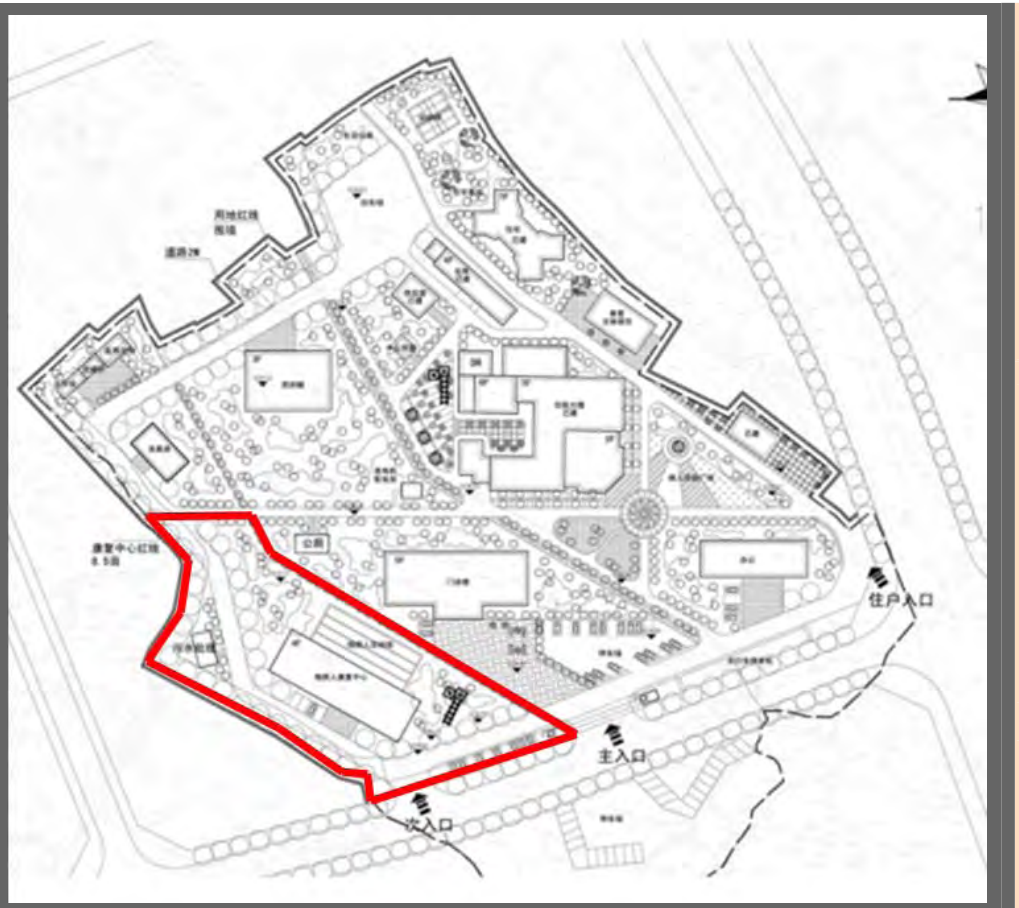

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

寶興縣殘疾人康復服務中心

序號： 136

地點： 雅安市寶興縣穆坪鎮

估算： 593 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：1,550 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 2,600 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

蘆山縣殘疾人康復服務中心

序號： 137

地點： 雅安市蘆山縣蘆陽鎮

估算： 691 萬元人民幣

受災情況


5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：2,000 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 5,500 人

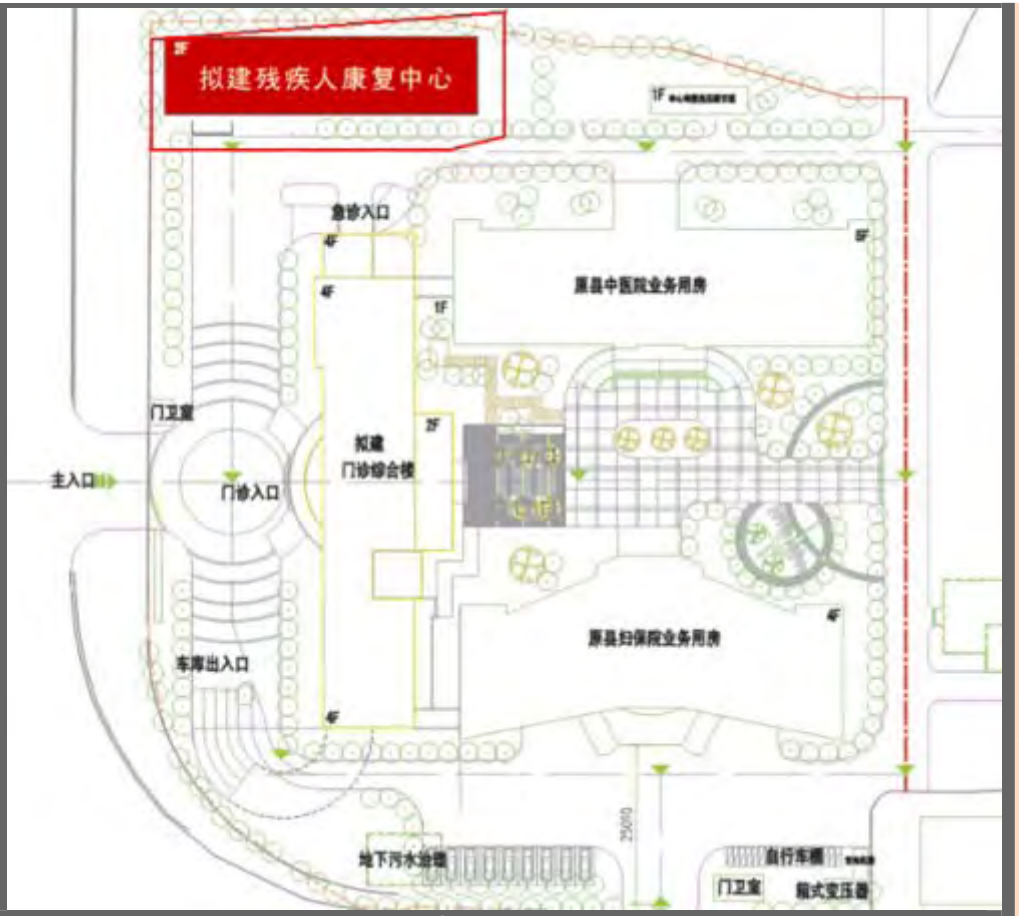

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

三台縣殘疾人康復服務中心

序號： 138

地點： 綿陽市三台縣北壩鎮

估算： 1,376 萬元人民幣

受災情況


5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,944 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 68,000 人

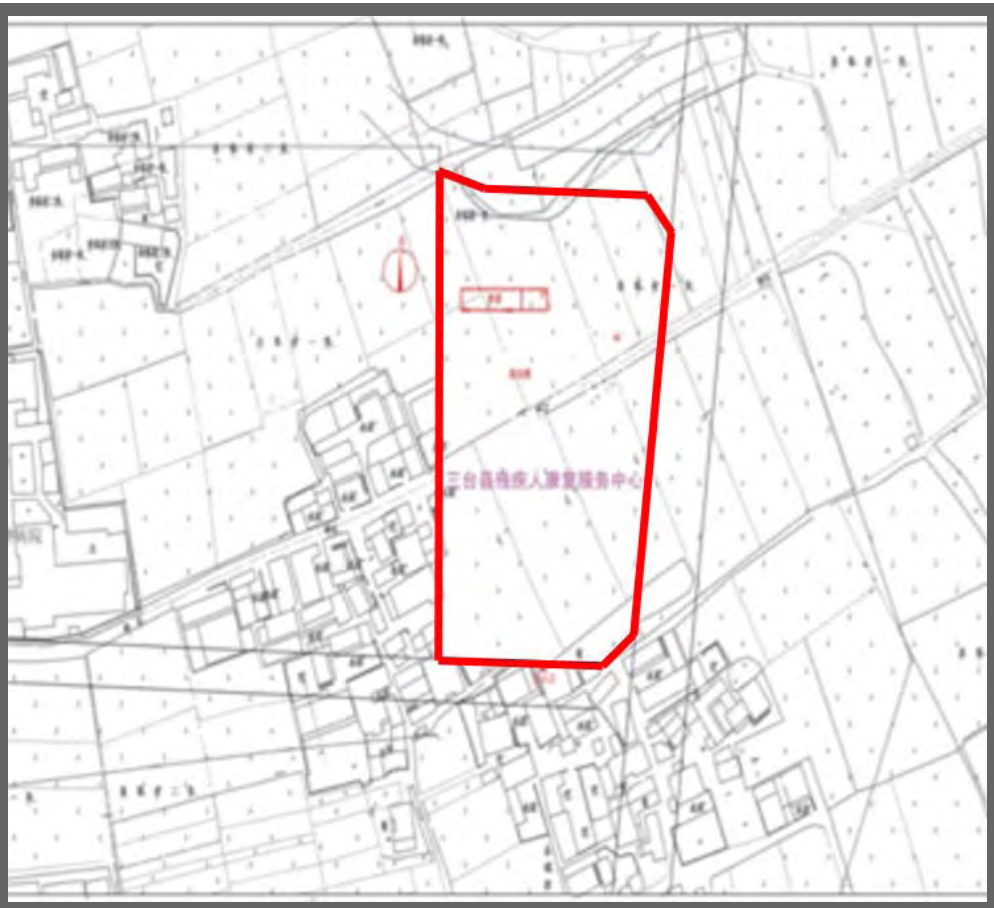

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

北川縣殘疾人康復服務中心

序號： 139

地點： 綿陽市北川新縣城

估算： 1,262 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,150 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 7,400 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

平武縣殘疾人康復服務中心

序號： 140

地點： 綿陽市平武縣龍安鎮

估算： 732 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：2,007 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 8,700 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

安縣殘疾人康復服務中心

序號： 141

地點： 綿陽市安縣花荄鎮

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,073 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 20,600 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

梓潼縣殘疾人康復服務中心

序號： 142

地點： 綿陽市梓潼縣文昌鎮

估算： 1,107 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,140 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 17,700 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

涪城區殘疾人康復服務中心

序號： 143

地點： 綿陽市涪城區劍南路西段

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況


5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,120 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 27,700 人

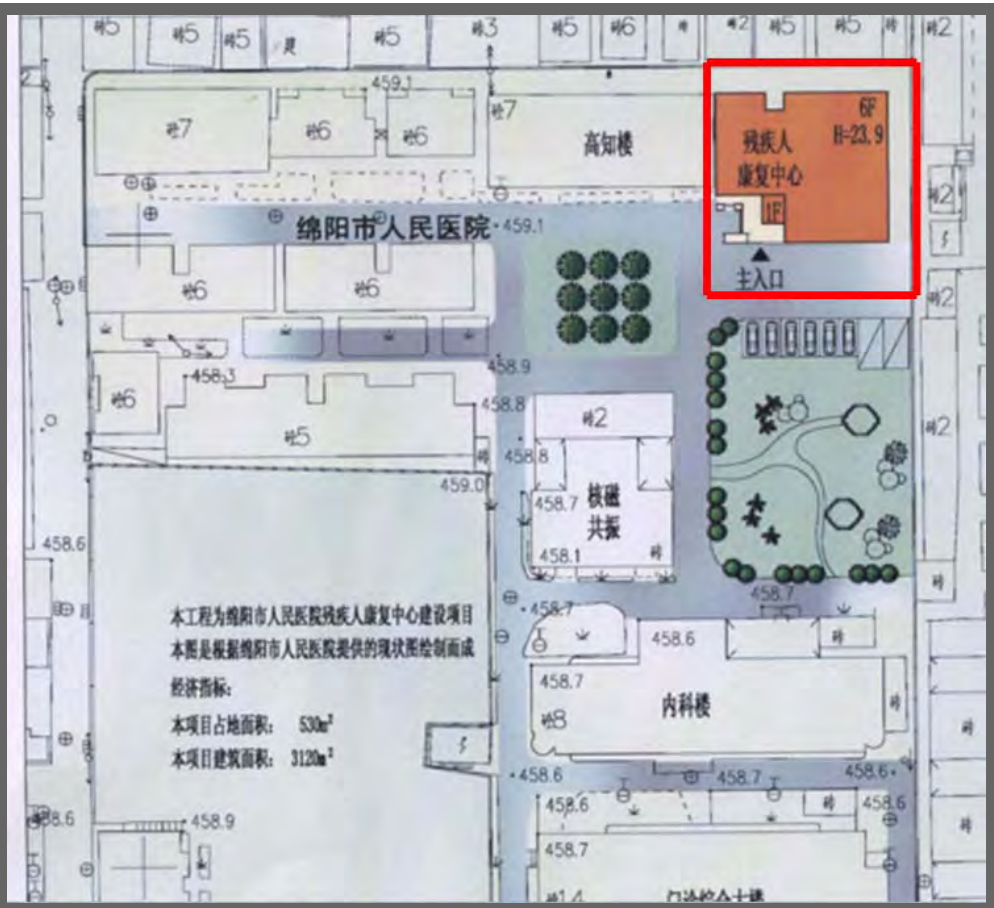

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

鹽亭縣殘疾人康復服務中心

序號： 144

地點： 綿陽市鹽亭縣雲溪鎮

估算： 1,107 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,031 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 28,100 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

劍閣縣殘疾人康復服務中心

序號： 146

地點： 廣元市劍閣縣下寺鎮

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況

5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：2,981 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 31,100 人



建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

中江縣殘疾人康復服務中心

序號： 147

地點： 德陽市中江縣南華鎮

估算： 1,500 萬元人民幣

受災情況


5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：4,054 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 65,900 人

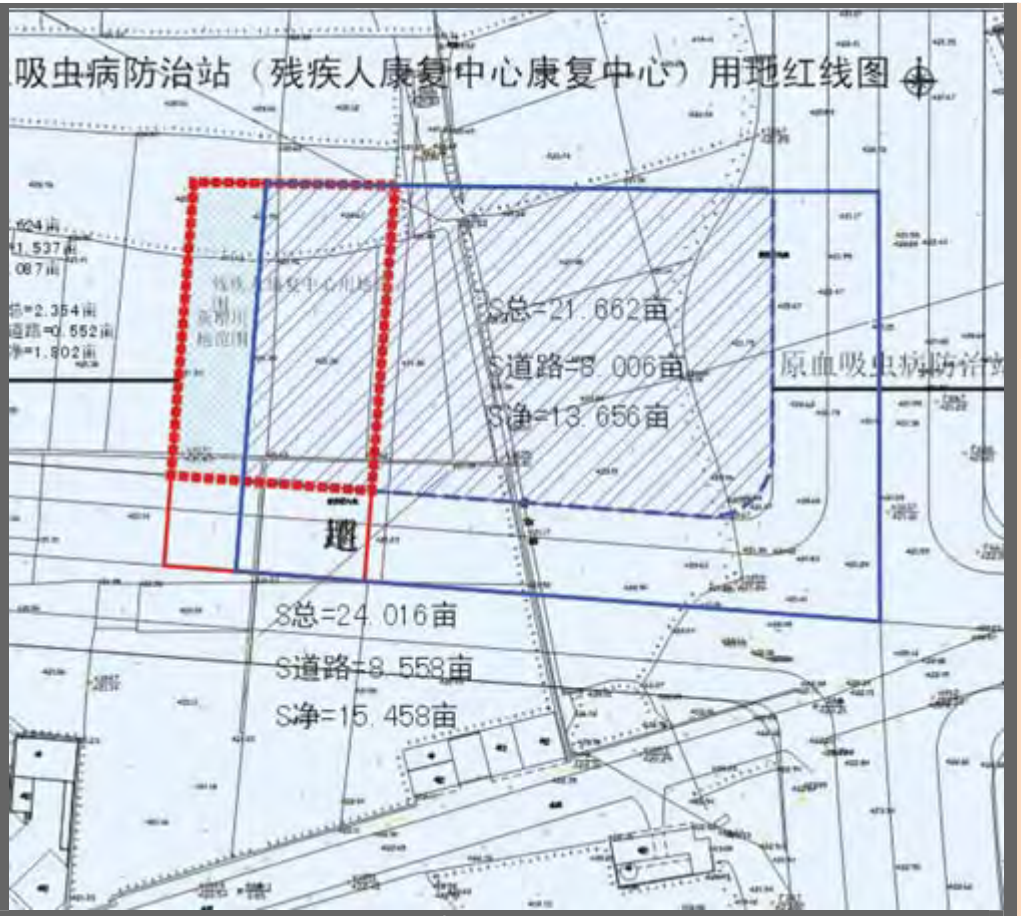

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

旌陽區殘疾人康復服務中心

序號： 148

地點： 德陽市旌陽區汾河路

估算： 1,200 萬元人民幣

受災情況


5.12 “汶川特大地震”發生後，四川省內新增了大量肢體殘疾人士，需要接受長期的康復治療

重建規模

- 殘疾人康復服務中心：3,000 m^2

目標受惠對象

縣內有康復需求的殘疾人士約 28,300 人

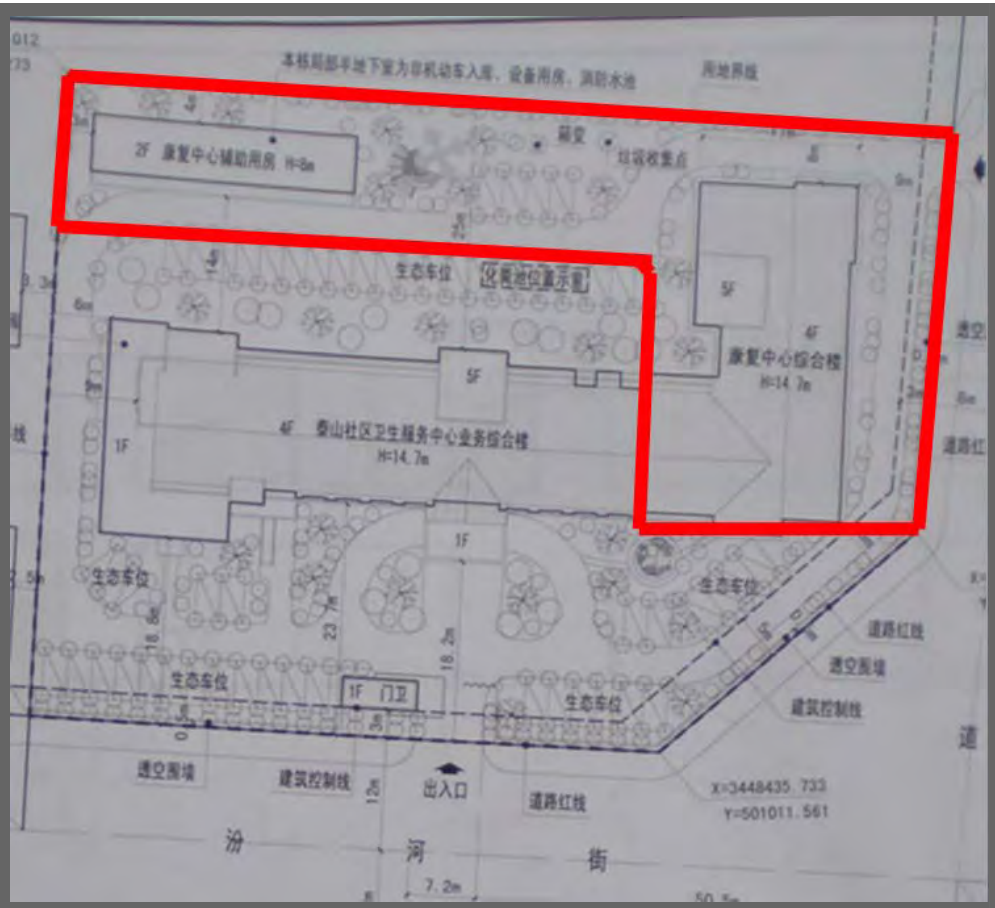

建設用地圖



選址



選址

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

正就設計進行招標

朝天區中醫醫院

序號： 12

地點： 廣元市朝天鎮

估算： 2,378 萬元人民幣

受災情況

受損建築面積 1,536 m^2

重建規模

- 新建綜合醫療大樓：4,970 m^2

目標受惠對象

服務轄區內 210,000 居民及陝甘毗鄰地區



平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：正進行人工挖孔樁地基工程，預計 2010 年 5 月份開展上蓋工程



2010 年 3 月



2009 年 12 月



2009 年 10 月

旺蒼縣人民醫院

序號： 13

地點： 廣元市旺蒼縣

估算： 3,600 萬元人民幣

受災情況


危房鑑定面積為 6,500m^2，受損建築面積 12,700 m^2

重建規模

- 新建門診綜合大樓用房：6,500m^2
- 配套綠化面積：6,000m^2

目標受惠對象

承擔全縣 450,000 人及周邊地區 100,000 人的醫療救治及急症診轉診

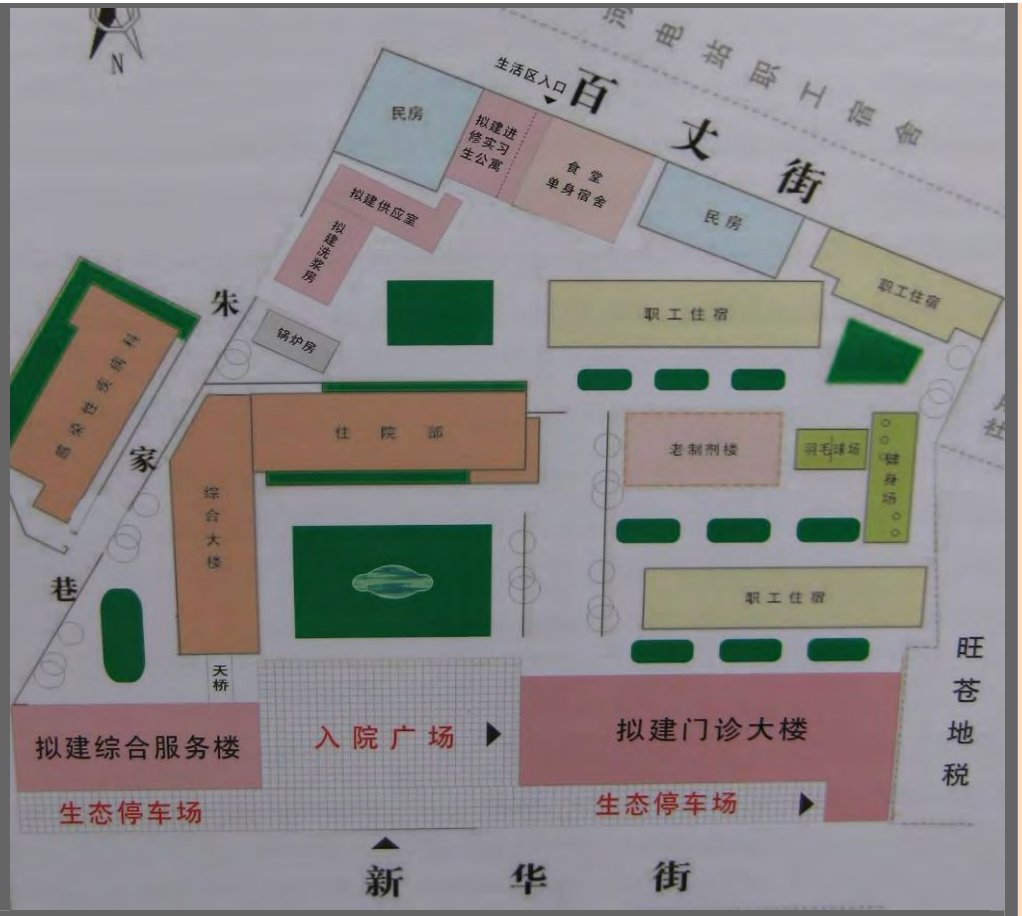

平面圖



施工平面佈置圖



重建位置

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：正進行地基工程及部份上蓋工程，預計 2010 年 7 月份完成 50%上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 2 月



2009 年 12 月

元壩區人民醫院

序號： 14

地點： 廣元市元壩區元壩鎮

估算： 1,343 萬元人民幣 (港方資金)

受災情況

業務用房住院綜合樓被列為 D 級危房，受損建築面積 2,111 m^2，拆除建築面積 2,111 m^2

重建規模


- 重建住院大樓：
  規劃建築面積 6,500m^2
  港方援建面積 3,100m^2

目標受惠對象

承擔全區 240,000 人的基本醫療服務



平面圖

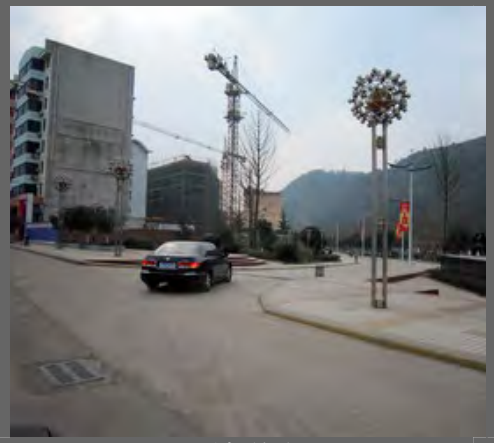

周邊道路



立面圖

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：正進行上蓋裝修及機電工程



2010 年 3 月



2009 年 9 月



2009 年 8 月

梓潼縣人民醫院

序號： 15

地點： 綿陽市梓潼縣

估算： 6,228 萬元人民幣

受災情況

門診大樓被列為 D 級危房，住院大樓、內科樓和放射科樓被列為 C 級危房。受損建築面積 21,700m^2，拆除建築面積 6,700m^2

重建規模

- 住院大樓：11,000m^2
- 門診大樓：7,800m^2

目標受惠對象

服務轄區內 390,000 人口及毗鄰地區



平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：正進行地基工程及部份上蓋工程，預計 2010 年 7 月份完成 50%上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 1 月



2009 年 8 月

鹽亭縣中醫院

序號： 16

地點： 綿陽市鹽亭縣

估算： 1,985 萬元人民幣

受災情況


業務用房被列為 D 級危房，受損建築面積 4,200 m^2，拆除建築面積 4,200 m^2

重建規模

- 重建住院大樓：4,200m^2

目標受惠對象

服務轄區內 620,000 人口，連周邊市縣，服務對象達 1,000,000 人口

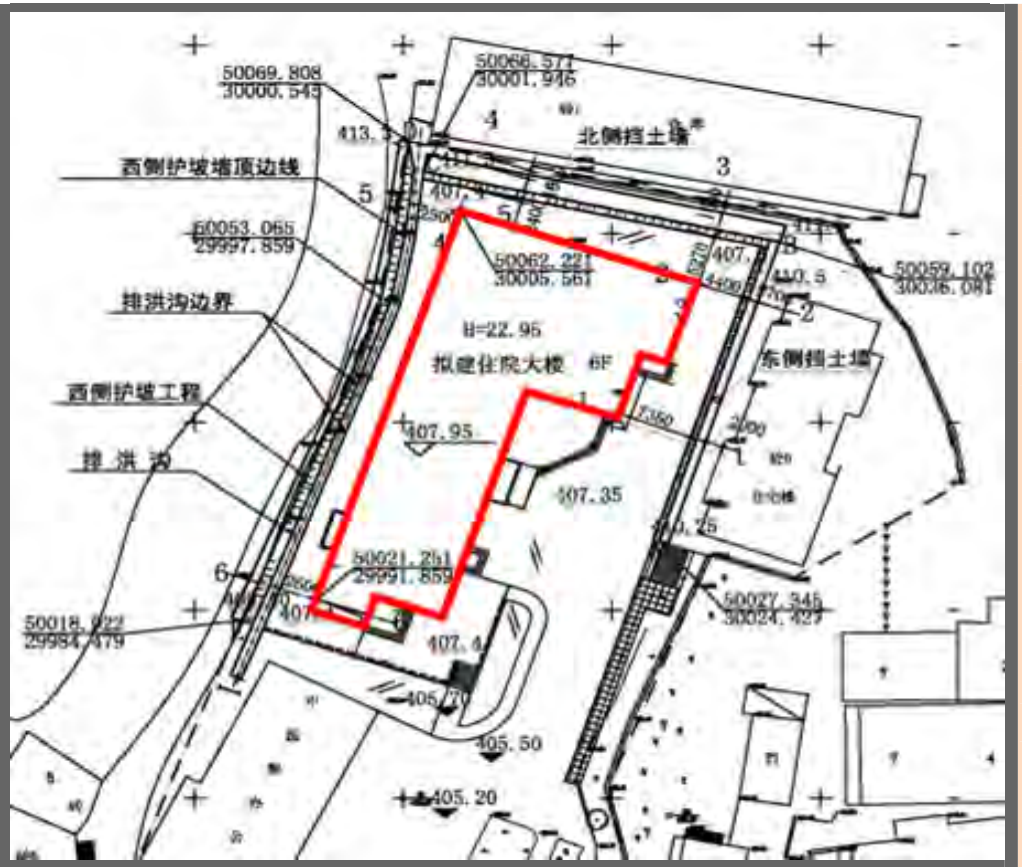

平面圖



效果圖



立面圖

預計竣工

2010 年 8 月

最新進度

施工中：正進行上蓋裝修及機電工程



2010 年 3 月



2009 年 12 月



2009 年 10 月


德陽市第二人民醫院 (一期工程)

序號： 17
地點： 德陽市岷江西路
估算： 7,701 萬元人民幣

受災情況
住院綜合樓被列為 D 級危房，受損建築面積 13,264 m^2，拆除建築面積 13,264 m^2

重建規模
外科住院大樓：22,000m^2

目標受惠對象
全市及周邊縣市鄉鎮 3,820,000 人口，覆蓋 5,954km^2

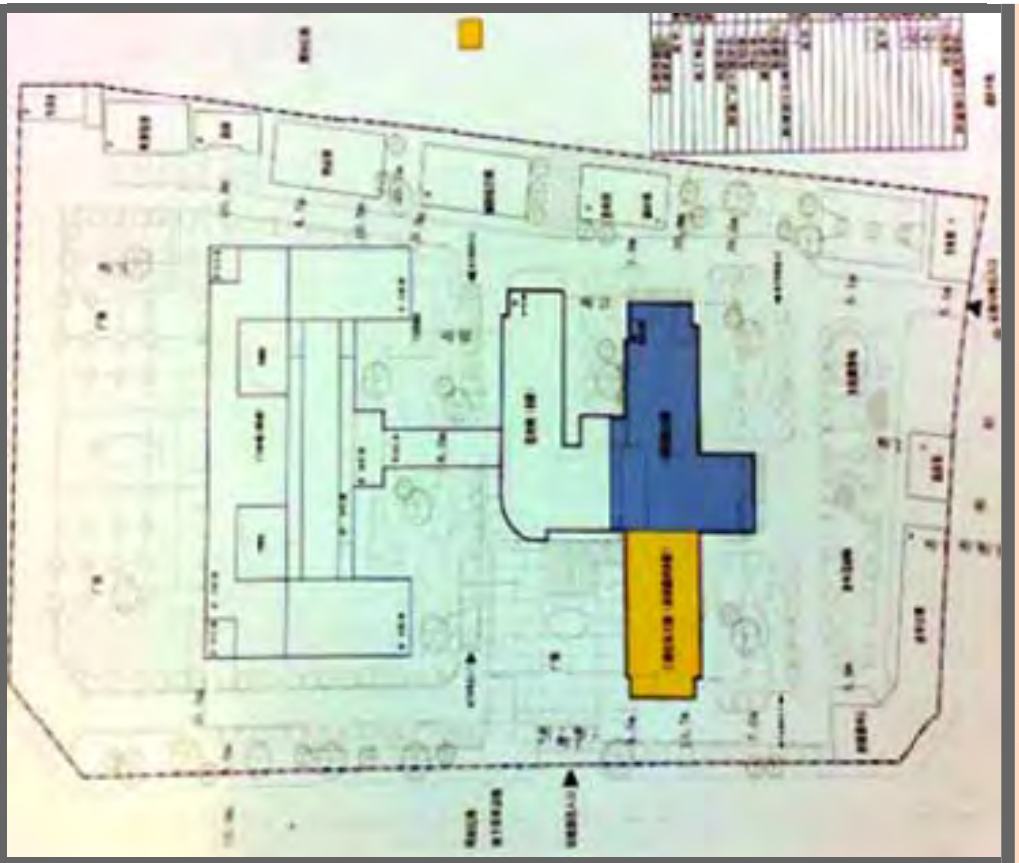

平面圖



鳥瞰圖



現有醫院

預計竣工
2011 年 3 月

最新進度
施工中：預計 2010 年 6 月份開展上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2010 年 2 月

旌陽區中醫院

序號： 18

地點： 德陽市西小區

估算： 2,998 萬元人民幣

受災情況


門診、住院大樓及社區衛生服務中心樓、業務用房被列為 D 級危房，受損建築面積 7,700 m^2，拆除建築面積 3,000m^2

重建規模

內科住院大樓：13,737m^2

目標受惠對象


提供內科服務每年人次 150,000，包括外科 30,000，婦科 30,000，骨科 36,000，其他 54,000

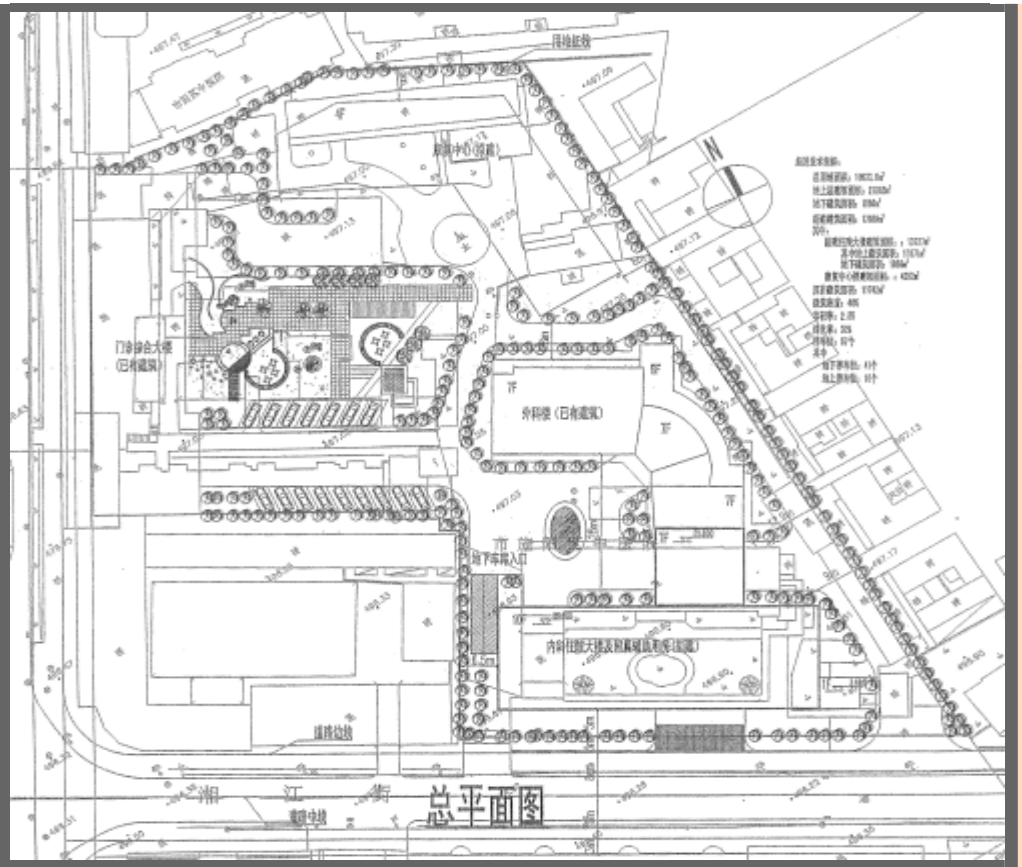

平面圖



立面圖

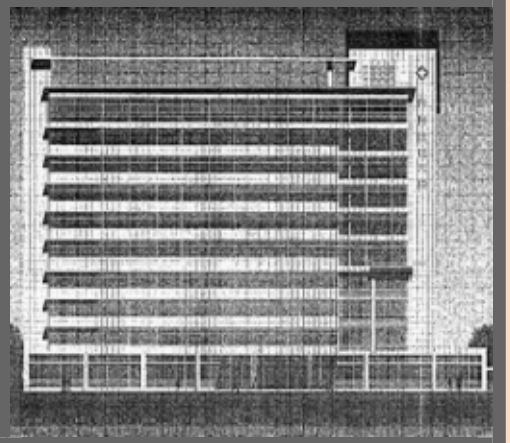

立面圖

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中：正進行地基工程，預計 2010 年 5 月份開展上蓋工程



2010 年 4 月



2009 年 11 月



2009 年 9 月

廣漢市人民醫院

序號： 19

地點： 廣漢市雒城鎮

估算： 2,460 萬元人民幣
(港方承擔金額)

受災情況

門診、住院、醫技業務用房被列為 C 級危房，受損建築面積 3,000m^2，拆除建築面積 180m^2

重建規模

- 內科住院大樓：10,300m^2

目標受惠對象


服務本地區 59 萬人口。預計服務量為每年 580,000 人次



平面圖



鳥瞰圖

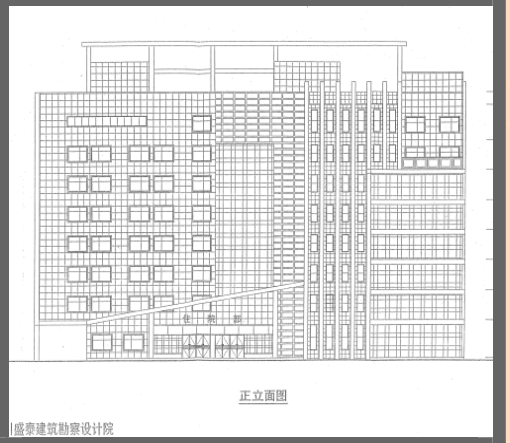

立面圖

預計竣工

2010 年 11 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程，預計 2010 年 7 月份開展上蓋裝修及機電工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 1 月

川港康復科技綜合大樓

序號： 20

地點： 成都市一環路

估算： 22,452 萬元人民幣
(港方承擔金額)

受災情況

5.12 汶川地震造成大量外傷性傷員，地震傷員中相當一部分需要康復治療，其中有的還需要長期康復治療

重建規模

- 總建築面積約 80,088 m^2 (港方承擔 227,059m^2)
- 康復治療床 300 張
- 重要設施包括門診、物理治療部、作業治療部、臨床心理服務、義肢及矯形部等

目標受惠對象

需要康復治療的地震傷員(成都市常住人口 12,579,000



平面圖



鳥瞰圖



現有省醫院大樓

預計竣工

2012 年 10 月

最新進度

招標中：預計 2010 年 5 月底動工

朝天區人民醫院

序號： 102

地點： 廣元市朝天區朝天鎮

估算： 5,545 萬元人民幣

受災情況

住院樓、急診綜合樓被列為 D 級危房，受損建築面積 5,036m^2，拆除建築面積 5,036m^2

重建規模

- 門診/急診/住院綜合樓：9,187m^2
- 維修加固：6,844 m^2

目標受惠對象


朝天區 210,000 人口及陝、甘毗鄰地區群眾，範圍覆蓋全區 25 個鄉鎮人口 400,000



平面圖



鳥瞰圖

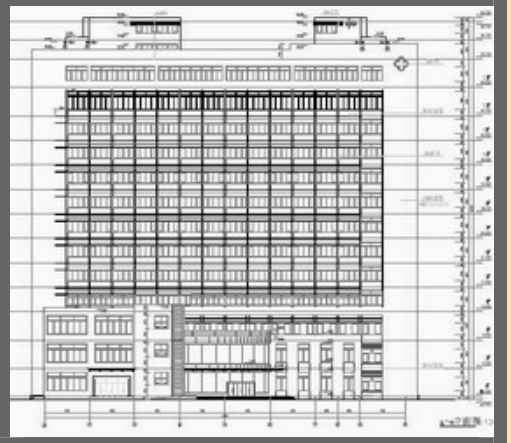

立面圖

預計竣工

2011 年 3 月

最新進度

施工中：正進行地基工程，預計 2010 年 7 月份開展上蓋工程

旺蒼縣中醫院

序號： 103

地點： 廣元市旺蒼縣興旺大道

估算： 3,955 萬元人民幣

受災情況


醫院受損建築面積 23,183 m^2，倒塌建築面積 6,050 m^2

重建規模

- 住院醫技綜合樓：9,183 m^2
- 維修業務用房：9,000 m^2

目標受惠對象


提供全縣 450,000 人及周邊地區 100,000 人的醫療救治服務

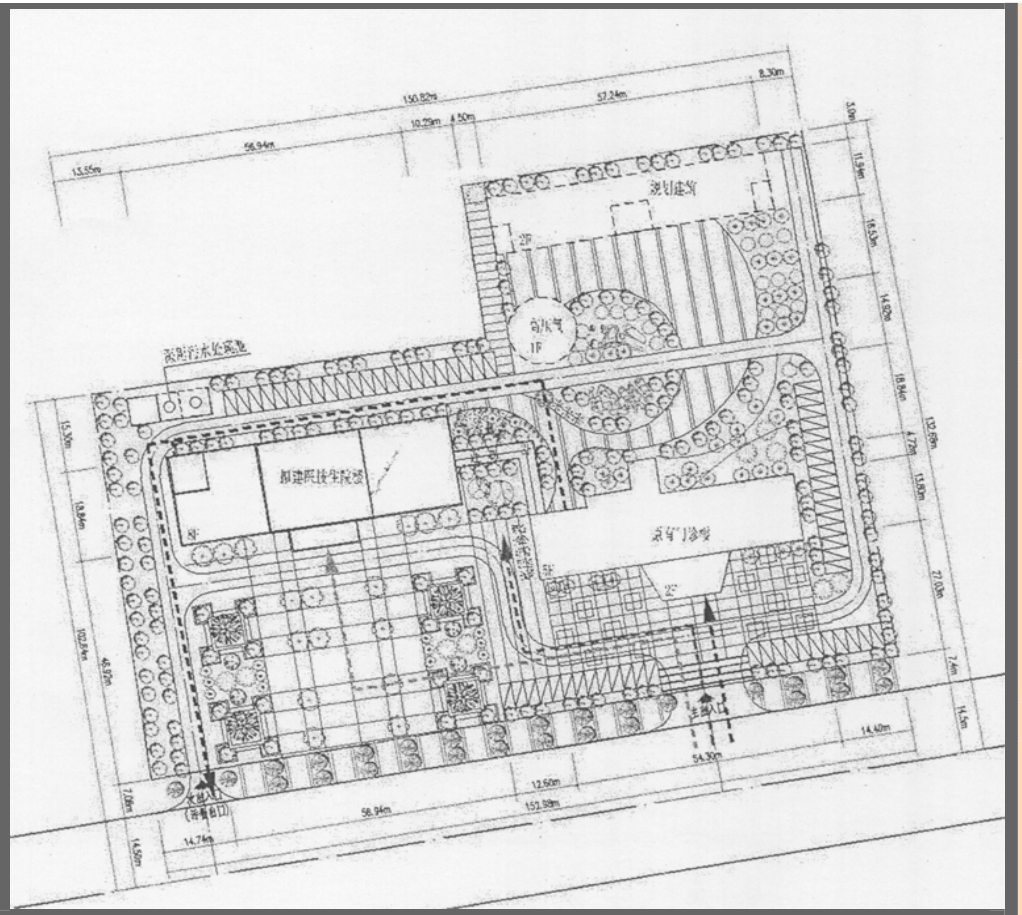

平面圖



鳥瞰圖

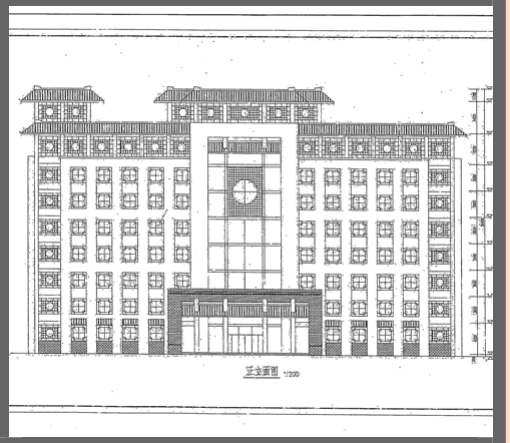

立面圖

預計竣工

2011 年 4 月

最新進度

施工中：正進行地基工程，預計 2010 年 7 月份開展上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

元壩區中醫院

序號： 104

地點： 廣元市元壩區元壩鎮

估算： 1,249 萬元人民幣

受災情況


醫院受損建築面積 3,550 m^2，危房建築面積 1,850 m^2

重建規模

- 醫療業務用房：3,970 m^2
- 門診樓：2,743 m^2
- 醫技樓：1,227 m^2

目標受惠對象

承擔全區 240,000 人的醫療救治服務

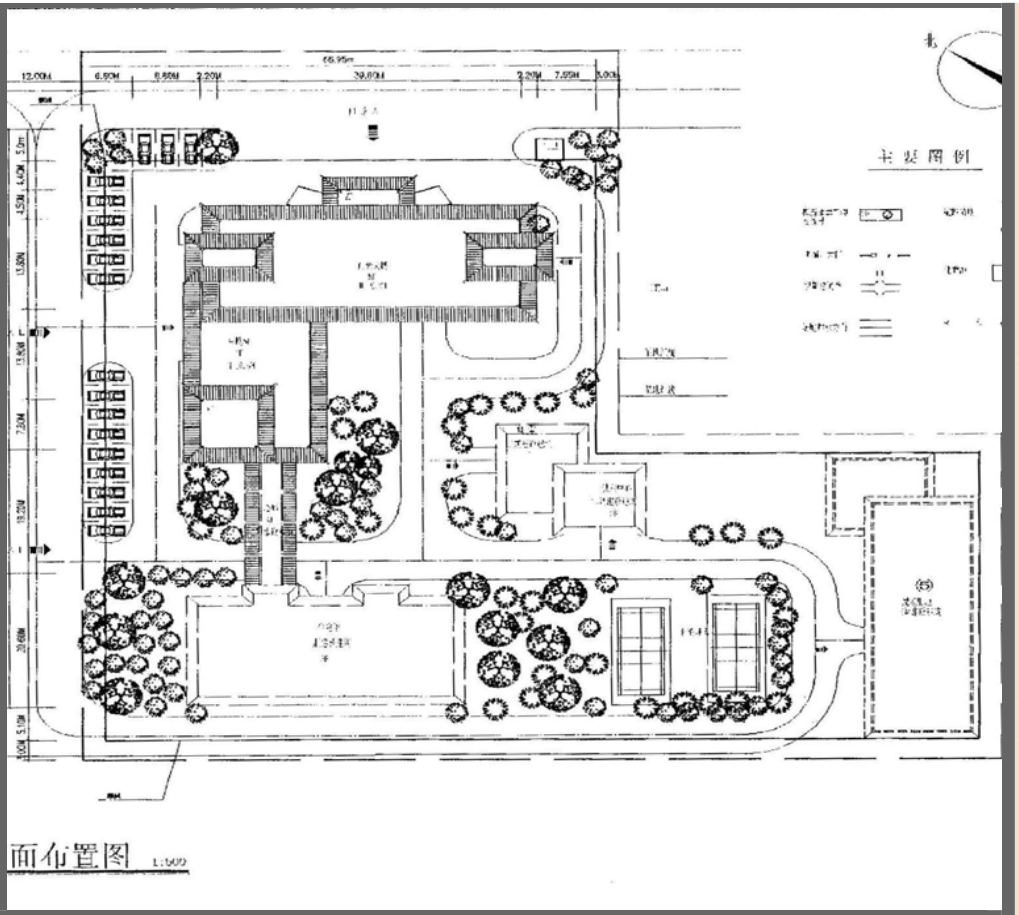

平面圖



鳥瞰圖



選址

預計竣工

2010 年 8 月

最新進度

施工中：正進行上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 2 月



2009 年 11 月

鹽亭縣人民醫院

序號： 105

地點： 綿陽市鹽亭縣雲溪鎮

估算： 9,650 萬元人民幣

受災情況

醫院五幢房屋被列為 D 級危房，受損建築面積 30,050 m^2，拆除建築面積 22,500 m^2

重建規模

- 門診住院綜合大樓：
  建築面積 24,000 m^2

目標受惠對象


鹽亭縣常住人口 620,000 加上離縣城較近的周邊縣市的老百姓，服務對象約 1,000,000 人



平面圖



鳥瞰圖

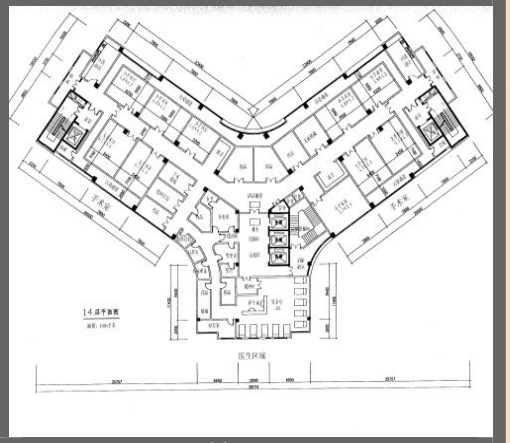

四樓平面圖

預計竣工

2011 年 10 月

最新進度

施工中：剛開始地基工程，預計 2010 年 7 月份開展上蓋工程

德陽市中西醫結合醫院

序號： 106

地點： 德陽市旌陽區

估算： 3,149 萬元人民幣

受災情況


醫院受損建築面積 5,298 m^2，拆除建築面積 1,098 m^2

重建規模

- 住院樓：7,000 m^2
- 維修門診樓：4,200 m^2

目標受惠對象


將提供德陽市及周邊地區 3,840,000 人口的醫療救治服務

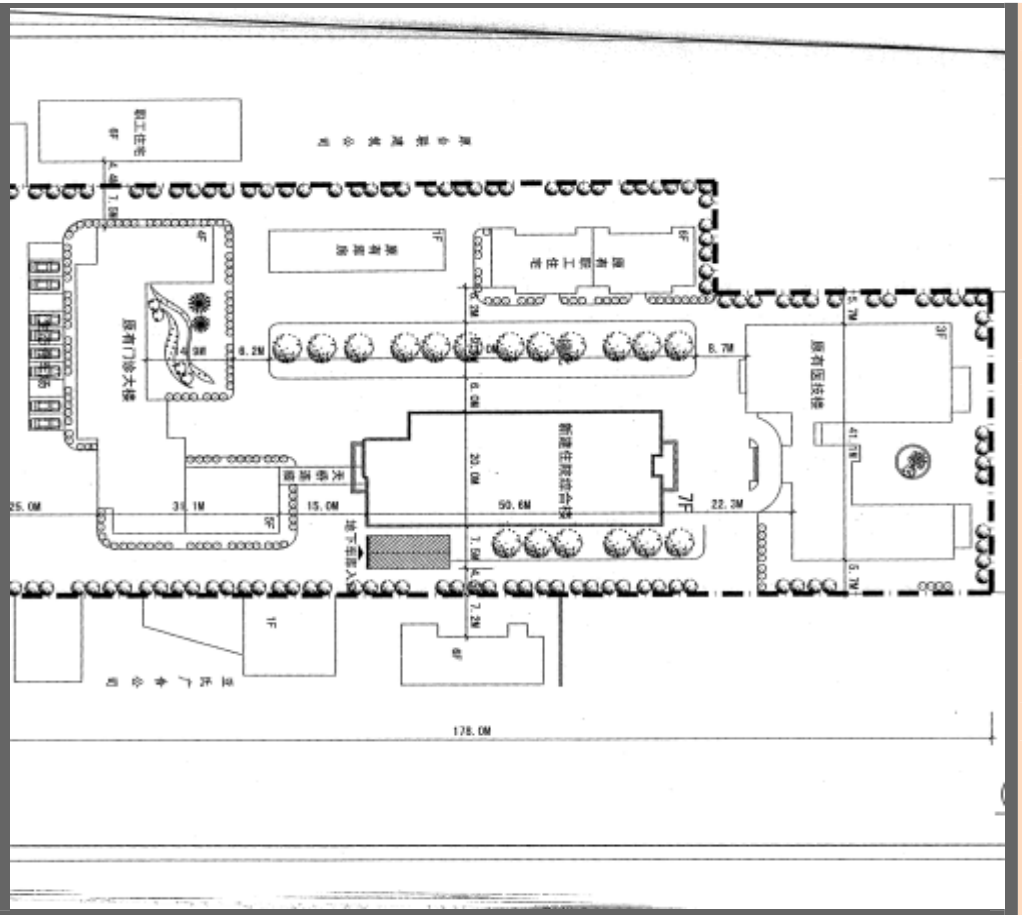

平面圖



效果圖

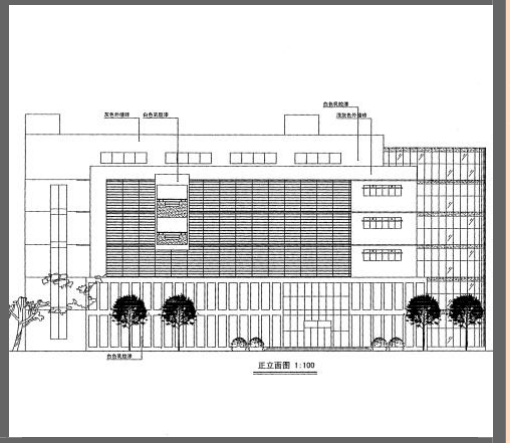

立面圖

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：正進行地基工程，預計 2010 年 5 月份開展上蓋工程



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 1 月

羅江縣中醫院

序號： 107

地點： 德陽市羅江縣萬安鎮

估算： 761 萬元人民幣

受災情況


醫院受損建築面積 7,802 m^2，倒塌建築面積 1,236 m^2，拆除建築面積 3,400 m^2

重建規模


- 康復綜合樓：3,130 m^2

目標受惠對象


羅江縣 246,000 人口

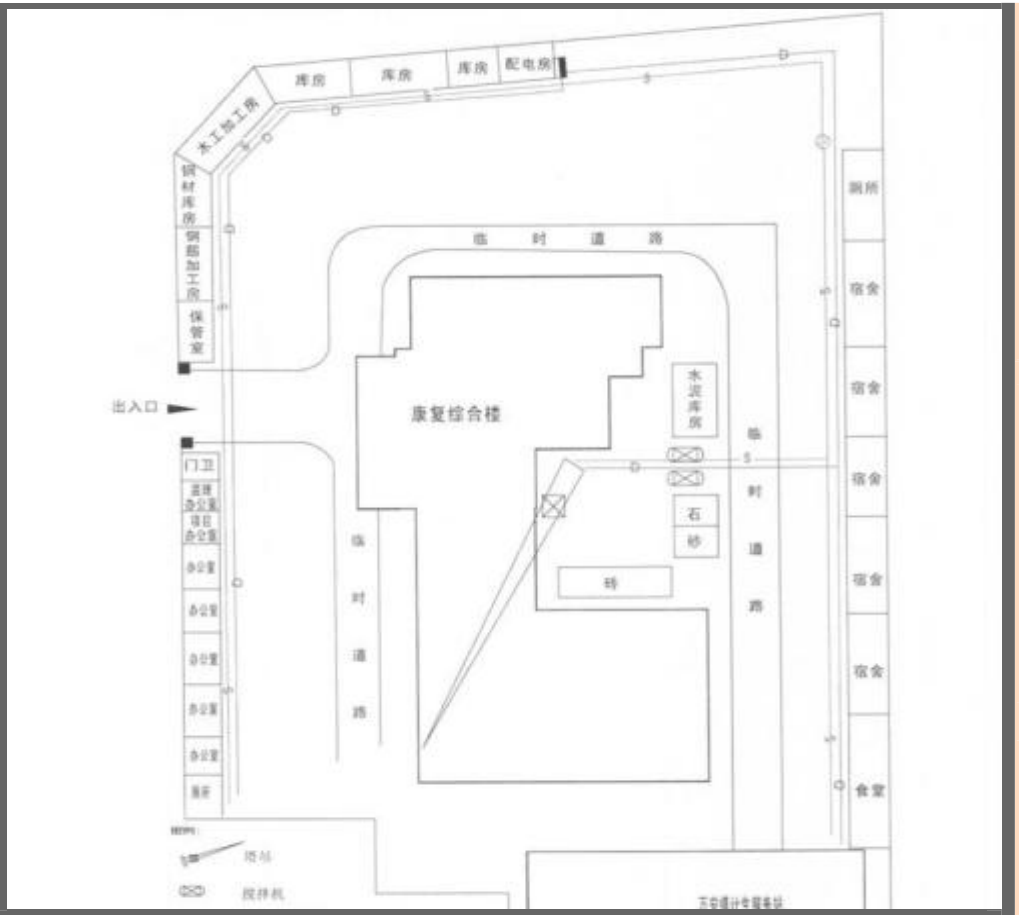

平面圖

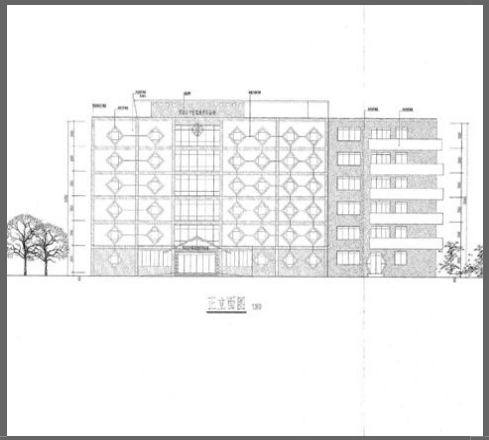

立面圖

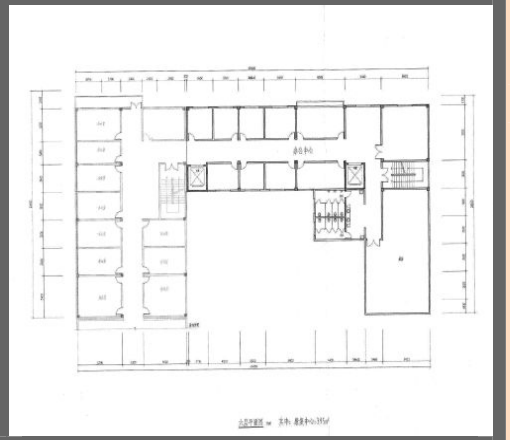

六樓平面圖

預計竣工

2010 年 8 月

最新進度

施工中：正進行地基工程，預計 2010 年 5 月份開展上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 4 月

涪城區吳家鎮中心衛生院

序號： 108

地點： 綿陽市涪城區吳家鎮

估算： 525 萬元人民幣

受災情況


門診住院綜合樓、鍋爐房和職工單身宿舍被列爲 D 級危房。受損建築面積 2,542 m^2，拆除建築面積 2,422 m^2

重建規模

- 綜合樓：2,412 m^2

目標受惠對象

吳家鎮轄區 600,000 人口及周邊多個鄉鎮群眾的醫療 、保健及公共衛生的需求

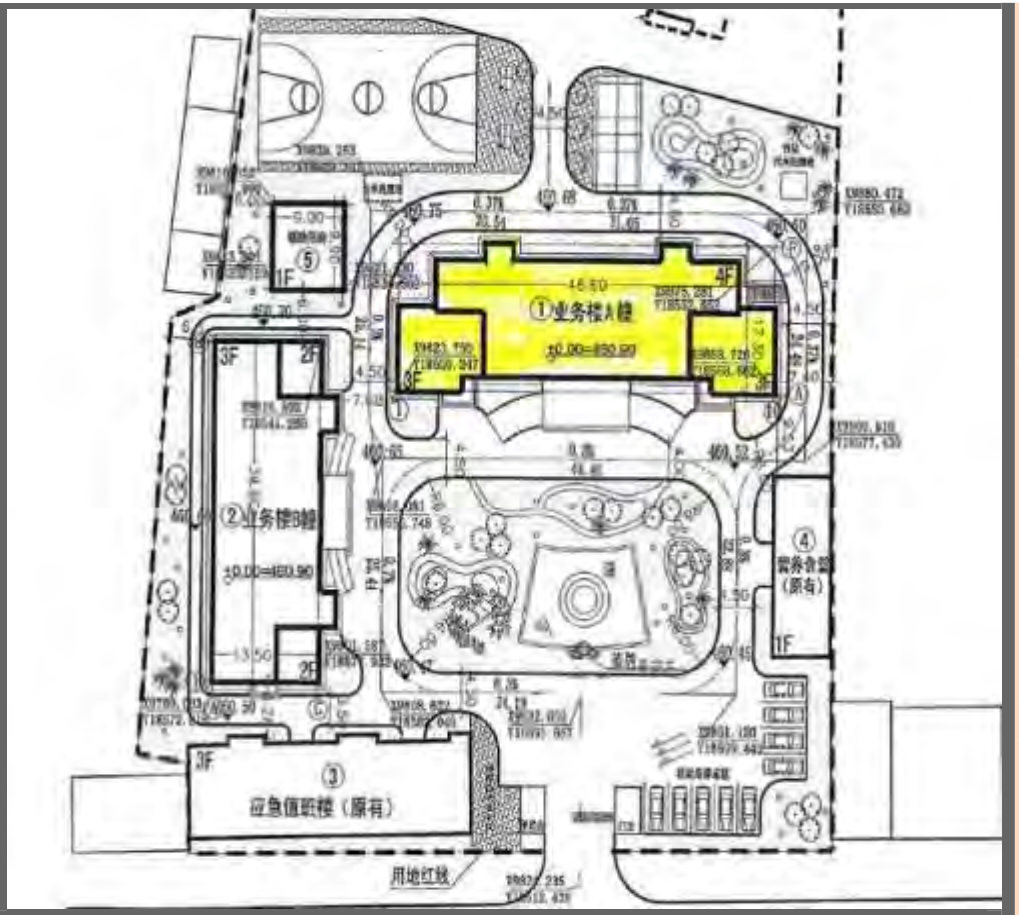

平面圖



鳥瞰圖



選址

預計竣工

2010 年 5 月

最新進度

施工中：已完成上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

三台縣中醫院

序號： 109

地點： 綿陽市三台縣潼川鎮

估算： 3,500 萬元人民幣

受災情況

醫院受損建築面積 13,038 m^2，拆除建築面積 7,003 m^2，加固建築面積 6,035 m^2

重建規模

- 住院大樓：10,000 m^2

目標受惠對象

三台縣 1,480,000 人口和周邊地區患者的就醫需求



平面圖



鳥瞰圖



效果圖

預計竣工

2011 年 2 月

最新進度

施工中：正進行地基工程，預計 2010 年 5 月份開展上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 3 月

梓潼縣中醫院

序號： 110

地點： 綿陽市梓潼縣文昌鎮

估算： 4,307 萬元人民幣

受災情況

門診大樓被列為 D 級危房，受損建築面積 14,234 m^2，拆除建築面積 14,234 m^2

重建規模

- 門診大樓：6,000 m^2
- 住院大樓：7,000 m^2
- 輔助用房及連廊：1,234 m^2

目標受惠對象

為梓潼縣人口 380,000 人及覆蓋面積約 600,000 人提供中醫院正常的醫療保鍵工作



平面圖



鳥瞰圖



受災情況

預計竣工

2011 年 9 月

最新進度

施工中：正進行地基工程，預計 2010 年 5 月份開展上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 4 月



2010 年 2 月

滎經縣人民醫院

序號： 112

地點： 雅安市滎經縣

估算： 2,400 萬元人民幣

受災情況

醫院受損建築面積 7,500 m^2，加固建築面積 7,500 m^2

重建規模

- 業務用房：5,982 m^2

目標受惠對象

滎經縣總人口 150,000 人



平面圖



鳥瞰圖



立面圖

預計竣工

2011 年 8 月

最新進度

設計中：預計工程 2010 年 8 月份動工

名山縣人民醫院

序號： 113

地點： 雅安市名山縣

估算： 4,220 萬元人民幣

受災情況


醫院受損建築面積 10,306 m^2，倒塌建築面積 1,200 m^2，拆除建築面積 4,439 m^2

重建規模

- 門診綜合樓：7,320 m^2
- 食堂、供應室：1,136 m^2
- 維修加固：4,667 m^2

目標受惠對象


名山縣 270,000 人口

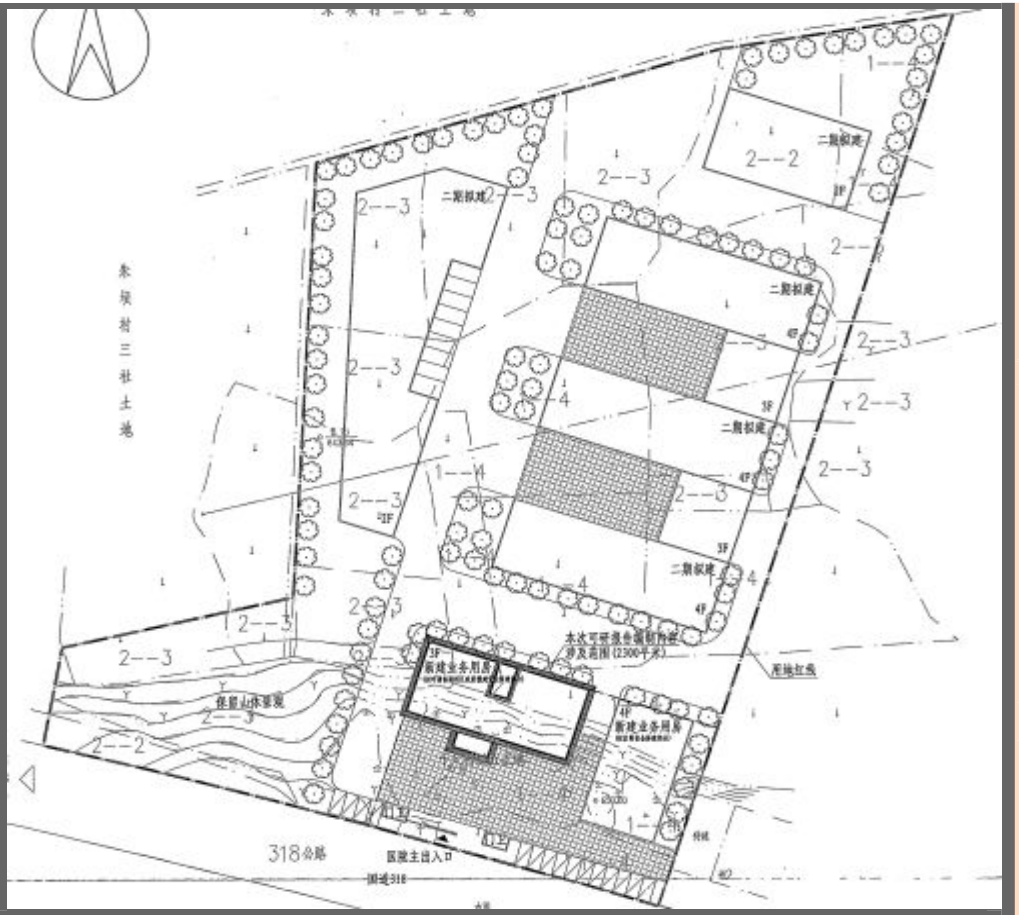

平面圖



立面圖

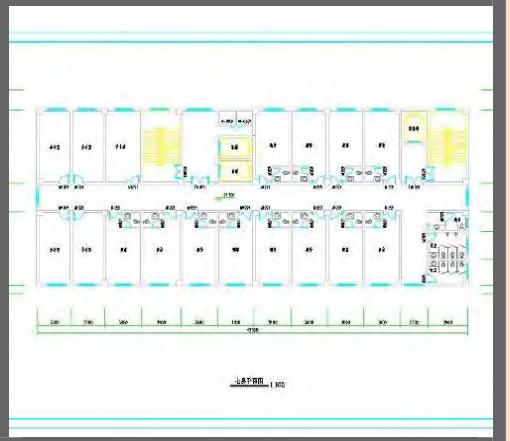

一樓平面圖

預計竣工

2011 年 7 月

最新進度

設計中：預計工程 2010 年 8 月份動工

百丈中心衛生院

序號： 114

地點： 雅安市名山縣

估算： 482 萬元人民幣

受災情況


受損建築面積：5,870 m^2

重建規模


•綜合醫院：1,564 m^2

目標受惠對象


鄉鎮人口約 100,000 人

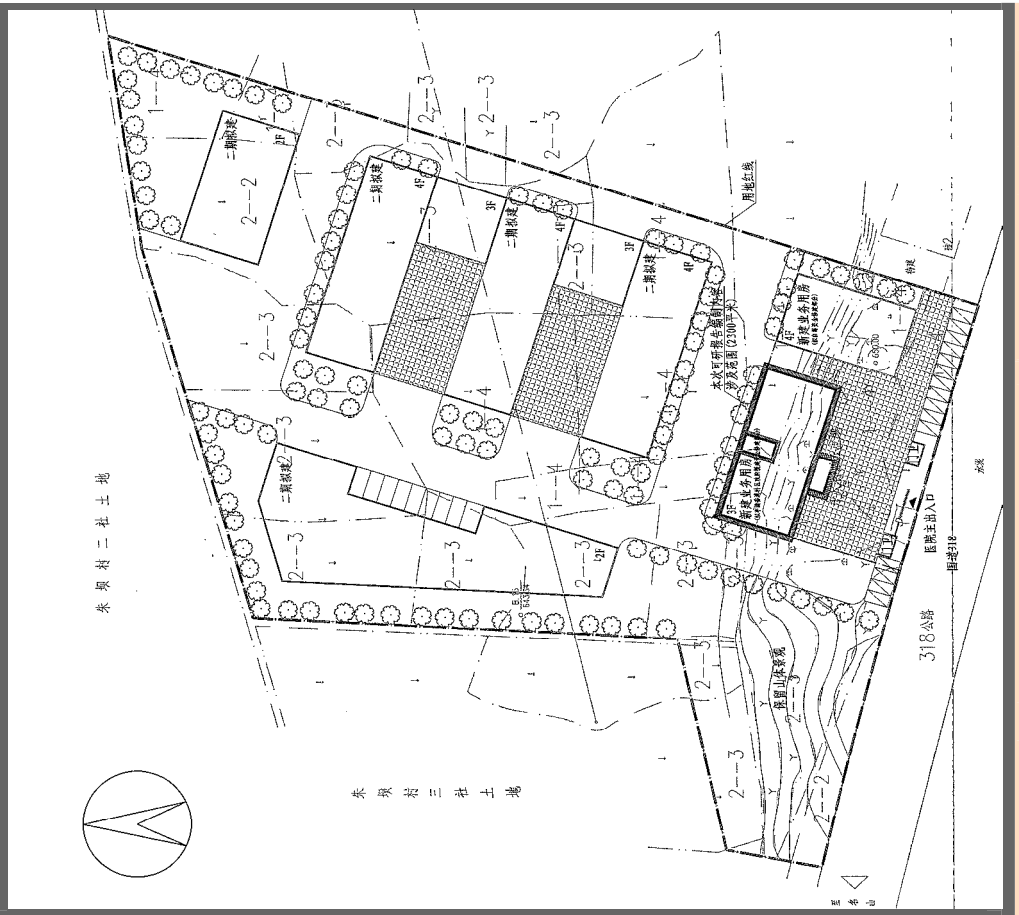

平面圖

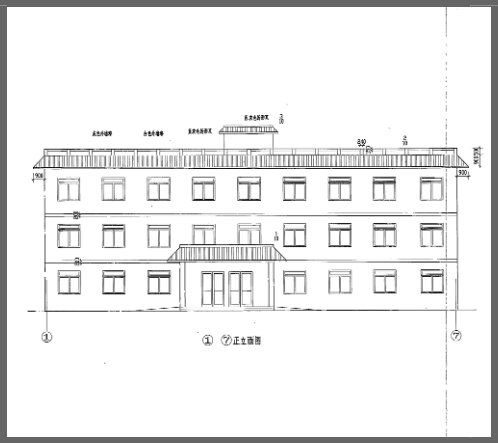

立面圖

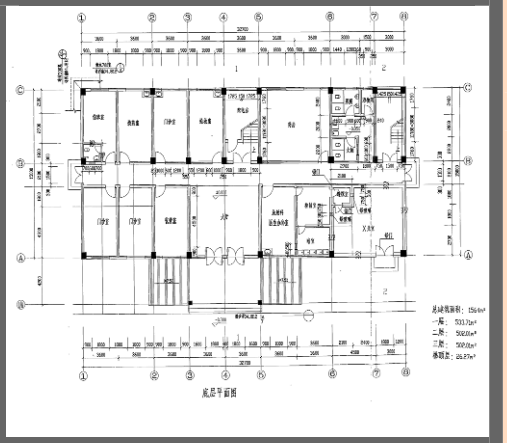

底層平面圖

預計竣工

2011 年 7 月

最新進度

設計中：預算 2010 年 8 月動工

儀隴縣婦幼保健院

序號： 115

地點： 南充市儀隴縣

估算： 905 萬元人民幣

受災情況

拆除建築面積：3,600 m^2

重建規模

•業務綜合樓:3,600 m^2

目標受惠對象


儀隴縣人口約 1,080,000，當中包括婦女兒童 720,000 人



平面圖



立面圖

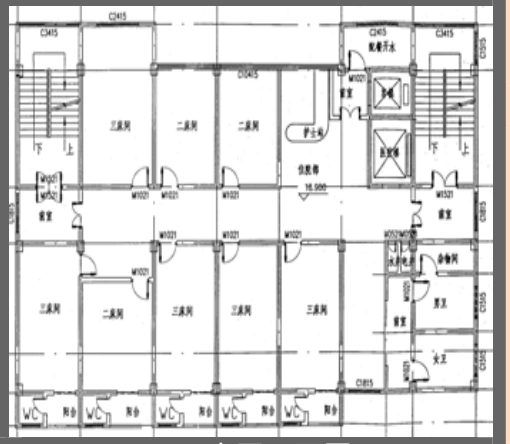

二至六層平面圖

預計竣工

2010 年 11 月

最新進度

施工中



2010 年 3 月



2010 年 2 月



2010 年 1 月

仁壽縣精神衛生保健院

序號： 116

地點： 眉山市仁壽縣

估算： 1,400 萬元人民幣

受災情況


損毀嚴重，被鑒定為危房

重建規模

•住院部綜合醫院：3,868 m^2

目標受惠對象

服務仁壽縣包括轄區 60 個鄉鎮，人口約 1,620,000

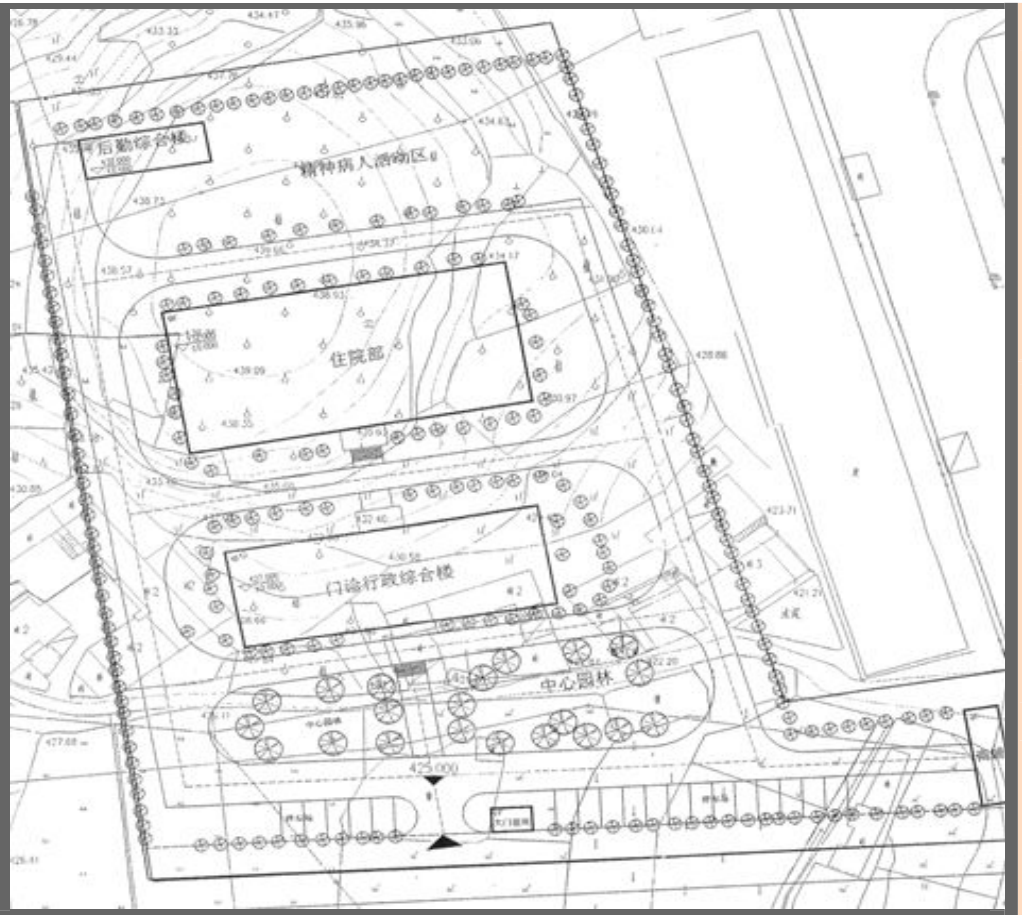

平面圖



鳥瞰圖



規劃圖

預計竣工

2010 年 12 月

最新進度

施工中



2010 年 3 月



2010 年 3 月



2010 年 3 月

宣漢縣人民醫院第二住院大樓

序號： 117
地點： 達州市宣漢縣
估算： 3,500 萬元人民幣

受災情況
醫院被列為 D 級危房
受損建築面積：7,372 m^2

重建規模
•第二住院大樓：14,820 m^2


目標受惠對象
宣漢地區約 1,280,000 人口



平面圖



效果圖

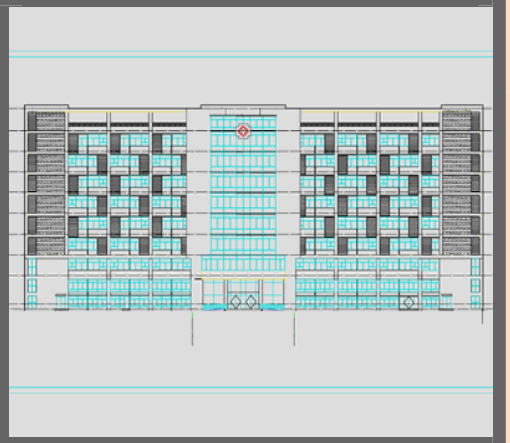

立面圖

預計竣工
2011 年 10 月

最新進度
施工中



2010 年 3 月



2010 年 2 月



2010 年 1 月

樂至縣石湍中心衛生院

序號： 118

地點： 資陽市樂至縣

估算： 773 萬元人民幣

受災情況

醫院被列為 D 級危房，受損建築面積 900 m^2，拆除建築面積 880 m^2

重建規模

- 住院大樓：2,665 m^2

目標受惠對象


石湍鎮農村人口約 40,000 及城鎮居民的基本醫療、預防、保健、康復服務



平面圖



立面圖

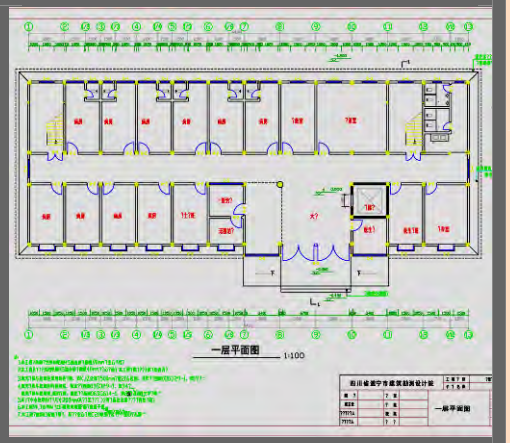


一層平面圖

預計竣工

2010 年 10 月

最新進度

施工中

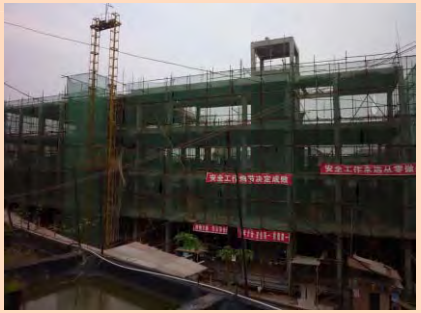

2010 年 4 月



2010 年 3 月



2010 年 2 月

平昌縣人民醫院

序號： 119

地點： 巴中市平昌縣

估算： 2,898 萬元人民幣

受災情況

D 級危房面積：6,580 m^2


C 級危房面積：3,860 m^2

重建規模

•門診醫技綜合樓：9,660 m^2

目標受惠對象


平昌縣人口約 1,030,000

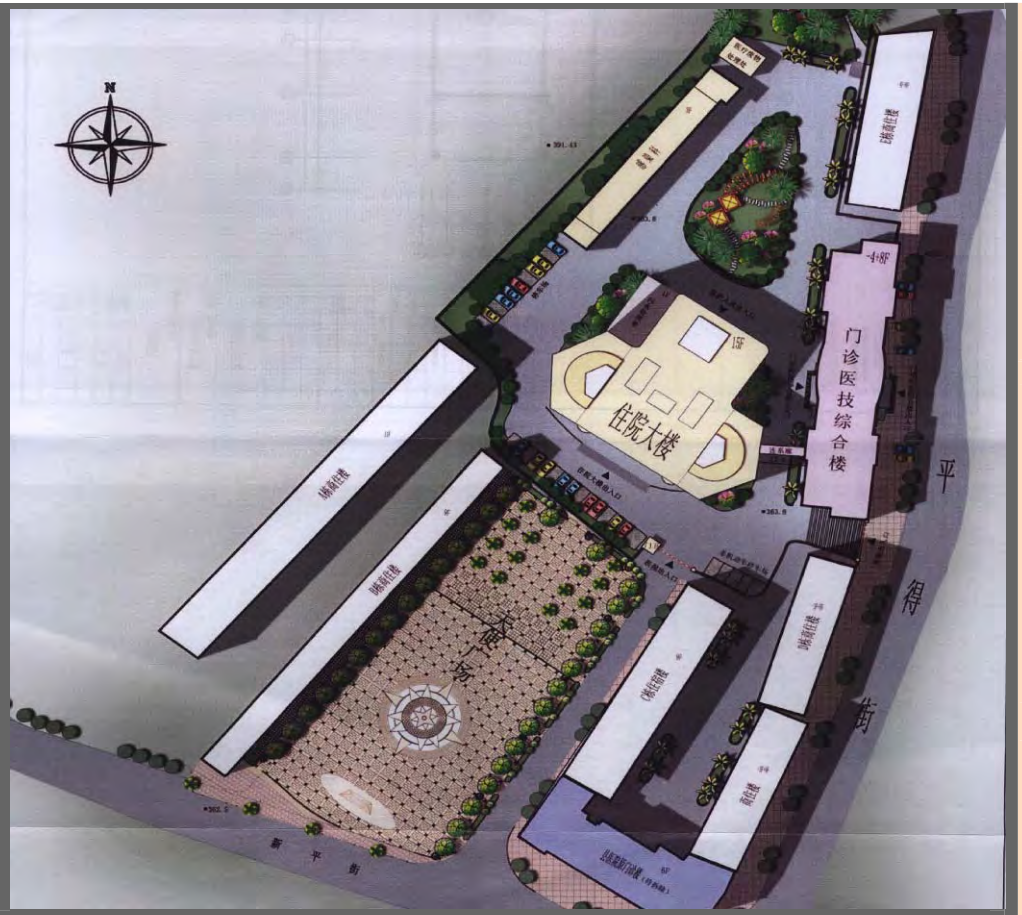

平面圖



立面圖

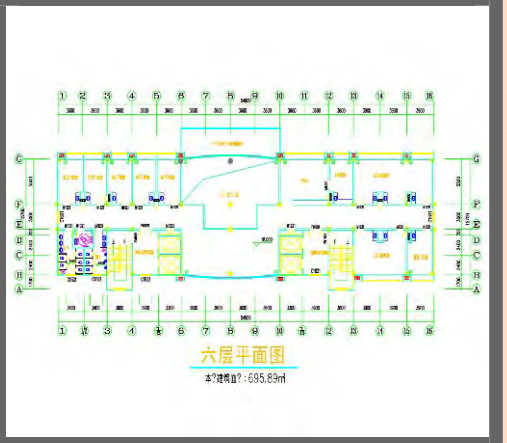

六層平面圖

預計竣工

2011 年 7 月

最新進度

施工中：剛開始地盤平整

南江縣人民醫院

序號： 120

地點： 巴中市南江縣

估算： 4,725 萬元人民幣

受災情況

醫院被列為 D 級危房，受損建築面積：3,128 m^2

重建規模

•門診醫技綜合樓：14,158 m^2

目標受惠對象

南江縣人口約 650,000



平面圖



鳥瞰圖



立面圖

預計竣工

2012 年 1 月

最新進度

施工中：剛開始地盤平整

東汽醫院(德陽市第六人民醫院)

序號： 121

地點： 德陽市旌陽區

估算： 1 億 1,570 萬元人民幣

受災情況


受損建築面積：11,324 m^2

重建規模

- 門診綜合大樓：7,759 m^2
- 醫技大樓：3,225 m^2
- 住院大樓：19,063 m^2
- 保障系統及生活用房：1,564 m^2

目標受惠對象


德陽經濟技術開發區 30,000 名東汽職工、家屬和數萬災區移民及河東片區約 300,000 居民

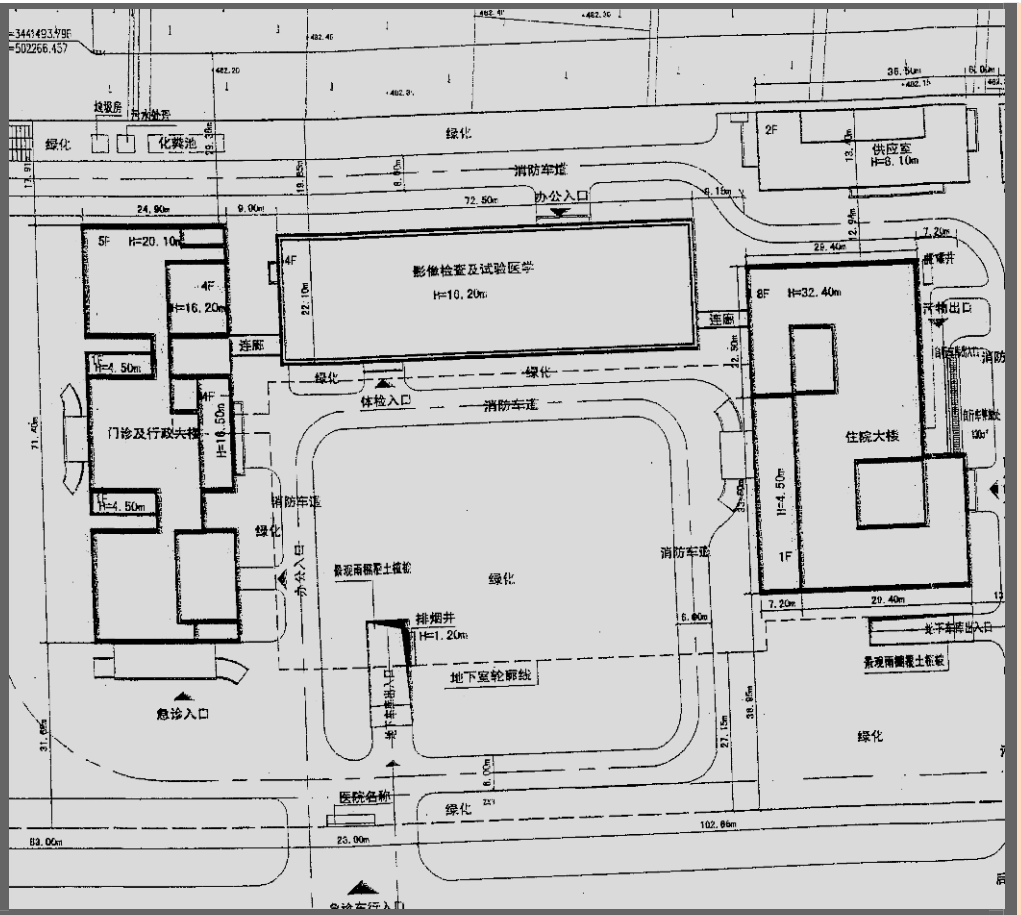

平面圖



鳥瞰圖

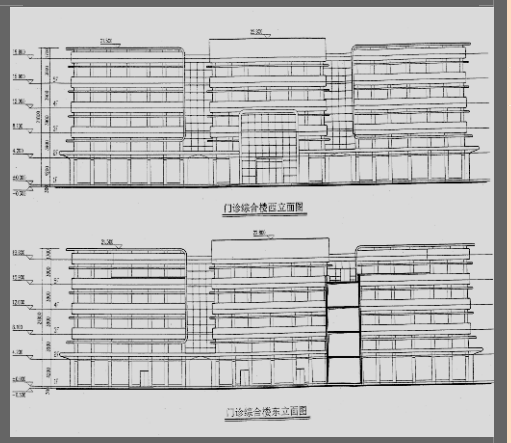


立面圖

預計竣工

2010 年 11 月

最新進度

施工中

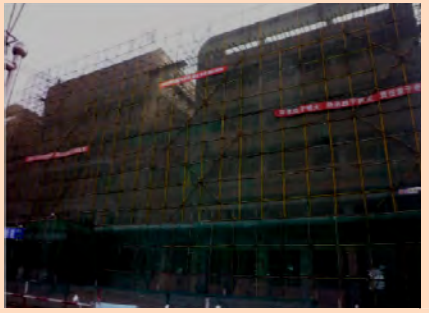

2010 年 3 月



2010 年 1 月



2009 年 2 月

德陽市第二人民醫院 (二期工程)

序號： 122
地點： 德陽市岷江西路一段
估算： 4,529 萬元人民幣

受災情況


住院綜合樓被列為 D 級危房，受損建築面積 13,264 m^2，拆除建築面積 13,264 m^2

重建規模


- 內科住院大樓：14,000 m^2

目標受惠對象

全市及周邊縣市鄉鎮 3,820,000 人口，覆蓋 5,954 km^2

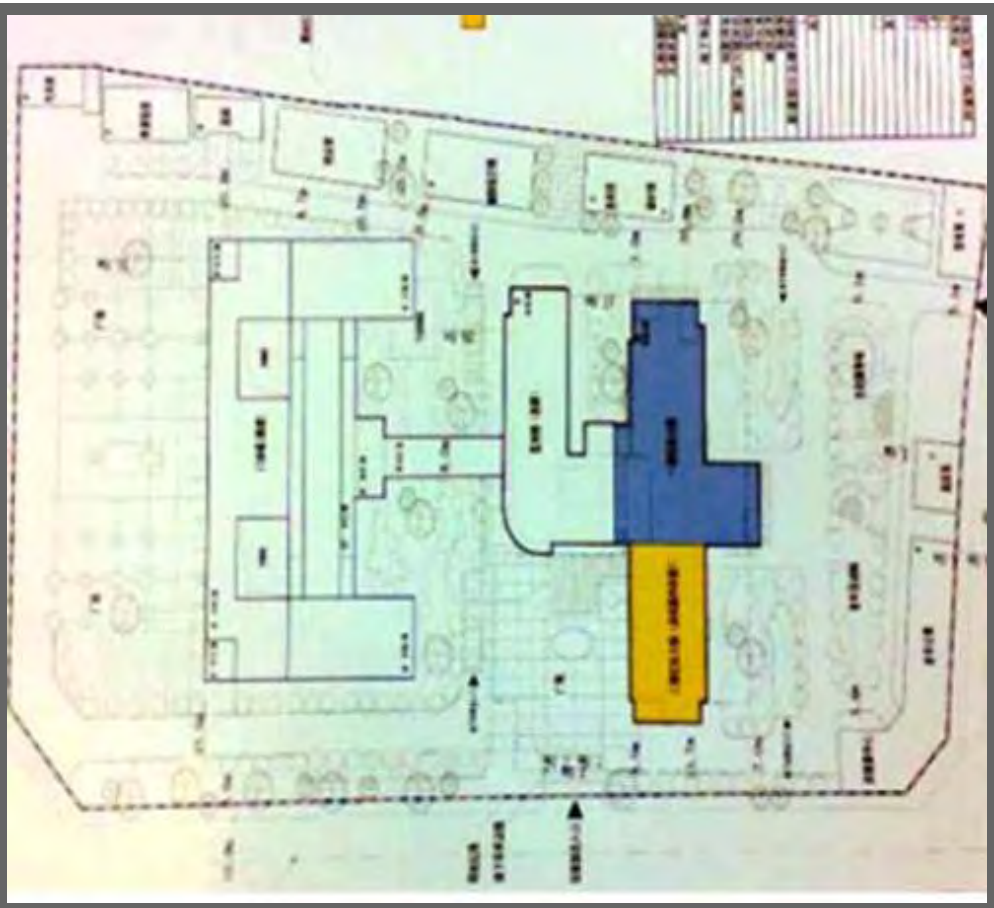

平面圖

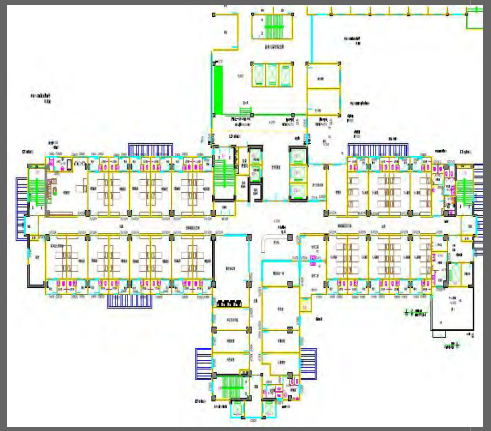

一樓平面圖



鳥瞰圖

預計竣工

2011 年 3 月

最新進度

施工中：預計 2010 年 6 月份開展上蓋工程



2010 年 4 月



2010 年 3 月



2010 年 2 月

雅安市中醫院

序號： 149

地點： 雅安市雨城區縣前街

估算： 4,596 萬元人民幣

受災情況


住院大樓被列為 C 級危房，受損建築面積 4,882 m^2，拆除建築面積 4,882 m^2

重建規模

- 住院綜合大樓：15,475 m^2

目標受惠對象

雅安市 1,530,000 人口

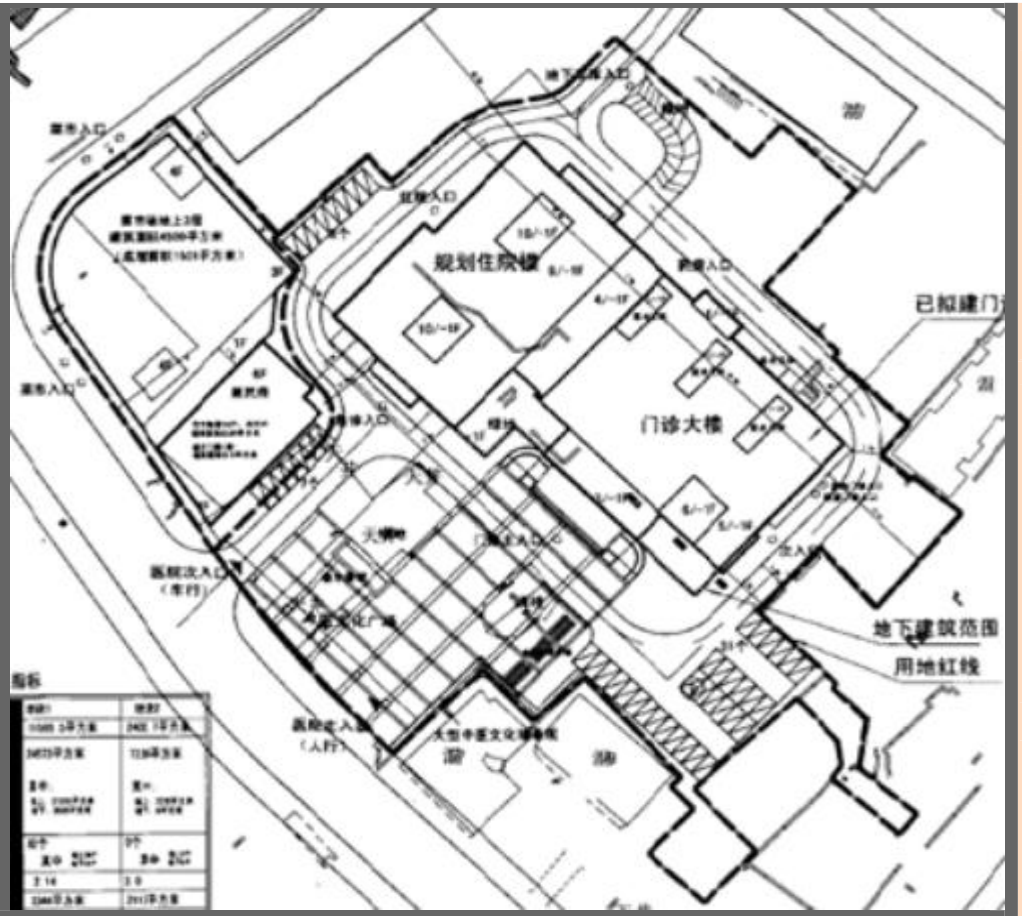

平面圖



醫院現況圖



新建部份附近環境圖

預計竣工

2011 年 8 月

最新進度

設計中：預計 2010 年 8 月動工

雅安市婦幼保健院

序號： 150
地點： 雅安市雨城區育才路
估算： 1,240 萬元人民幣

受災情況
受損建築面積 2,851 m^2

重建規模
- 維修小北街門診樓：688 m^2
- 維修業務用房：2,163 m^2
- 擴建：608 m^2

目標受惠對象
雅安市 1,530,000 人口，全市 7 歲以下兒童 97,000，18 – 49 歲育齡婦女 403,000 萬



平面圖


現況


業務用房平面圖

預計竣工
2011 年 10 月

最新進度
設計中：預計 2010 年 8 月動工

華西醫院遠端醫療網絡平臺

序號： 151

地點： 四川大學華西醫院及 286 個遠程終端系統

估算： 5,660 萬元人民幣

受災情況


51 個重災縣二級綜合醫院中：與華西醫院建成遠程系統的有 37 家， 其中有 12 家的醫院設備嚴重毀損

重建規模

- 在華西醫院現有遠程醫學網絡平臺基礎上部署華西遠程醫學系統
- 設立 286 個遠程終端機
- 購買設備及儀器 39 台
- 購買遠程終端系統 286 套

目標受惠對象

西部 12 個省市，近 5 億人口

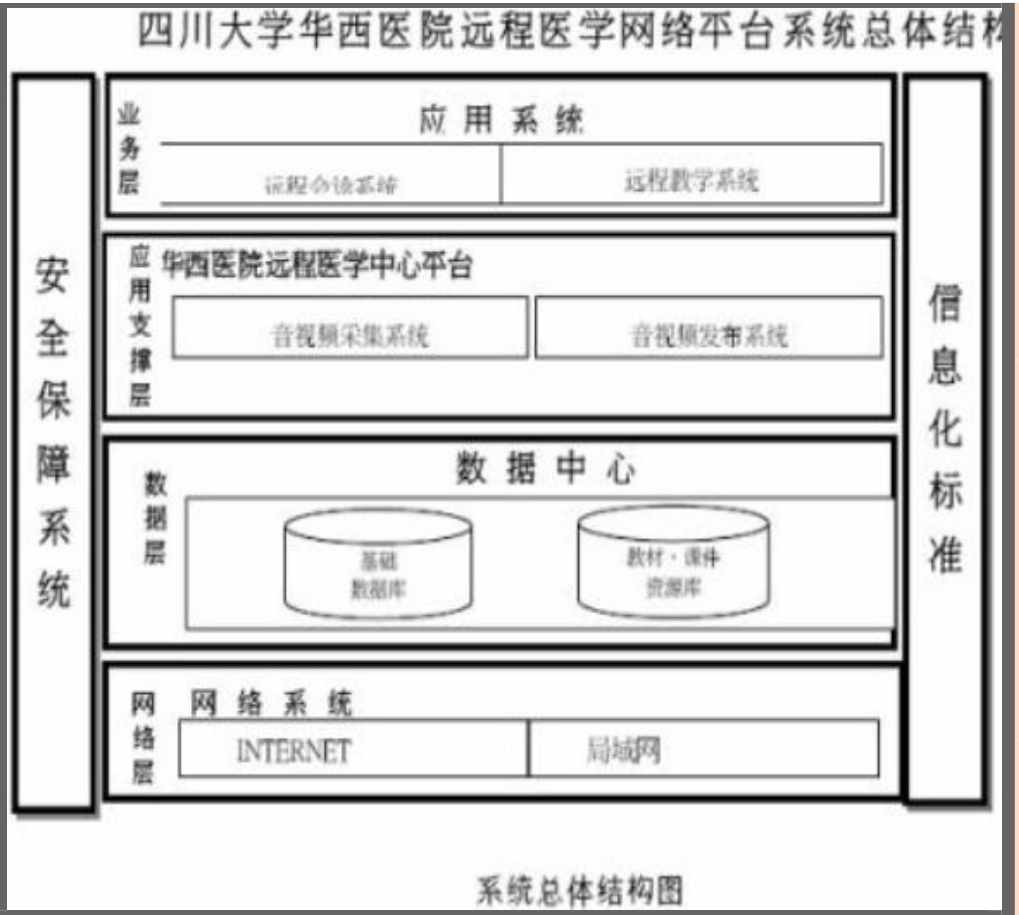

系統總體結構圖



現有遠程終端機



遠程教學室

預計竣工

2011 年 12 月

最新進度

設計中：預計 6 月底前完成初步設計

綿陽市中心醫院

序號： 152

地點： 綿陽市涪城區涪城路

估算： 4,000 萬元人民幣

受災情況


內科康復樓（ 內科樓）、腫瘤科樓 、內六內七樓（ 醫技綜合樓）被列為 D 級危房，受損建築面積 9,822 m^2，醫療設備受損 274 台

重建規模


- 康復腫瘤大樓：10,182 m^2

目標受惠對象


綿陽市涪城區 63.9 萬人口

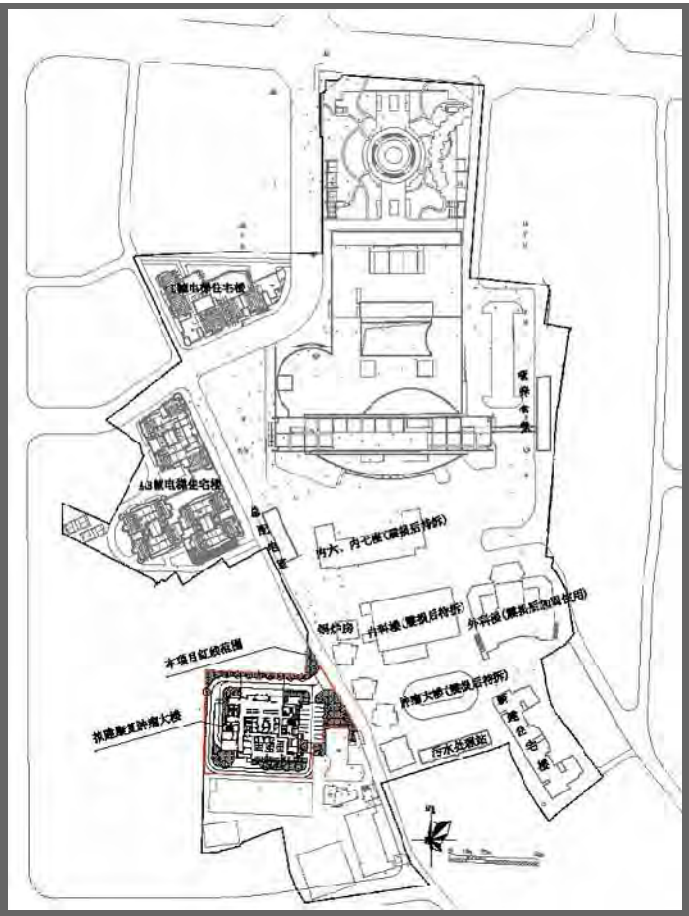

平面圖

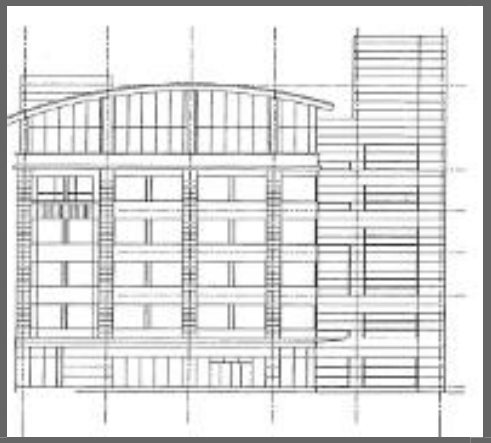

立面圖

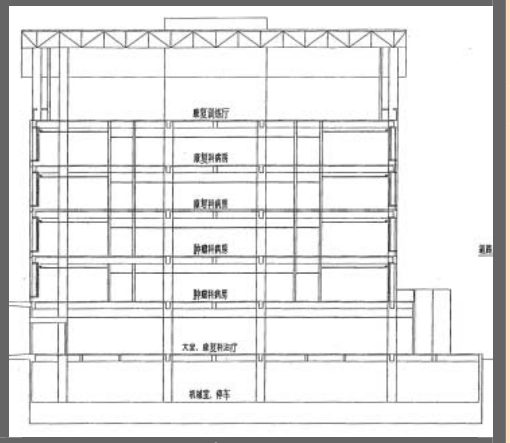

剖面圖

預計竣工

2011 年 11 月

最新進度

設計中：預計 2010 年 6 月動工

綿陽市中醫院

序號： 153

地點： 綿陽市涪城區涪城路

估算： 8,700 萬元人民幣

受災情況


門診樓被列為 D 級危房，眼科大樓被列為 C 級危房，住院大樓被列為 B 級危房。受損建築面積共 29,527 m^2，

重建規模

- 門急診綜合樓：18,212 m^2
- 維修眼科大樓、住院大樓：23,478 m^2

目標受惠對象

綿陽市 530 萬人口

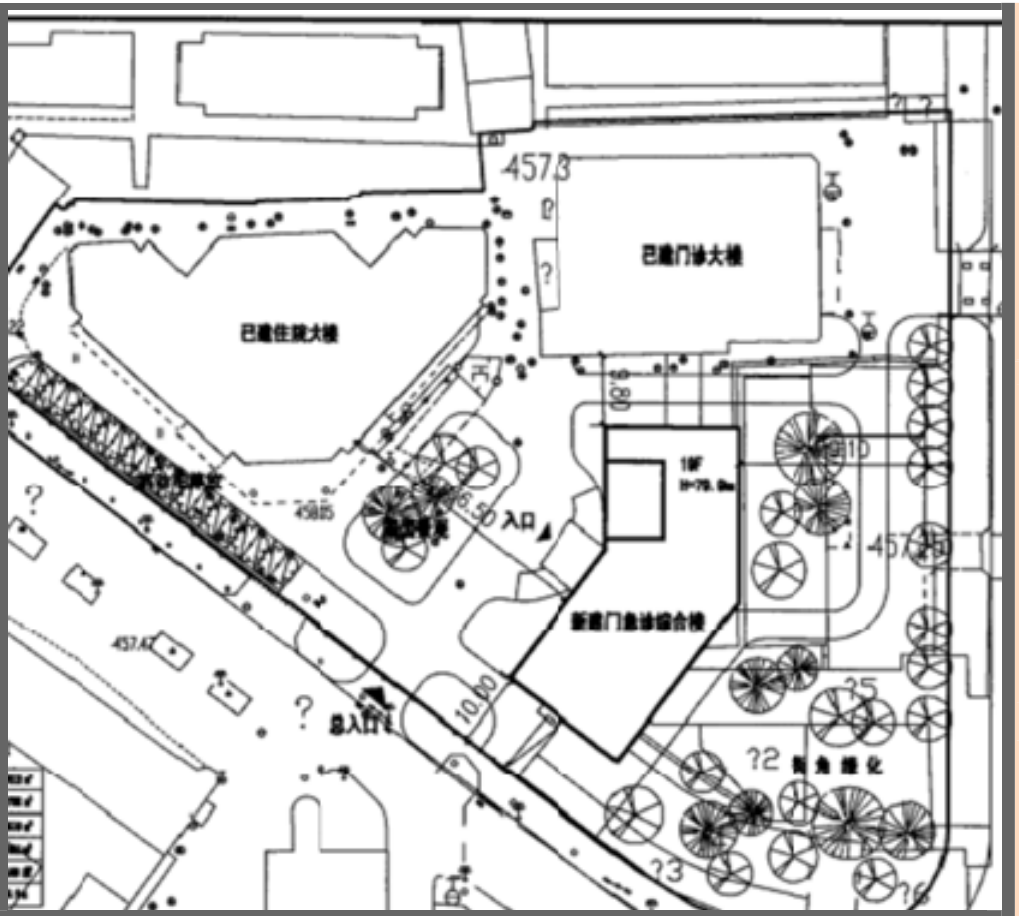

平面圖



受災前立面圖



效果圖

預計竣工

2012 年 2 月

最新進度

設計中：準備招標

綿陽市婦幼保健院

序號： 154

地點： 綿陽市涪城區花園北街

估算： 1,400 萬元人民幣

受災情況

醫療業務用房附樓被列為 C 級危房，受損建築面積 2,406 m^2

重建規模

- 醫療業務用房附樓：3,677 m^2

目標受惠對象


綿陽市 5,300,000 人口



平面圖



現況

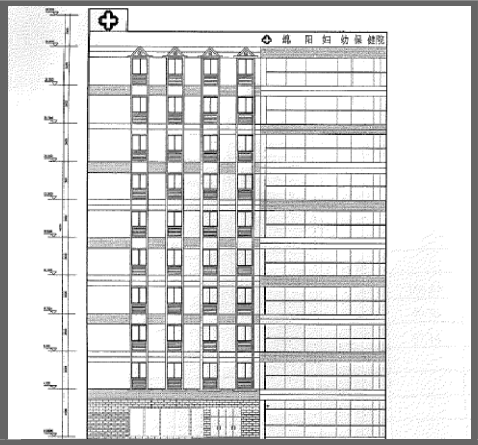

立面圖

預計竣工

2011 年 5 月

最新進度

設計中：預計 2010 年 6 月完成施工設計圖

序號	申請機構	申請項目	資助額 (萬港元)
1	九龍西區扶輪社有限公司 聯同 工程界社促會	德陽市旌陽區袁家小學災後重建	150
2	中國福音事工促進會有限公司	南充市高坪區第三初級中學教學樓災後重建	1,000
3	中國福音事工促進會有限公司	南充市高坪區白塔中學初中部災後重建	1,000
4	青年發展基金	四川災後心理康復培訓及服務計劃	798
5	苗圃行動	德陽市中江縣聯合鎮中心學校群星分校災後重建及師資培訓	704
6	苗圃行動	德陽市中江縣石泉鄉九年一貫制中心校災後重建及師資培訓	816
7	香港教育工作者聯會教育機構有限公司	德陽市中江縣永豐鄉中心學校永豐小學災後重建	200
8	香港理工大學(醫療科技及資訊學系)	四川地震災區假肢及矯形專業培訓支援計劃	432
9	香港理工大學(康復治療科學系)	四川地震災區物理治療及職業治療專業培訓支援計劃	611
10	香港復康會	四川地震災區社區復康資源中心	784
11	香港童軍總會	德陽市青少年宮重建及支援	1,045
12	華裔骨科學會「站起來」計劃	川港康復培訓及發展中心（首階段）	1,167
13	華裔骨科學會「站起來」計劃	川港康復培訓及發展中心（第二階段）	3,429
14	青年發展基金	四川災後復康支援網絡計劃	402
15	香港童軍總會	綿陽市青少年活動中心重建及支援	2,832
16	SCMP Charities Limited	南華早報希望之家	1,000
17	「源」慈善基金有限公司	「512 災後重建行動」 - 醫療建設項目	725

18	香港基督教青年會	金堂縣學校災後改及擴建項目	1,000
19	香港基督教青年會	蓬安縣龍蠶初級中學災後重建項目	1,000
20	香港教育工作者聯會教育機構有限公司	四川省綿陽市三台縣上新鄉初級中學	200
21	香港教育工作者聯會教育機構有限公司	四川省綿陽市三台縣樂加初級中學	200
22	香港關懷行動慈善有限公司	四川崇州災區幼兒園(幼稚院)重建	500
23	雅博慈善基金會有限公司	四川省西充縣人民醫院綜合業務樓災後重建工程項目	1,000
24	無國界社工有限公司	擂鼓社區服務處	576
25	香港教育工作者聯會教育機構有限公司	四川省德陽市中江縣興隆鎮中心小學	200
26	香港教育工作者聯會教育機構有限公司	四川省綿陽市市轄區綿陽市民族初級中學	200
27	救世軍港澳軍區	羅江縣人民醫院救護車項目	40
28	救世軍港澳軍區	羅江縣萬安鎮康復中心項目	244
29	救世軍港澳軍區	羅江縣金山鎮 17 個村衛生站及設備建設項目	239
30	救世軍港澳軍區	羅江縣鄉鎮衛生院醫療設備項目	456
31	救世軍港澳軍區	羅江縣御營鎮衛生院醫療設備項目	96
32	華裔骨科學會「站起來」計劃	川港康復培訓及發展中心（第三階段）	3,418
33	九龍西區扶輪社有限公司 聯同 工程界社促會	四川省北川縣通口鎮防疫康復中心	100
34	九龍西區扶輪社有限公司 聯同 工程界社促會	四川省北川縣通口鎮 13 條村救急及康健中心	450
		總計	27,014

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 1)	德陽市旌陽區袁家小學災後重建
申請機構	九龍西區扶輪社有限公司 聯同 工程界社促會
主要內容	• 袁家小學的教學樓及學生宿舍有 1,055 平方米在汶川 512 地震中倒塌。另外，約 4,930 平方米校舍被鑑定為危房，需要拆卸重建。 • 原址重建教學樓約 1,800 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 項目涉及資金 257 萬人民幣(折合約為 292 萬港元)，香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」已經撥款 150 萬港元(折合約為 133 萬元人民幣)資助該項目。申請機構捐款 100 萬港元，餘款由旌陽區人民政府籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	600 名學生
資助額	150 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 2)	南充市高坪區第三初級中學教學樓災後重建
申請機構	中國福音事工促進會有限公司
主要內容	• 在汶川 512 地震後，位於南充市高坪區的高坪第三初級中學的教學樓(面積 2,500 平方米)出現地基下沉，被鑑定為危房，已經拆卸重建。另外，同區的高坪第五小學亦因地震造成嚴重損毀，有部分(約 3,780 平方米)被列為危房，需要拆卸重建。為整合資源，當地教育局決定將高坪第五小學與高坪第三初級中學合併。 • 在高坪市第三初級中學原址重建教學樓，建築面積為約 18,300 平方米。 • 項目按《城市普通中小學校建設標準》設計。 • 項目涉及資金 2,198 萬元人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 1,000 萬港元(折合約為 870 萬元人民幣)資助該項目。高坪區人民政府負責籌集約 1,328 萬人民幣。
目標受惠對象數目或服務範圍	5,000 餘名學生
資助額	1,000 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 3)	南充市高坪區白塔中學初中部災後重建
申請機構	中國福音事工促進會有限公司
主要內容	• 在汶川 512 地震後，位於南充市高坪區的白塔中學初中部的教學樓約 3,600 平方米列為危房需要拆卸重建。重建前全校 1,700 多名學生被分流到區內其他學校上課，現已於新建成的校舍內上課。 • 原址重建教學樓約 6,000 平方米，其他重建設施包括學校大門 300 平方米、廣場 3,000 平方米及運動場 12,000 平方米。 • 項目按《城市普通中小學校建設標準》設計。 • 項目涉及資金 1,200 萬元人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 1,000 萬元港幣 (折合約為 870 萬元人民幣)資助該項目，已撥款約 815 萬元港幣。高坪區教育局負責籌集約 330 萬人民幣。
目標受惠對象數目或服務範圍	3,700 多名學生
資助額	1,000 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 4)	四川災後心理康復培訓及服務計劃
申請機構	青年發展基金
主要內容	• 項目主要目的是為已接受初期災後心理輔導培訓的四川前線人員提供持續培訓，並督導他們培訓安置點的社區工作員。最終目的是提高當地大眾對心理健康的認識，以及在選定的臨時重災安置點提供心理康復服務。 • 在臨時安置點推行大規模心理健康教育，包括 ➢ 製作宣傳品，安排健康教育活動；及 ➢ 作初步心理評估，為有需要逼切心理康復服務的災民提供治療及專業康復輔導服務。
目標受惠對象數目或服務範圍	持續培訓已接受初步災後心理康復培訓課程的學員，這些學員又會再培訓安置點的社區工作人員，並在三個安置點為災民提供心理康復工作。
資助額	798 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 5)	德陽市中江縣聯合鎮中心學校群星分校災後重建及師資培訓
申請機構	苗圃行動
主要內容	• 在汶川 512 地震後，位於德陽市中江縣的聯合鎮中心學校群星分校校舍近 1,800 平方米全部損毀，被鑑定為危房，需要拆卸重建。目前，全校 600 多名學生於臨時帳蓬和板房內上課。 • 原址重建教學樓約 1,400 平方米、教工宿舍樓約 900 平方米、學生宿舍約 800 平方米及食堂約 300 平方米，總建築面積為約 3,400 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 另外，申請機構亦會為該校校長和老師安排合適的師資培訓課程，包括校舍保養、電腦、英語方面的培訓。 • 項目涉及資金 841 萬元人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 703.6 萬元港幣 (折合約為 617 萬元人民幣)資助該項目，非工程項目已撥款約 27 萬元港幣。餘款由申請機構及四川省當地政府負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	600 多名學生
資助額	703.6 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 6)	德陽市中江縣石泉鄉九年一貫制中心校災後重建及師資培訓
申請機構	苗圃行動
主要內容	• 在 512 地震後，位於德陽市中江縣石泉鄉九年一貫制中心校校舍近 2,500 平方米全部損毀，被鑑定為危房，已經拆卸重建。 • 項目內容為原址重建教學樓約 1,300 平方米，其他設施共約 3,000 平方米，包括宿舍樓約 2,600 平方米及食堂約 500 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 另外，申請機構亦會為該校校長和老師安排合適的師資培訓課程，包括校舍保養、電腦、英語方面的培訓。 • 項目涉及資金 916 萬元人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 815.7 萬元港幣 (折合約為 716 萬元人民幣)資助該項目，已撥款約 155 萬元港幣(包括工程項目約 129 萬元港幣及非工程項目約 26 萬元港幣)。餘款由申請機構及四川省當地政府負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	1,000 多名學生
資助額	815.7 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 7)	德陽市中江縣永豐鄉中心學校永豐小學災後重建
申請機構	香港教育工作者聯會教育機構有限公司
主要內容	• 在 512 地震後，位於德陽市中江縣永豐鄉中心學校永豐小學的教學樓(近 1,000 平方米)嚴重損毀，被鑑定為危房，需要拆卸重建。另外，約 600 平方米校舍需要維修加固。目前全校近 700 名學生於臨時板房內上課。 • 申請機構與四川省教育廳計劃異址重建永豐小學，面積約 4,800 平方米，包括教學樓約 1,600 平方米、教學綜合樓約 1,600 平方米及學生宿舍約 1,600 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 項目涉及資金 784 萬人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 200 萬港元(折合約為 172 萬元人民幣)資助該項目。申請機構捐款約 165 萬人民幣，餘款約 447 萬人民幣由四川省教育廳負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	約 700 名學生
資助額	200 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 8)	四川地震災區假肢及矯形專業培訓支援計劃
申請機構	香港理工大學 (醫療科技及資訊學系)
主要內容	• 為加強對假肢矯形人才培訓，建議項目包括香港理工大學與四川大學合辦康復工程 (假肢矯形專業)本科課程。 • 計劃亦建議三年內為康復人員舉辦多次短期在職培訓課程
目標受惠對象數目或服務範圍	計劃每年培訓二十多名假肢矯形專業本科課程畢業生，為傷員提供服務，完善四川省的康復網絡，從而提升省內的康復服務水平。同時透過在職培訓，提升四川康復人員的專業水平。
資助額	431.6 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 9)	四川地震災區物理治療及職業治療專業培訓支援計劃
申請機構	香港理工大學 (康復治療科學系)
主要內容	• 協助四川大學培養物理治療及職業治療專業人員，提升該校師資設施。 • 與四川大學合作開辦短期物理治療及康復治療培訓課程
目標受惠對象數目或服務範圍	• 培養四川首批專業的物理治療師及職業治療師 • 三年後，數十名專業物理治療、職業治療師可投入為災員服務，完善四川省的康復網絡，從而提升省內的康復服務水平。
資助額	610.5 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

建議項目(序號: 10)	四川地震災區社區復康資源中心
申請機構	香港復康會
主要內容	• 地震發生後，四川許多縣市和鄉鎮的居民骨折、脊髓損傷或有腦外傷等傷患，變成殘疾人士。殘疾的災民返回社區生活，需要有系統的社區支援服務以配合他們在康復、適應環境和社會心理等需要。 • 建議成立一個資源中心，配備流動專家團隊，向四川省內的災區醫院/醫療站、社會福利機構和復康機構提供培訓及指導，協助當地進行社區復康計劃。計劃為災區內有需要人士提供心理社區復康、自我照顧及康復技巧訓練，並建立社區康復網絡服務，以幫助災區殘疾人士和慢性病患者及其家庭掌握殘疾和疾病的自我管理技巧。
目標受惠對象數目或服務範圍	四川省地震災區的殘疾人士及其家庭。預算可於三年內透過資源中心、培訓課程、專題講座、工作坊、家訪和殘疾意識醒覺活動等惠及約 9,600 人。
資助額	783.6 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 11)	德陽市青少年宮重建及支援
申請機構	香港童軍總會
主要內容	香港童軍總會擬重建德陽市青少年宮，並在完成重建後，協助德陽市青少年宮推行災區青少年素質訓練課程，協助災區青少年心靈的重建，使其能重拾信心，面對逆境挑戰，健康成長。
目標受惠對象數目或服務範圍	德陽市及附近災區的青少年。預算可於五年內以宿營、日營及課堂方式惠及約 4.4 萬青少年，其中受資助的災區青少年約 1.3 萬。
資助額	1,045 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 12)	川港康復培訓及發展中心 (首階段)
申請機構	華裔骨科學會「站起來」計劃
建議項目主要內容	「川港康復培訓及發展中心」旨在為將會建成的「川港康復中心」成立一隊包含不同層次、不同專業及不同學科的康復醫療團隊，培訓 1,000 名康復專才。
目標受惠對象數目或服務範圍	為四川醫護界培養 1,000 名專業康復人才，再配合將來「川港康復中心」提供的康復服務，受惠對象將會是未來在「川港康復中心」接受治療和服務的傷員。
資助額	1,167 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

建議項目(序號: 13)	川港康復培訓及發展中心 (第二階段)
申請機構	華裔骨科學會「站起來」計劃
主要內容	• 此階段的內容包括開展進階及高階培訓，舉辦約 6 次的大型培訓及約 20 次的實習和技術工作坊。 • 計劃亦會繼續為當地傷員提供協助，包括義肢安裝和康復服務，包括物理治療、技能訓練、心理和就業輔導等。
目標受惠對象數目或服務範圍	為四川醫護界培養 1,000 名專業的康復人才，再配合將來「川港康復中心」提供的康復服務，受惠對象將會是未來在「川港康復中心」接受治療和服務的傷員。
資助額	3,429 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 14)	四川災後復康支援網絡計劃
申請機構	青年發展基金
主要內容	• 建議計劃是利用思科(CISCO)公司所捐贈的資訊科技器材及相關技術支援，為川港康復治療提供先進的網路和通信技術，並且通過網真系統使川港在截肢、身體或心理和精神康復，及相關培訓領域建立高質量的連接。思科(CISCO)公司為四川地震災區的康復服務捐贈三套網真(Telepresence)系統，分別設置在香港突破青年村、四川省人民醫院及一部流動醫療車內。 • 青年發展基金將統籌有關網絡服務的推行，部分其他在四川參與重建工作的本港非政府機構亦會使用有關網絡。
目標受惠對象數目或服務範圍	網真服務將有 7 間機構使用，網絡會議設施將有 8 間機構使用，流動醫療車計劃到訪數百個較偏遠的災區。
資助額	402 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 15)	綿陽市青少年活動中心重建及支援
申請機構	香港童軍總會
主要內容	香港童軍總會擬重建綿陽市青少年活動中心，並在完成重建後，協助綿陽市青少年活動中心推行災區青少年素質訓練課程，協助災區青少年心靈的重建，使其能重拾信心，面對逆境挑戰，健康成長。
目標受惠對象數目或服務範圍	綿陽市及附近災區的青少年。預算可於五年內以宿營、露營、日營及課堂方式惠及超過 23 萬青少年，其中受資助的災區青少年約 12.6 萬。
資助額	**2,832** 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 16)	南華早報希望之家
申請機構	SCMP Charities Limited
主要內容	(a) 以提供建築材料實物方式，在綿竹市九龍鎮協助重建共 979 戶農房。 (b) 在九寨溝馬家鄉協助興建: ● 一段約 4 公里長的道路 ● 安裝一段 690 米長的電纜及相關設施 ● 118 台太陽能熱水器 ● 鋪設約 11.6 公里長的供水喉管及興建畜水池 ● 30 座化糞池及相關 1 公里排污管 ● 約 3.3 公里長排水溝 ● 6,350 平方米廣場 ● 670 米長河堤 ● 4 間公共廁所 ● 1 間醫療衞生站
目標受惠對象數目或服務範圍	(a) 綿竹市九龍鎮受惠人數約為 2,400 人 (b) 九寨溝馬家鄉受惠人數約為 507 人
資助額	1,000 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 17)	「512 災後重建行動」計劃- 醫療建設項目
申請機構	「源」慈善基金有限公司
主要內容	重建兩所衛生院： (1) 位於綿陽市涪城區的河邊鎮衛生院 ● 在原址重建門診大樓四層，建築面積約1500平方米，病床設置共40張，並配備基本醫療設備。 (2) 綿陽市三台縣的里程鄉衛生院 ● 在原址重建，新建業務用房約1,200平方米，另維修加固40平方米，病床設置15張，並增添相應醫療設施。衛生院將重建為並列式三層框架結構，配備基本醫療設備。
目標受惠對象數目或服務範圍	受惠人數超過 7 萬人，服務範圍包括醫療服務、預防疾病及保健服務。涪城區河邊鎮衛生院將同時為區內社區保險及新型農村合作醫療定點醫療機構。
資助額	725 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 18)	金堂縣學校災後改及擴建項目
申請機構	香港基督教青年會
主要內容	• 在 512 地震後，金堂縣 7 所小學共有 15,194 平方米嚴重損毀，被鑑定為危房，需要拆卸重建。當地政府計劃將附近山區共 6 所受損學校合併於位於金堂縣三星鎮的港青小學，並將之擴建為九年一貫制學校。現時約 400 名學生被調撥到其他學校上課。 • 申請機構與成都基督教青年會計劃在原址擴建港青小學，面積為約 10,600 平方米，包括教學及輔助用房約 5,300 平方米、行政辦公室約 900 平方米、生活服務用房約 1,500 平方米及學生宿舍約 2,900 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 項目涉及資金 2,020 萬人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 1,000 萬港元(折合約為 870 萬元人民幣)資助該項目。金堂縣政府負責籌集 1,150 萬人民幣。
目標受惠對象數目或服務範圍	1,253 名學生
資助額	1,000 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 19)	蓬安縣龍蠶初級中學災後重建項目
申請機構	香港基督教青年會
主要內容	• 在 512 地震後，南充市蓬安縣龍蠶鎮的龍蠶初級中學約 4,856 平方米嚴重損毀，部分校舍被鑑定為危房，需要拆卸重建。目前，學校需採用分時段分批上課，並在外租房暫代教室。 • 申請機構與成都基督教青年會計劃在原址重建龍蠶初級中學，面積為約 3,500 平方米，包括教學用房約 2,000 平方米、生活用房約 1,000 平方米及辦公室約 500 平方米。另外，維修加固現有用房約 3,500 平方米及擴建運動場約 4,000 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 項目涉及資金 1,132 萬人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 1,000 萬港元(折合約為 860 萬元人民幣)資助該項目，餘款約 272 萬人民幣由蓬安縣政府負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	850 名學生
資助額	1,000 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 20)	四川省綿陽市三台縣上新鄉初級中學
申請機構	香港教育工作者聯會教育機構有限公司　聯同 512 年青工程師大聯盟
主要內容	• 在 512 地震後，上新鄉初級中學近 1,700 平方米校舍嚴重損毀，被鑑定為危房，需要拆卸重建。另外，約 1,000 平方米校舍需要維修加固。約 400 名學生現於活動板房內上課。 • 申請機構與四川省教育廳計劃原址擴建上新鄉初級中學，面積為約 4,200 平方米，包括教學綜合樓約 3,000 平方米、學生公寓約 1,000 平方米及學生食/禮堂約 200 平方米，另新建運動場約 3,800 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 項目涉及資金 730 萬人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 200 萬港元(折合約為 172 萬元人民幣)資助該項目。申請機構捐款 165 萬人民幣，餘款約 393 萬人民幣由三台縣政府負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	500 名學生
資助額	200 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 21)	四川省綿陽市三台縣樂加初級中學
申請機構	香港教育工作者聯會教育機構有限公司　聯同 512 年青工程師大聯盟
主要內容	• 在 512 地震後，樂加初級中學約 3,240 平方米校舍嚴重損毀，被鑑定為危房，需要拆卸重建。另外，約 1,680 平方米校舍需要維修加固。受影響學生目前於臨時帳篷及板房內上課。 • 申請機構與四川省教育廳計劃異址重建校舍面積約 4,000 平方米，包括教學樓約 2,200 平方米、學生公寓樓約 1,500 平方米及學生食/禮堂約 300 平方米。另新建運動場約 6,000 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 項目涉及資金 700 萬人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 200 萬港元(折合約為 172 萬元人民幣)資助該項目，申請機構捐款 165 萬人民幣，餘款約 363 萬人民幣由三台縣政府負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	700 名學生
資助額	200 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 22)	四川崇州災區幼兒園(幼稚院)重建
申請機構	香港關懷行動慈善有限公司　聯同　香港大學土木工程系"明德工程"
主要內容	• 在 512 地震後，崇州幼兒園約 3,235 平方米校舍嚴重損毀，被鑑定為危房，需要拆卸重建。受影響學生目前在一所中學操場臨時搭建的板房上課。 • 申請機構與四川省崇州市人民政府計劃原址重建校舍約 3,000 平方米，包括幼兒園教學樓兩幢共約 2,400 平方米及有蓋通道約 600 平方米(因地形需要，以連接兩幢教學樓；通道範圍會用作活動場地)。 • 項目按《成都市農村中心幼兒園標準化建設標準》設計。 • 項目涉及資金 1,000 萬港元。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 500 萬港元資助該項目，餘款約 500 萬港元由申請機構負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	270名學生
資助額	500 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 23)	四川省西充縣人民醫院綜合業務樓災後重建工程項目
申請機構	雅博慈善基金會有限公司
主要內容	• 2008 年 5 月發生的四川汶川地震導致四川省西充縣人民醫院受到嚴重損毀，受損面積 22 000 平方米，佔該院業務用房建築面積的 92.4%。 • 建議項目為西充縣人民醫院的原址空地新建一幢綜合業務大樓，樓高約 10 層，提供放射、手術室及住院病房等設施。綜合業務大樓將完善西充縣人民醫院的服務，以提供二級甲等綜合醫院的基本功能，包括腫瘤、康復、血液透析等學科建制。
目標受惠對象數目或服務範圍	可為西充縣的人民服務。據申請機構提供的資料顯示，2007 年西充縣人民醫院住院數目為 15,000 人次。
資助額	1,000 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 24)	擂鼓社區服務處
申請機構	無國界社工有限公司
主要內容	• 北川擂鼓鎮在地震中受災情況嚴重，受災群眾被安置在大型板房區內，需要各類社區支援服務。 • 無國界社工有限公司擬於北川擂鼓鎮開設一個社區服務處，主要為災民提供心理情緒支援服務，組織及培訓義工提供各類社區支援服務，例如長者探訪和輔導小組、課餘託管服務、領袖訓練和其他發展性小組等。計劃亦為當地大學社工系學生提供有關輔導及社區照顧的培訓及實習平台。
目標受惠對象數目或服務範圍	預算可於三年內透過服務中心向北川擂鼓鎮的災民提供心理情緒支援及其他社區支援服務，受惠人數約 3700 人。此外，計劃將為約 450 名當地社工及義工提供培訓，並為當地院校約 30 位社工系學生提供培訓及實習平台。
資助額	576.3 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 25)	四川省德陽市中江縣興隆鎮中心小學
申請機構	香港教育工作者聯會教育機構有限公司　聯同 512 年青工程師大聯盟
主要內容	• 在 512 地震後，德陽市中江縣的興隆鎮中心小學約 3,010 平方米校舍嚴重損毀，部分校舍被鑑定為危房，需要拆卸重建。受影響學生現時被安排在已加固的教室或板房內學習和住宿。 • 申請機構與四川省教育廳計劃原址擴建興隆鎮中心小學。項目分兩個階段進行，第一階段為擴建共約 4,000 平方米，包括教學用房約 2,000 平方米及生活用房約 2,000 平方米。第一階段完成後，中江縣教育廳需再就學校進行徵地，以進行第二階段的擴建。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 申請機構就第一階段重建工程申請香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」資助，涉及資金 710 萬人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 200 萬港元(折合約 176 萬人民幣)資助該項目，申請機構捐款約 160 萬人民幣，餘款約 370 萬人民幣由當地教育局負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	約 1,388 名學生
資助額	200 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 26)	四川省綿陽市市轄區綿陽市民族初級中學
申請機構	香港教育工作者聯會教育機構有限公司　聯同 512 年青工程師大聯盟
主要內容	• 在 512 地震後，綿陽市市轄區的綿陽市民族初級中學教學樓約 1,390 平方米校舍嚴重損毀，被鑑定為危房，需要拆卸重建。學校現時沒有可以使用的永久教學用房和辦公用房。 • 申請機構與四川省教育廳計劃原址重建校舍約 3,800 平方米，分兩期進行。第一期為重建綜合教學樓約 3,000 平方米，第二期為重建教學綜合附屬樓約 800 平方米。 • 項目按《農村普通中小學校建設標準》設計。 • 申請機構就第一期重建工程(綜合教學樓部分)申請香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」資助，涉及資金 600 萬人民幣。香港特區政府「支援四川地震災區重建工作信託基金」同意撥款 200 萬港元(折合約 176 萬人民幣)資助該項目，申請機構捐款約 165 萬人民幣，餘款約 270 萬人民幣由綿陽市教育局負責籌集。
目標受惠對象數目或服務範圍	約365名學生
資助額	200 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 27)	四川省羅江縣人民醫院救護車項目
申請機構	救世軍港澳軍區
主要內容	羅江縣人民醫院一部救護車在汶川地震後超負荷行駛，導致主要部件損壞，現已報廢。建議項目為羅江縣人民醫院新購救護車一輛。
目標受惠對象數目或服務範圍	預計服務全縣 10 個鎮 109 個鄉/村的 24 萬居民。
資助額	40 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 28)	四川省羅江縣萬安鎮康復中心項目
申請機構	救世軍港澳軍區
主要內容	• 2008 年 5 月發生的四川汶川地震後，萬安鎮衛生院 10 月份初步統計約有 200 多人需繼續康復鍛煉治療，但該鎮過去並沒有康復中心或康復設備器材。 • 國家紅十字會已援助該鎮修建康復中心，但不提供中心內所有設備。建議項目為該康復中心購入所需康復設備。
目標受惠對象數目或服務範圍	預計可服務該鎮 200 多名需要長期康復治療的傷員及當地日後的需求。
資助額	243.7 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 29)	四川省羅江縣金山鎮 17 個村衛生站及設備建設項目
申請機構	救世軍港澳軍區
建議項目主要內容	• 羅江縣金山鎮在“5.12”汶川特大地震屬重災區，17 個村衛生站損毀嚴重，變成危房。 • 建議項目為四川省羅江縣金山鎮重建該 17 個在四川地震中損毀的村衛生站。
目標受惠對象數目或服務範圍	羅江縣金山鎮村衛生站建設後，將可覆蓋全鎮 17 個村，共服務 45,000 多名村民。
資助額	238.9 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 30)	四川省羅江縣鄉鎮衛生院醫療設備項目
申請機構	救世軍港澳軍區
主要內容	四川汶川地震後，羅江縣蟠龍鎮、新盛鎮、調元鎮、白馬關鎮及略坪鎮之衛生院務樓房及醫療設備皆有不同程度倒塌和損毀。以上五鎮的衛生院雖獲捐助重建住院大樓或門診大樓，惟這些項目欠缺某些醫療設備。申請項目旨在為上述 5 間衛生院的住院或門診大樓添置相關的醫療設備。
目標受惠對象數目或服務範圍	在添置有關醫療設備後，將惠及 5 鎮 56 村共 11 萬 7 千多名居民。
資助額	455.6 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 31)	四川省羅江縣御營鎮衛生院醫療設備項目
申請機構	救世軍港澳軍區
主要內容	四川汶川地震後，羅江縣御營鎮衛生院院務用房全部倒塌，12 台設備受損。中國紅十字會已援助該鎮修建衛生院住院大樓，但不提供大樓內醫療設備。建議項目為該衛生院購置醫療設備。
目標受惠對象數目或服務範圍	預計服務全鎮 6 村共 16,200 名居民。
資助額	95.9 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 32)	川港康復培訓及發展中心(第三階段)
申請機構	華裔骨科學會「站起來」計劃
主要內容	• 「川港康復培訓及發展中心」旨在為將會成立的「川港康復中心」成立一隊包含不同層次、不同專業及不同學科的康復醫療團隊，培訓 1000 名康復專才。 • 延續第一、二期工作，計劃內容包括與四川省北醫學院和瀘州醫學院合辦為期三年的康復學士課程，培訓 80 名康復人才(包括物理治療師、作業治療師及矯形器師)。 • 另外，計劃亦會為現職的康復人員提供培訓，包括舉辦有關脊髓、骨折、關節外科的大型培訓及小型工作坊、為四川省內醫院的主任級及前線人員來港培訓及交流，了解香港的康復醫療架構及實際操作。
目標受惠對象數目或服務範圍	為四川醫護界培養 1000 名專業的康復人才，再配合將來「川港康復中心」提供的康復服務，受惠對象將會是未來在「川港康復中心」接受治療和服務的傷員。
資助額	3,417.7 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 33)	四川省北川縣通口鎮防疫康復中心
申請機構	九龍西區扶輪社 聯同 工程界社促會等
主要內容	• 項目建議於一座遭地震損毀的三層樓房原址改建，成為一所樓高四層，面積 900 平方米的防疫康復中心。 • 中心主要業務範圍包括： (1) 協助地震傷員的肢體功能及心理康復； (2) 為全鎮約 7000 人提供預防保健服務及健康知識教育； (3) 為通口鎮居民提供醫療康復服務。
目標受惠對象數目或服務範圍	為通口鎮 7500 名居民提供預防保健，為鎮內及鄰近地區約 1000 名傷殘病人提供康復治療。預計每年服務對象達 1.8 萬人次。
資助額	100 萬港元

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

已批項目 (序號: 34)	四川省北川縣通口鎮 13 條村救急及康健中心
申請機構	九龍西區扶輪社有限公司 聯同 工程界社促會等
主要內容	• 建議於四川省北川羌族自治縣通口鎮的 13 條村(包括通泉村、幸福村、解放村、茶花村、茶園村、青雲村、小坪村、黎明村、戰鬥村、花龍村、井泉村、清泉村及同樂村)興建 13 個「村文化活動室」及 8 個「村衛生所」，為當地居民提供防疫、衛生和文化娛樂設施及相關服務。
目標受惠對象數目或服務範圍	通口鎮全鎮約 7,500 人
資助額	450 萬港元


天災無情　　人間有愛

附件二

香港賽馬會參與援建項目

序號	項目地點		項目名稱	項目估算（億元人民幣)
	市	縣		
1	綿陽市	游仙區	綿陽市第三人民醫院	0.8000
2	綿陽市	游仙區	綿陽市游仙區忠興鎮初級中學	0.3672
3	綿陽市	旌陽區	德陽市五中高中部中學	1.3500
4	成都市	都江堰市	四川奧林匹克運動學校	1.4900
			總計	**約4.01億元人民幣 (約4.50億元港幣)**

香港賽馬會參與援建項目

項目名稱 (序號: 1)	綿陽市第三人民醫院
地點	綿陽市游仙區
項目主要內容	**受災情況** • 在 512 特大地震中，該院包括急診、肢體康復等的醫技樓、門診樓受到嚴重破壞，經有資質單位鑒定和相關部門論證，無修復加固價值，建議拆除原地重建。精神科大樓、兒科及戒毒科樓、老年康復樓、內科樓、外科樓、隔離病室、供應室等建築，也遭到不同程度的損壞。該部分建築經有資質單位鑒定，採取相應加固措施，可以修復使用。地震災害除對房屋造成嚴重破壞外，還損毀該醫院醫用設備儀器 48 台(套)。 **重建規模** • 原址重建心理危機干預綜合樓 20,000 平方米。加固維修房屋 1,800 平方米。 • 維修購置震損醫療設備 48 台套。研究在大樓內加入康復設施。 **重建標準** • 按照國家相關法律、法規及規範運行。
目標受惠對象數目或服務範圍	綿陽三醫院承擔著全市所轄 2 區 1 市 6 縣、幅員面積 20,249 平方公里、人口 530 萬人民群衆的醫療、保健任務；其中精神、神經等特色醫療專業還輻射周邊的德陽市、遂寧市、廣元市、阿壩州甘孜州和甘肅省、陝西省等區域。
建設工期(月)	30
項目估算	8,000 萬元人民幣

香港賽馬會參與援建項目

項目名稱 (序號: 2)	綿陽市游仙區忠興鎮初級中學
地點	綿陽市游仙區
項目主要內容	**受災情況** • 突如其來的 512 汶川特大地震給忠興鎮初級中學造成了毀滅性破壞，學校損失慘重，導致 1,163 名學生無法上課，82 名教職工無家可歸。其中損毀教學樓 2,300 平方米，經濟損失 345 萬元；損毀學生宿舍樓 3,140 平方米，經濟損失 478 萬元；損毀教師周轉房 1,855 平方米，經濟損失 278 萬元；廁所損毀 125 平方米，經濟損失 19 萬元；損毀圍墻 150 米，經濟損失 23 萬元；學生食堂形成危房 506 平方米，經濟損失 76 萬元。同時損毀價值約 20.3 萬餘元的教學設施設備等。總計損失達 1,239.3 萬元 **重建規模** • 重建校舍建築面積 12,984 平方米。體育場地建築面積 6,500 平方米。 • 附屬設施建設投資。設施設備採購、圖書、研究在校舍內加入康復及方便殘疾人士設施。 **重建標準** • 按照國家相關法律、法規及規範運行。
目標受惠對象數目或服務範圍	受災影響的原校 1,600 名學生及 113 名老師
建設工期(月)	19
項目估算	3,672 萬元人民幣

香港賽馬會參與援建項目

項目名稱 (序號: 3)	德陽市五中高中部中學
地點	綿陽市旌陽區（異址重建）
項目主要內容	**受災情況** • 大地震中，孝泉中學受到嚴重破壞，校舍全部垮塌，嘉陵江路學校和德陽五中校舍遭受到中度破壞，部分校舍受到嚴重破壞。這三所學校災前都是完中，爲了學校的分類管理和規範管理，德陽市教育局擬把完中變爲高級中學，把三所學校的高中部獨立後合幷。 **重建規模** • 規劃佔地面積 13,340 平方米。新建校面積 58,050 平方米，新建體育館 16, 000 平方米。 • 購置儀器、設備 5, 860 台套，圖書 157,500 冊。研究在校舍內加入康復及方便殘疾人士設施。 **重建標準** • 按照國家相關法律、法規及規範運行。
目標受惠對象數目或服務範圍	4,500 名學生
建設工期(月)	26
項目估算	1 億 3,500 萬元人民幣

香港賽馬會參與援建項目

項目名稱 (序號: 4)	四川奧林匹克運動學校
地點	成都市都江堰市
項目主要內容	**受災情況** • 512 汶川大地震中，四川省受災地區業餘體校嚴重受損，運動場地、訓練設施遭受不同程度的破壞，嚴重影響奧運爭光計劃的實施。爲加快地震災後體育設施重建步伐，實施災區教育振興工程，以義務教育爲重點，恢復重建各級各類教育基礎設施。決定在都江堰中學(四川省重點中學校)擴建四川奧林匹克體育學校，吸納四川全省乃至全國優秀的青少年運動人才，發展四川和香港兩地體育人才的交流與培訓，這所奧林匹克體校建成後，兩地將聯合選拔專業教練，充實師資力量，培訓內容將包括羽毛球、乒乓球、舉重、體操、柔道、摔跤、田徑等我國傳統優勢項目。 **重建規模** • 綜合訓練場館一座，建築面積 12,000 平方米。室外運動場地 40,000 平方米。教學綜合樓一座，建築面積 3,800 平方米。學生公寓、員工宿舍、餐廳及操作間、庫房等，建築面積 7,000 平方米。 • 水、電、氣、路、環境、綠地等配套工程。器材、設備。 **重建標準** • 按照國家相關法律、法規及規範運行。
目標受惠對象數目或服務範圍	5,000 名學生。全省 3,258 名註冊運動員。
建設工期(月)	16
項目估算	1 億 4,900 萬元人民幣
