

財務委員會 工務小組委員會討論文件

2007 年 5 月 23 日

總目 703－建築物

康樂、文化及市政設施－休憩用地

408RO－鴨脷洲北部填海區康樂發展工程

請各委員向財務委員會建議，把 **408RO** 號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 9,430 萬元，用以在鴨脷洲北部填海區進行康樂發展工程。

問題

我們有需要在南區關設更多公眾休憩用地。

建議

2. 建築署署長建議把 **408RO** 號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 9,430 萬元，用以在鴨脷洲北部填海區進行康樂發展工程。民政事務局局长支持這項建議。

工程計劃的範圍和性質

3. 這項工程計劃的工地位於鴨脷洲北岸，總面積約為 2.62 公頃(包括 0.78 公頃斜坡)。**408RO** 號工程計劃的範圍包括－

- (a) 一條以傳統漁港風貌為主題的海濱長廊，沿途設有多個觀景處(包括一個塔和觀景台)，以供欣賞海上舊式漁船，以及認識漁民生活風貌；
- (b) 一個多用途廣場，供進行各種活動，例如耍太極；
- (c) 一個漁業展覽廊；
- (d) 一條步行徑兼緩跑徑；
- (e) 一個園景花園和多個休憩處；
- (f) 一個設有健身設施的長者健身角；
- (g) 用以劃分公園界址的園景區，並作為緩衝區，以遮擋四周環境，提供良好景觀；以及
- (h) 輔助設施，包括一座設有貯物室和洗手間的服務大樓。

—— 顯示擬議休憩用地概念設計的工地平面圖載於附件 1。我們計劃在 2007 年 10 月展開建造工程，在 2009 年 3 月完成工程。

理由

4. 南區約有 284 200 人口。參考《香港規劃標準與準則》，以南區現有人口來說，應提供的公眾休憩用地約為 57 公頃。目前，南區約有 150 公頃公眾休憩用地，包括房屋署提供的約 22.4 公頃鄰舍休憩用地。我們在研究發展新的康樂工程計劃時，還會考慮其他因素，包括區議會的意見、社區不斷改變的需求和現有設施的使用率。

5. 這項工程計劃的工地位於鴨脷洲，四周建有多個人煙稠密的屋苑，包括鴨脷洲邨、利東邨和海怡半島。單以鴨脷洲計算，人口約 94 000。目前，我們只在該處闢設了鴨脷洲公園和玉桂山配水庫休憩處。我們有需要為該區居民提供更多康樂設施，應付區內對休憩用地的需求。

6. 待城巴巴士廠搬遷後，這項工程計劃可以改善並美化海濱四周環境，並且配合海洋公園擬議重新發展計劃，以及即將在香港仔灣兩岸(即香港仔和鴨脷洲)一帶推行有助推廣旅遊業的新措施。因此，目前正是適當時候把有關工地發展為海濱長廊，以協助應付該區期望當局提供更多康樂設施的要求。

對財政的影響

7. 按付款當日價格計算，估計這項工程計劃的建設費用為 9,430 萬元(見下文第 8 段)，分項數字如下－

	百萬元	
(a) 工地工程和斜坡工程	9.4	
(b) 建築工程	14.1	
(c) 屋宇裝備	7.3	
(d) 渠務工程	6.0	
(e) 外部工程	43.8	
(f) 顧問費	4.6	
(i) 合約管理	2.0	
(ii) 工地監管	2.6	
(g) 家具和設備 ¹	0.1	
(h) 應急費用	7.9	
	93.2	(按 2006 年 9 月 價格計算)
(i) 價格調整準備	1.1	
	94.3	(按付款當日 價格計算)
總計		

¹ 根據為規模相若的現有／已籌劃設施所提供的家具和設備(例如辦公室家具、廢紙箱和臨時標誌牌等)而擬定。

我們建議委聘顧問為這項工程計劃提供合約管理和工地監管服務。按人工工作月數估計的顧問費分項數字詳載於附件 2。我們把這項工程計劃與政府進行的同類工程計劃比較，認為上述工程計劃預算費合理。

8. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按 2006 年 9 月 價格計算)	價格調整 因數	百萬元 (按付款當日 價格計算)
2007-08	4.5	0.99900	4.5
2008-09	56.5	1.00649	56.9
2009-10	19.5	1.01656	19.8
2010-11	8.5	1.02672	8.7
2011-12	4.2	1.03699	4.4
	<u>93.2</u>		<u>94.3</u>

9. 我們按政府對 2007 至 2012 年期間公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率所作的最新預測，制定按付款當日價格計算的預算。由於可以預先清楚界定工程範圍，出現不明確情況的機會甚微，我們打算以總價形式批出合約。由於合約期不超過 21 個月，合約不會訂定可調整價格的條文。

10. 我們估計這項工程計劃引致的每年經常開支為 220 萬元。

公眾諮詢

11. 我們在 2005 年 6 月 6 日就這項工程計劃的範圍諮詢南區區議會轄下規劃、工程及房屋事務委員會(下稱「委員會」)，委員都表示支持。我們又在 2006 年 10 月 23 日和 2007 年 2 月 26 日就工程計劃的設計諮詢委員會，委員歡迎該份設計，認為設計能反映有關地區的獨有特色和歷史，並重申大力支持工程計劃，以及促請當局早日施工。

12. 我們在 2007 年 3 月 12 日提交一份資料文件予立法會民政事務委員會傳閱。委員對於當局向工務小組委員會提交撥款建議一事沒有異議。

對環境的影響

13. 這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 499 章)的指定工程項目，對環境造成不良影響的機會極微。

14. 有關工地本為城巴巴士廠，已使用多年。城巴已聘請顧問進行土地污染研究，以檢查該公司曾否對工地造成任何土地污染。有關顧問已擬備污染評估報告和整治計劃書，並得到環境保護署署長通過。城巴確定，他們會先在工地進行所需補救工程，以糾正該公司在工地造成的土地污染問題，才交回工地。

15. 我們會在有關合約訂定條文，要求承建商實施紓減措施，控制施工期間的噪音、塵埃和工地流出的水所造成的滋擾，以符合既定的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工程時，使用減音器或減音器，豎設隔音板或隔音屏障；經常清洗工地和在工地灑水，以及設置車輪清洗設施。

16. 在策劃和設計階段，我們曾考慮採取措施，以盡量減少產生建築和拆卸(下稱「拆建」)物料(例如在工地採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可循環使用或在其他工程計劃再用)。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或其他合適的建築工地再用惰性拆建物料(例如在工地範圍以挖掘所得物料作填料用途)，以盡量減少須棄置到公眾填料接收設施²的拆建物料。為進一步減少產生建築廢料，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可循環使用的拆建物料，以及使用木材以外的物料搭建模板。

² 公眾填料接收設施已在《廢物處置(建築廢物處置收費)規例》附表 4 訂明。任何人士都須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施棄置公眾填料。

17. 我們亦會要求承建商提交廢物管理計劃(下稱「管理計劃」)，供當局批核。管理計劃須載列適當的緩解措施，以避免及減少產生拆建物料，並把物料再用和循環使用。我們會確保工地日常運作與核准的管理計劃相符。我們亦會利用運載記錄制度，監管公眾填料、拆建物料和拆建廢料分別運到公眾填料接收設施和堆填區棄置的情況。我們會要求承建商把公眾填料與拆建廢料分開，以便運至適當的設施處置。我們並會記錄拆建物料的處置、再用和循環使用情況，藉此進行監察。

18. 我們估計這項工程計劃會產生大約 14 800 公噸拆建物料。我們會在工地再用其中約 5 700 公噸(38.5%)，以及把另外 8 000 公噸(54.1%)運到公眾填料接收設施供日後再用。此外，我們會把 1 100 公噸(7.4%)運到堆填區棄置。這項工程計劃在公眾填料接收設施和堆填區棄置拆建物料的費用，估計總額為 353,500 元(以單位成本計算，運送到公眾填料接收設施棄置物料，每公噸收費 27 元；而運送到堆填區的物料，則每公噸收費 125 元³)。

土地徵用

19. 這項工程計劃無須徵用土地。

背景資料

20 我們在 2005 年 11 月把 **408RO** 號工程計劃提升為乙級。我們委聘建築顧問在 2006 年 5 月進行地形測量工作和在 2006 年 7 月進行詳細設計。2006 年 11 月，我們聘請了工料測量顧問擬備招標文件。以上工作所需費用總額為 478 萬元，這筆款項已在整體撥款分目 **3100GX**「為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、小規模勘測工作及支付顧問費」項下撥款支付。建築顧問已完成工程計劃的地形測量和詳細設計工作，而工料測量顧問正為招標文件定稿。

³ 上述估計金額，已包括建造和營運堆填區的費用，以及堆填區填滿後，修復堆填區和進行日後修護工作的支出。不過，這個數字並未包括現有堆填區用地的土地機會成本(估計為每立方米 90 元)，亦不包括現有堆填區填滿後，開設新堆填區的成本(所需費用應會更為高昂)。


21. 為進行擬議鄰舍休憩用地發展工程須移走 25 棵樹，包括砍伐 19 棵樹，以及在工地範圍內重植 6 棵樹。須移走的樹木全非珍貴樹木⁴。我們會把種植樹木建議納入工程計劃中，估計會種植 176 棵新樹、1 760 平方米灌木、1 220 平方米地被植物和闢設 1 393 平方米草地。

22. 我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 105 個(95 個工人職位和 10 個專業／技術人員職位)，共提供 1 425 個人工作月的就業機會。

民政事務局
2007 年 5 月


⁴ 珍貴樹木包括《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－

- (a) 逾百年的樹木；
- (b) 具文化、歷史或紀念價值的樹木，如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標的樹和紀念偉人或大事的樹；
- (c) 屬貴重或稀有品種的樹木；
- (d) 形態獨特的樹木(顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵)，如有簾狀高聳根的樹、生長於特別生境的樹木；或
- (e) 樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木(在高出地面 1.3 米的水平量度)，或樹木的高度／樹冠範圍等於或超逾 25 米。

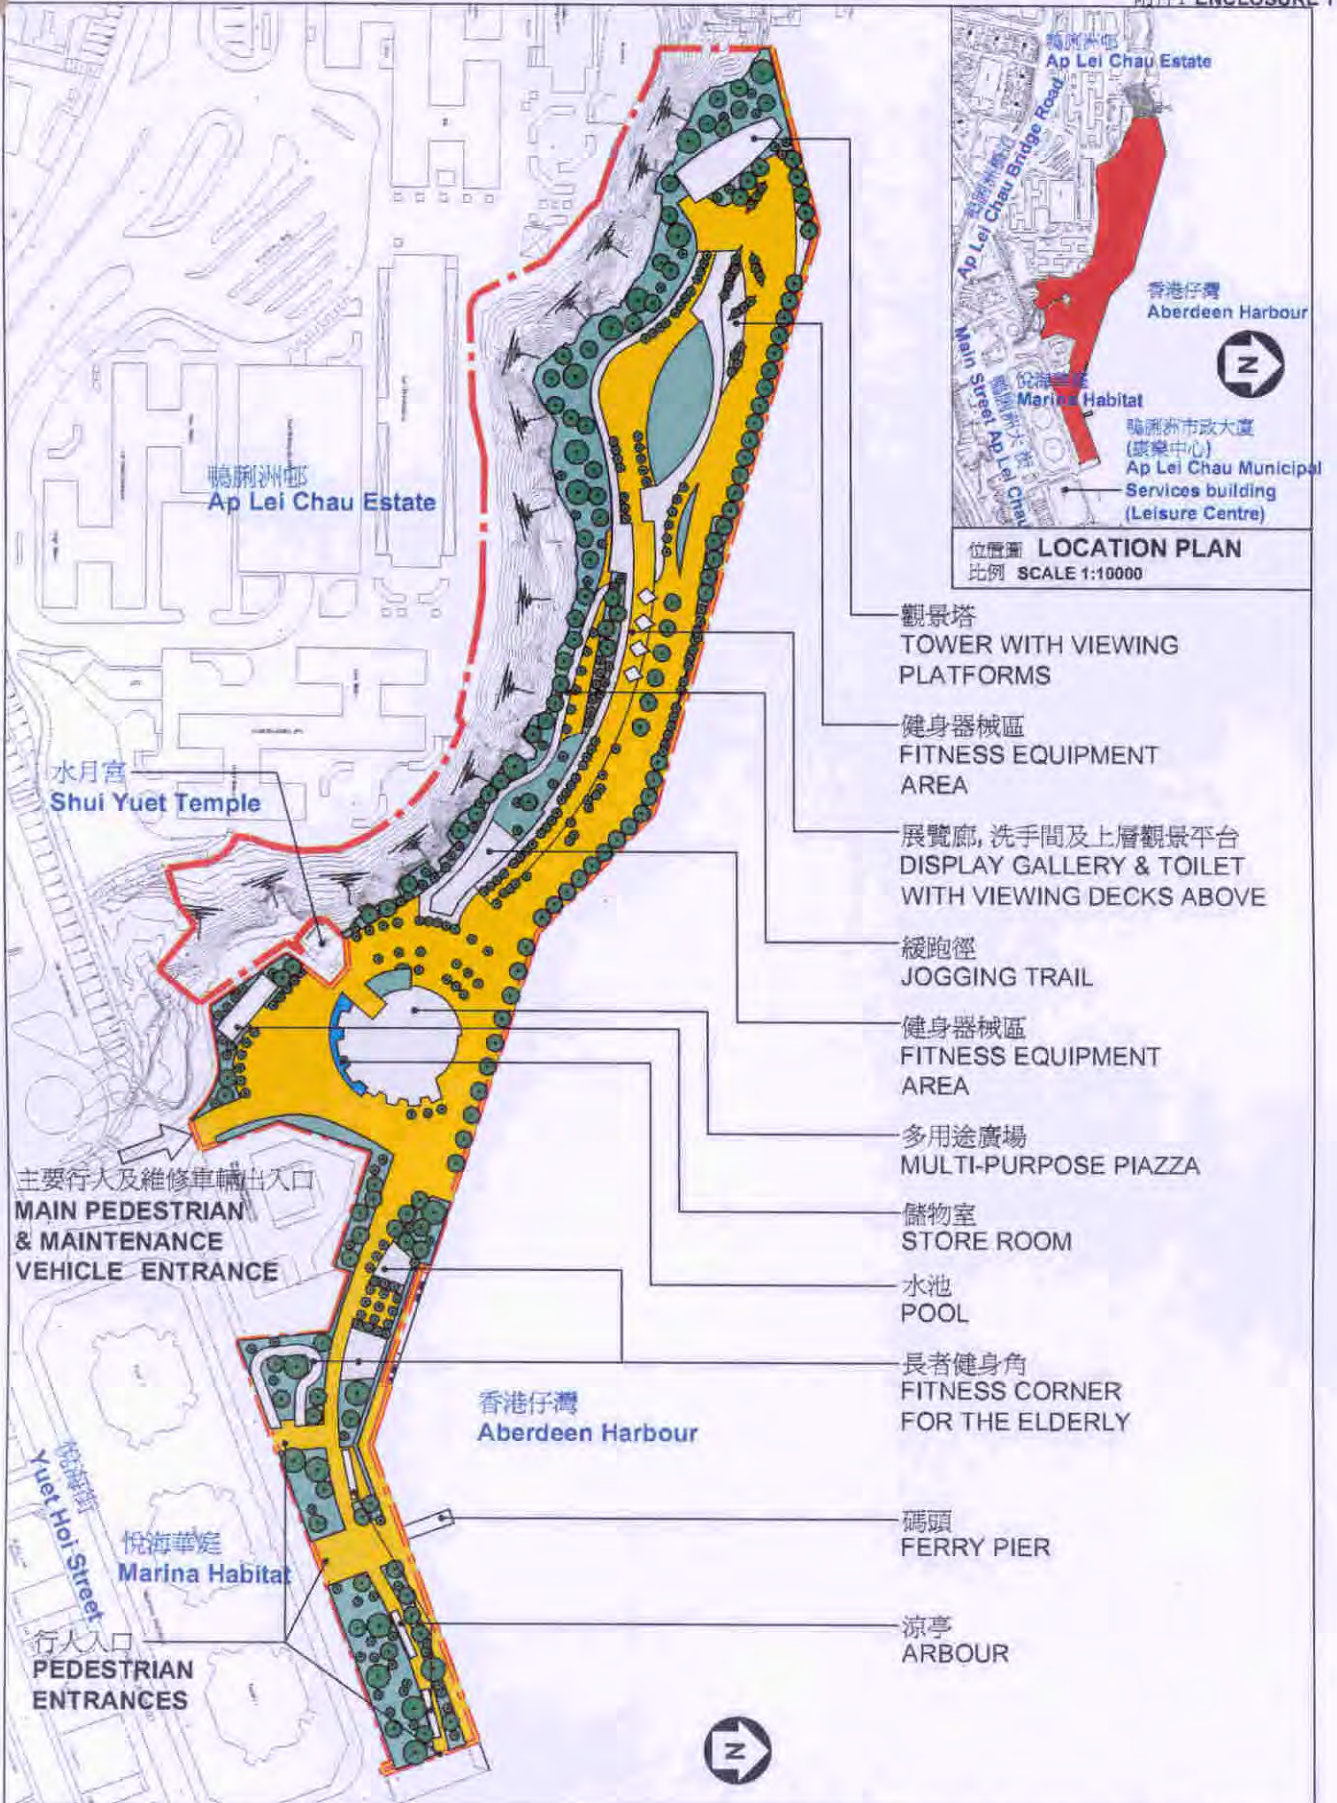

位置圖 LOCATION PLAN
比例 SCALE 1:10000

- 觀景塔
TOWER WITH VIEWING PLATFORMS
- 健身器械區
FITNESS EQUIPMENT AREA
- 展覽廊, 洗手間及上層觀景平台
DISPLAY GALLERY & TOILET WITH VIEWING DECKS ABOVE
- 緩跑徑
JOGGING TRAIL
- 健身器械區
FITNESS EQUIPMENT AREA
- 多用途廣場
MULTI-PURPOSE PIAZZA
- 儲物室
STORE ROOM
- 水池
POOL
- 長者健身角
FITNESS CORNER FOR THE ELDERLY
- 碼頭
FERRY PIER
- 涼亭
ARBOUR

title 408RO 北鴨洲康樂發展工程 RECREATIONAL DEVELOPMENT AT NORTH AP LEI CHAU RECLAMATION	drawn by SING	date 09/02/07	drawing no. AB\4217\XA201	scale 1:2000
	approved JENNY CHAN	date 09/02/07	 ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT	
	office ARCHITECTURAL BRANCH			

408RO－鴨脷洲北部填海區康樂發展工程

估計顧問費的分項數字

顧問的員工開支		預計的人 工作月數	總薪級 平均薪點	倍數 (註1)	估計費用 (百萬元)
(a)	合約管理	—	—	—	1.2
(註2)	技術人員	—	—	—	0.8
(b)	工地監管	90	14	1.6	2.6
(註3)					
				總計	4.6

註

1. 採用倍數 1.6 乘以總薪級平均薪點，以預計顧問所提供駐工地人員的員工開支。(在 2007 年 1 月 1 日，總薪級第 14 點的月薪為 18,010 元。)
2. 顧問在合約管理方面的員工開支，是根據現在為 **408RO** 號工程計劃進行設計和建造工程的顧問合約計算得出。待財務委員會批准把 **408RO** 號工程計劃提升為甲級後，顧問合約的施工階段才會展開。
3. 我們須待建造工程完成後，才能知道實際的人工作月數和實際所需的開支。
