附件

數碼港發展計劃(暫定)
(截至31.8.99為止)

項目	工作	開始	完成
	基建工程		
1	早期地基處理工程 - 詳細設計	九九年 第二季	九九年 第三季
2	早期地基處理工程 - 建築	九九年 第三季	二零零一年 第三季
3	道路工程(除北部通路外) - 詳細設計	九九年 第二季	九九年 第四季
4	道路工程(除北部通路外) - 建築	九九年 第四季	二零零一年 第四季
5	污水處理設施 - 詳細設計	九九年 第三季	二零零零年 第二季
6	污水處理設施 - 建築	二零零零年 第三季	二零零二年 第三季
7	北部通路 - 詳細設計	九九年 第三季	二零零零年 第三季
8	北部通路 - 建築	二零零零年 第三季	二零零三年 第二季
	上蓋建築		
9	樓宇的整體設計	九九年 第三季	二零零零年 第二季
10	審查及批核資訊科技設施的設計	二零零零年 第二季	二零零一年 第一季
11	數碼港第一期 - 詳細設計	九九年 第四季	二零零零年 第三季
12	數碼港第一期 - 建築	二零零零年 第三季	二零零一年 第四季
13	數碼港第二期 - 詳細設計	二零零零年 第一季	二零零一年 第一季
14	數碼港第二期 - 建築	二零零一年 第一季	二零零二年 第四季
15	數碼港第三期 - 詳細設計	二零零一年 第一季	二零零二年 第一季
16	數碼港第三期 - 建築	二零零二年 第一季	二零零三年 第四季
17	住宅發展項目 - 詳細設計及建築	二零零零年 第二季	二零零七年 第二季

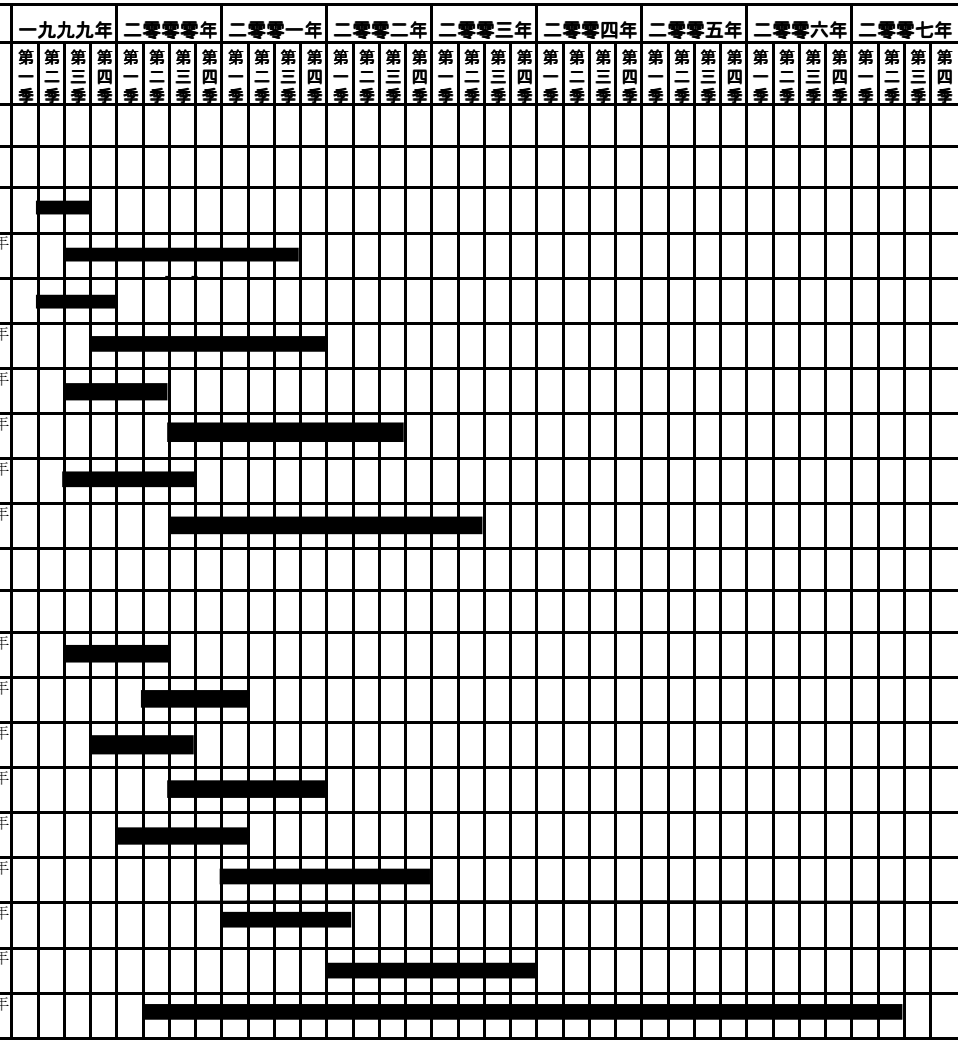

附註：第一季 = 一月至三月
第二季 = 四月至六月
第三季 = 七月至九月
第四季 = 十月至十二月
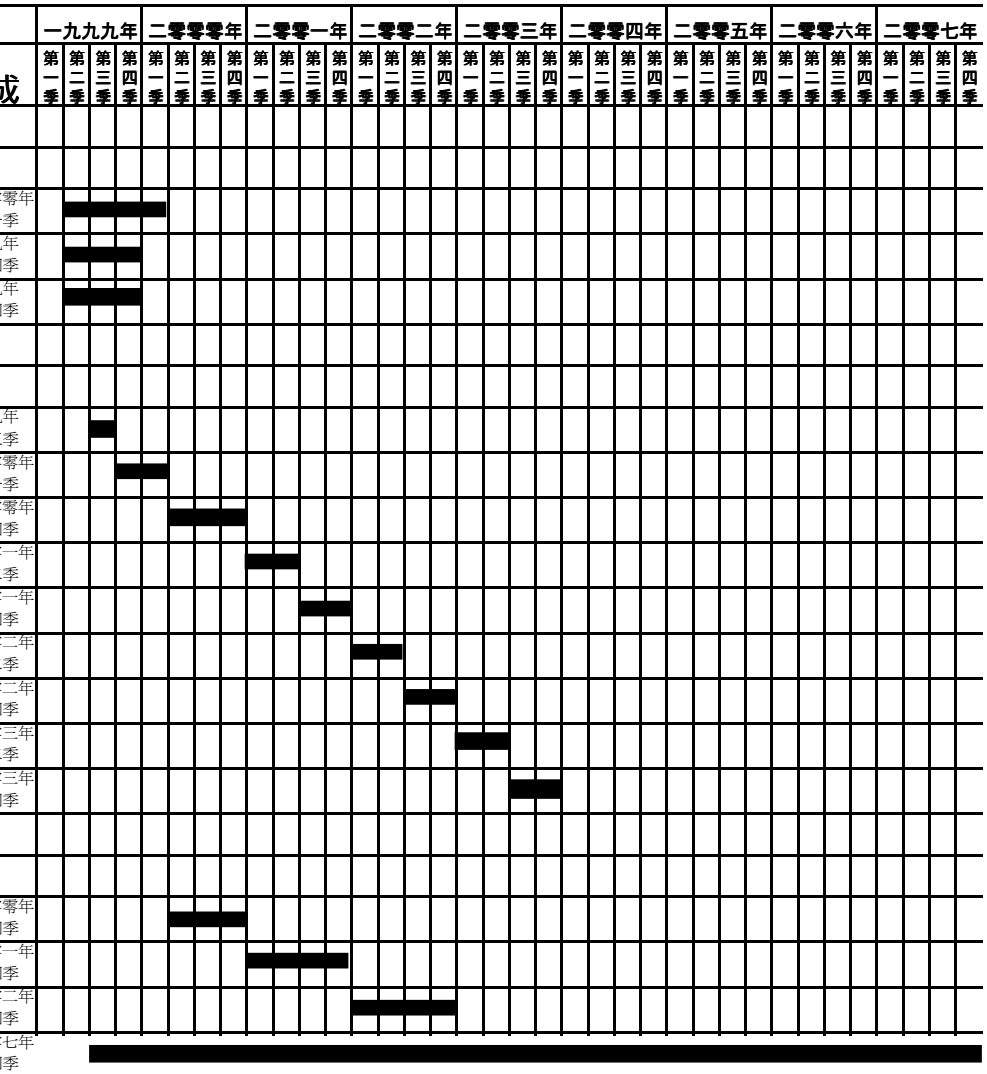
項目	工作	開始	完成
	在憲報公布數碼港計劃		
18	城市規劃條例	九九年第二季	二零零零年第一季
19	道路(工程、使用及補償)條例	九九年第二季	九九年第四季
20	前濱及海床(填海工程)條例	九九年第二季	九九年第四季
	管理		
21	成立數碼港公司	九九年第三季	九九年第三季
22	制定有關租用申請的制度安排	九九年第四季	二零零零年第一季
23	制定租用準則/公布申請程序	二零零零年第二季	二零零零年第四季
24	考慮數碼港第一期的租用申請	二零零一年第一季	二零零一年第二季
25	數碼港第一期的租約	二零零一年第三季	二零零一年第四季
26	考慮數碼港第二期的租用申請	二零零二年第一季	二零零二年第二季
27	數碼港第二期的租約	二零零二年第三季	二零零二年第四季
28	考慮數碼港第三期的租用申請	二零零三年第一季	二零零三年第二季
29	數碼港第三期的租約	二零零三年第三季	二零零三年第四季
	市場推廣與宣傳		
30	盈科就數碼港第一期加強進行市場推廣工作	二零零零年第二季	二零零零年第四季
31	盈科就數碼港第二期加強進行市場推廣工作	二零零一年第一季	二零零一年第四季
32	盈科就數碼港第三期加強進行市場推廣工作	二零零二年第一季	二零零二年第四季
33	政府及盈科進行一般的宣傳工作	九九年第三季	二零零七年第四季
